คู่มือการดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย

นางสาวปีระดา แกมไทย
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ
กลุ่มคลัง สำนักงานเลขานุการกรม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ ๑ บทนำ	
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	๑
วัตถุประสงค์ของผลงาน	๒
ขอบเขตของผลงาน	๒
การนำไปใช้ประโยชน์	๒
บทที่ ๒ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๓-๗
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	๗-๑๘
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	
บทที่ ๓ ขั้นตอนการดำเนินงาน	๑๙
การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	๒๐
การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	๒๑-๒๓
และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
การขออนุมัติใช้แบบรูปรายการงานก่อสร้าง	๒๓-๒๔
ขออนุมัติใช้ราคากลางงานก่อสร้าง	๒๔
การจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมร่างประกาศ	๒๔-๒๘
และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศ	๒๘-๒๙
และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์	
การรายงานผลการพิจารณาการสอบถามข้อมูลประกาศเชิญชวน	๓๐
การเสนอราคา	๓๐
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง	๓๑-๓๓
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	๓๓-๓๔
การอุทธรณ์	๓๕
การจัดทำร่างสัญญา	๓๕
การแจ้งผู้ชนะการเสนอราคามาจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา	๓๖
และใบบัญชีรายการก่อสร้าง (BOQ)	
การแจ้งชี้แจงกรณีผลการประกวดราคาต่ำกว่าราคากลาง ๑๕% ของงานจ้างก่อสร้าง	๓๗

หน้า

การขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและวงเงินค่าก่อสร้าง	๓๗
การแจ้งลงนามในสัญญา	๓๗-๓๘
การลงนามในสัญญา	๓๙-๔๐
บทที่ ๔ ผลการดำเนินงาน	๔๑
บทที่ ๕ : สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๔๑-๔๓
บรรณานุกรม	๔๔
ภาคผนวก การดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	

คำนำ

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายสำคัญในการบริหารประเทศ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยได้ประกาศพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีการวางแผนการดำเนินงานทำให้การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดำเนินการได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง ผู้ขอรับการประเมินได้จัดทำขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั้งนี้ ผู้ขอรับการประเมินจึงขอยกตัวอย่างกรณีศึกษา การจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการและจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ขอรับการประเมินได้รวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ แนวทาง ขั้นตอน และสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นางสาวปีระดา แกมไทย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
กลุ่มคลัง สำนักงานเลขานุการกรม

บทที่ ๑ บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องด้วยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายสำคัญในการบริหารประเทศในเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำเป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีการวางแผนการดำเนินงาน ทำให้การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการป้องกันให้หน่วยงานของรัฐพบปะผู้ประกอบการให้น้อยที่สุด ซึ่งทำให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเกิดความโปร่งใส นำไปสู่ความเชื่อมั่นให้กับภาคประชาชน และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ News GFMIS ซึ่งหลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ โดยการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้

๑. คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน

๒. โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทำโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน

๓. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกำหนดเวลาที่เหมาะสม โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

๔. ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์ของผลงาน

๑. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถนำคู่มือไปศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อเสริมสร้างให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภายในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และป้องกันการผิดพลาดหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ปฏิบัติงาน

๓. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๔. ทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และเป็นลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

ขอบเขตของผลงาน

การก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) และเมื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถเสร็จเรียบร้อย ทำให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการและสำหรับผู้ที่มาติดต่อการขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ ซึ่งมีผลทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

การนำไปใช้ประโยชน์

๑. บุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ โดยไม่ต้องนำรถไปจอดบริเวณริมถนนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการจอดกรีดขวางการจราจร

๒. ทำให้ผู้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและผู้ที่มาติดต่อการขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการมีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๓. ทำให้บุคลากรของกองสุขศึกษา และกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีห้องปฏิบัติงานที่เหมาะสม และมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น

๔. ทำให้บุคลากรภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทที่ ๒ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น

“งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันต่ออาคารสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น

“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทำการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ำ หอถังน้ำ ถนน ประปา ไฟฟ้า หรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่องเรือน

“สาธารณูปโภค” หมายความว่า งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ำ การขนส่งทางท่อ ทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน

“งานจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ

“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

“การบริหารพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ

“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ

(๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ

“เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายและเงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ฯลฯ

มาตรา ๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้

(๑) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน

(๒) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทำโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน

(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกำหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

(๔) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุผลหรือความจำเป็นอื่น การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป

ให้ใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม

มาตรา ๙ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้

มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการดำเนินการตามกฎหมาย

มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่

(๑) กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ฉ)

(๒) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

(๓) กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)

(๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งและการเปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๕๕ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทำได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้

(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ

(๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง

มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๗ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง

มาตรา ๙๓ หน่วยงานของรัฐต้องทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย

การทำสัญญารายใดถ้าจำเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งโดยมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ ก็ให้กระทำได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนฯ

มาตรา ๙๕ สัญญาที่ทำในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้องกำหนดให้มีค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๐ ในการดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ

มาตรา ๑๐๑ งานจ้างก่อสร้างที่มีขั้นตอนการดำเนินการเป็นระยะ ๆ อันจำเป็นต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้มีผู้ควบคุมงานซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอำนาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างนั้น

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้

(๑) ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล

(๒) ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด

(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

(๔) รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อำนวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

(๕) องค์การมหาชน หมายถึง ผู้อำนวยการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

(๖) องค์กรอิสระ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(๗) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อัยการสูงสุด

(๘) หน่วยธุรการของศาล หมายถึง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

(๙) มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หมายถึง อธิการบดี

(๑๐) หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง

(๑๑) หน่วยงานอิสระของรัฐ หมายถึง เลขาธิการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

(๑๒) หน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น

"หัวหน้าเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นกำหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

"ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน" หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน

คำว่า "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน

การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

"การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม" หมายความว่า การที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกันหรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดหรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบหน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ

ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ

(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง

หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้

ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย

เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น

ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดำเนินการจ้าง ตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้

ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ ๒๓ และข้อ ๗๙ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้

(๑) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง

(๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี

(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น

(๕) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

(๘) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการซื้อหรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน

การซื้อหรือจ้างกรณีจำเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) หรือกรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ง) หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออก ตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง ซึ่งไม่อาจทำรายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานนั้นจะทำรายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้

ข้อ ๒๕ ในการดำเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ

(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา

(๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

(๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้ามีเหตุที่ทำให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำเป็น

ข้อ ๒๘ การซื้อหรือจ้าง กระทำได้ ๓ วิธี ดังนี้

(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

(๒) วิธีคัดเลือก

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อ ๒๙ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กระทำได้ ๓ วิธี ดังนี้

(๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

(๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๓) วิธีสอบราคา

ข้อ ๓๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้ดำเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ ๔๒ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ ๔๓ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

การจัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจำเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในแบบและไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทำได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าวไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

การกำหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยกำหนดเป็นวัน เวลา ทำการเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

ข้อ ๔๕ เมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๒๑ ได้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ พร้อมนำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพื่อให้การกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบเหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้

(๒) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

ข้อ ๔๖ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตามข้อ ๔๕ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการนำร่างเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว

ข้อ ๔๗ กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๑ พิจารณาว่าสมควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้นำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ

(๒) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ข้อ ๔๘ ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการตามข้อ ๔๕ หรือข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ ๔๙ การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระทำไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ในกรณีที่มีการขาย ให้กำหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการจัดทำเอกสารนั้น แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างสำรวจออกแบบ หรือค่าจ้างที่ปรึกษา

ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งก่อนมีสิทธิขอรับเอกสารประกวดราคาใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก

ข้อ ๕๑ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๔๘ ให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

(๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ

(๒) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ

(๓) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทำการ

(๔) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ

ข้อ ๕๔ เมื่อถึงกำหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว

กำหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเสนอราคา เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกำหนดวัน เวลาการเสนอราคา เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อได้ดำเนินการเป็นประการใดแล้ว ให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย

ข้อ ๕๕ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการดังนี้

(๑) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น

ทั้งนี้ การซื้อหรือจ้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก ในกรณีเช่นว่านี้ คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่าจะดำเนินการตามข้อ ๘๓ (๓) แล้วเสร็จ

(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการนำเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารที่กำหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ ๔๔ แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตาม (๒) และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้จัดเรียงลำดับผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน ๓ ราย

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กำหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำรายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลำดับ แล้วแต่กรณี

(๔) จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน

(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา

ข้อ ๕๙ ให้นำความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุโลม

ข้อ ๘๔ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระทำได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

ข้อ ๑๖๖ เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เสนอราคา หรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐ กำหนดหลักประกันการเสนอราคา สำหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่มีวงเงินซื้อหรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง เกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๒) หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

(๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

สำหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

กรณีเป็นการยื่นข้อเสนอจากต่างประเทศ สำหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกันการเสนอราคาได้อีกประเภทหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคานำหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง (๑) (๓) หรือ (๔) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) ในวันเสนอราคา และให้หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้เสนอราคาส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยจะต้องดำเนินการวันใดวันหนึ่งภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา เว้นแต่ไม่อาจดำเนินการวันใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากำหนดมากกว่า ๑ วันได้แต่จำนวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย

ข้อ ๑๖๗ หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

ข้อ ๑๖๘ หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ให้กำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษ จะกำหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้

ข้อ ๑๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงหรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชำรุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย

การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกำหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ผู้ค้ำประกันทราบด้วย สำหรับหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับมอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงดำเนินการตาม (๖)

ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการดำเนินการเป็นระยะ ๆ อันจำเป็นต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัดแล้ว ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ความชำนาญหลายด้าน จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้

ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ในกรณีจำเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน ให้ดำเนินการจ้างโดยถือปฏิบัติตามหมวด ๔

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวดโดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ

บทที่ ๓

ขั้นตอนดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สำหรับหน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กระทำได้ ๓ วิธี ได้แก่ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ก็ยังสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กระทำได้ ๓ วิธี ได้แก่ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และวิธีสอบราคา ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างวิธีใดก็ต้องเข้าหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขอรับการประเมินขอนำเสนอกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓๑ กำหนดว่า วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้ดำเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดมาดำเนินการจัดทำ เพื่อขอรับการประเมินในครั้งนี้ ดังนั้น เพื่อทำให้เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุสามารถปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ขอรับการประเมินขอนำกระบวนการและขั้นตอนการในการดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่มีวงเงินงบประมาณในการดำเนินการจัดจ้างจำนวนเงิน ๒๘๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในครั้งนี้ด้วย

ในการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การจัดซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยให้ดำเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ก่อนดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องได้รับอนุมัติหลักการในการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างก่อน เมื่อได้รับอนุมัติในหลักการแล้ว ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุจะดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างทั้งทางด้านเอกสาร และในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement (ระบบ e - GP) ควบคู่พร้อมกันไปด้วย ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินการดังต่อไปนี้

<u>ขั้นตอนที่ ๑</u> การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อได้รับเรื่องการขออนุมัติในหลักการให้ดำเนินการจัดจ้างจากสำนักงานเลขานุการกรมแล้วจะดำเนินการจัดทำหนังสือเพื่อขอความเห็นชอบในการประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พร้อมทั้งจัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ซึ่งในประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีนั้นอย่างน้อย ต้องประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ และระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ และเมื่อประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้ว ผู้ขอรับการประเมินจะนำเอกสารดังกล่าวแจ้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อให้ดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ รายละเอียดตัวอย่างตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๖๕๑๖ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ และตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ **ตามผนวก ๑**


พร้อมกันนี้ ผู้ขอรับการประเมินจะดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement (ระบบ e - GP) บนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) ซึ่งการดำเนินการระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement (ระบบ e - GP) จะต้องดำเนินการลงวันที่เป็นวันที่ปัจจุบันเท่านั้นไม่สามารถลงวันที่ย้อนหลังได้

เมื่อประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ได้รับความเห็นชอบแล้ว ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ จะดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement (ระบบ e - GP) โดยกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ e-GP ควบคู่พร้อมกันไปด้วย

การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e - GP)

ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าไปปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement (ระบบ e - GP) โดยการ Log in ช่องทาง www.gprocurement.go.th โดยดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เริ่มต้นจากการไปที่เมนูขีดสามขีด ☰ เลือกเมนูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > รายการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง > เพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดำเนินการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณตาม พรบ. รายจ่ายประจำปี : ๒๘๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตัวเลือกประเภทเงิน พรบ. งบประมาณ : งบกรม เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ๐๑/๒๕๖๔ กดปุ่มบันทึก กดปุ่มแสดงรายการแผน หน้าจอจะเปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่ง กดเครื่องหมายถูก (/) หน้าโครงการที่ต้องการประกาศเผยแพร่แผน เลือกเมนูรายการเผยแพร่แผนฯ กดเครื่องหมายถูก (/) กุดปุ่มตกลง หน้าจอจะเปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่ง กรอกรายละเอียดต่าง ๆ กดปุ่มบันทึก กดปุ่มไปขั้นตอนที่ ๒ หน้าจอจะเปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่ง ตรวจสอบความถูกต้อง กดปุ่มบันทึก กดปุ่มไปขั้นตอนที่ ๓ หน้าจอจะเปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่ง ตรวจสอบความถูกต้อง กดปุ่มไปขั้นตอนที่ ๔ หน้าจอจะเปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่ง ตรวจสอบความถูกต้อง กดปุ่มบันทึก กรอกเลขที่วันที่หนังสือขออนุมัติประกาศ และกรอกวันที่ประกาศ กดปุ่มเสนอหัวหน้าอนุมัติ พร้อมกับนำเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบแจ้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

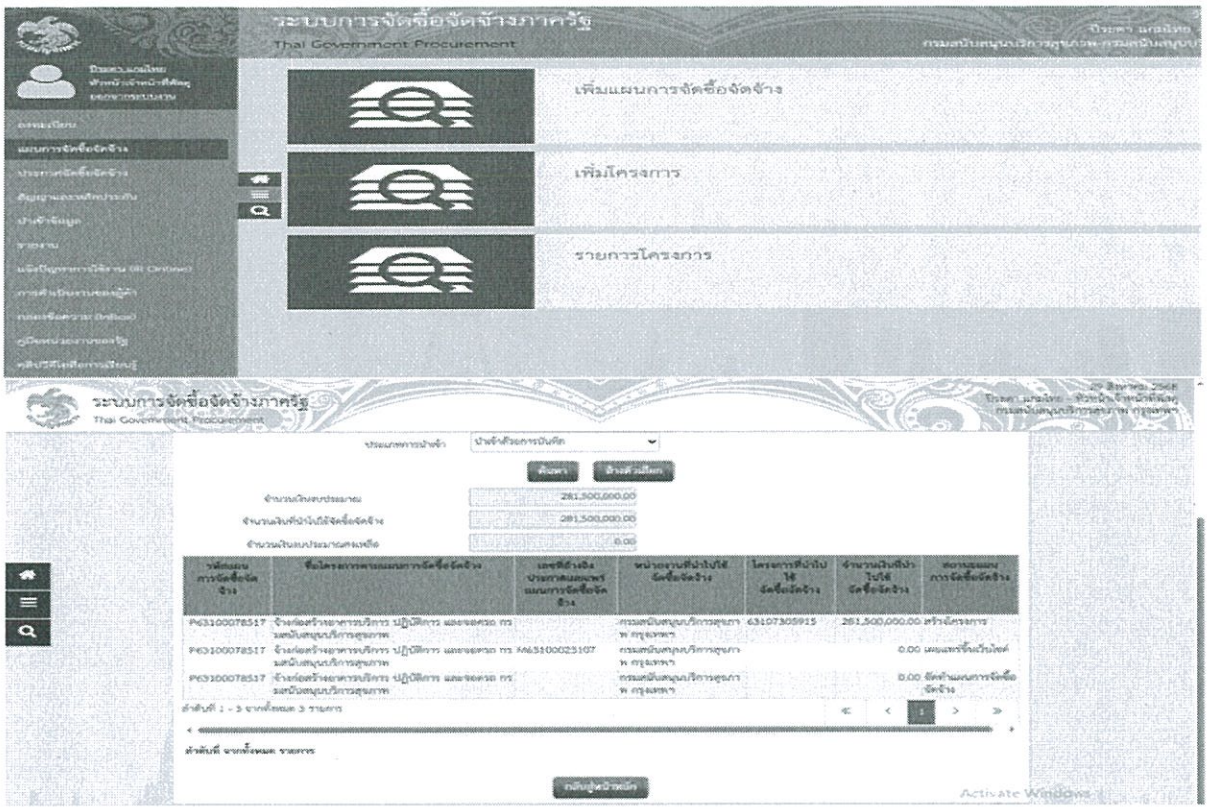

ภาพที่ ๑ ภาพแสดงการบันทึกการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

<u>ขั้นตอนที่ ๒</u> การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุจะดำเนินการจัดทำรายงานขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พร้อมกับจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานจ้างก่อสร้างดังกล่าว เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นการดำเนินการ


ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสาม กำหนดว่า ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดำเนินการจ้างตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ พร้อมกับขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการกำหนดราคากลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตัวอย่างตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๖๕๘๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๒๒๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ **ตามผนวก ๒**

เมื่อรายงานขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุจะดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement (ระบบ e - GP) ควบคู่พร้อมกันไปด้วย โดยจะดำเนินการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement (ระบบ e - GP) บนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) ทั้งนี้ การดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement (ระบบ e - GP) จะต้องลงวันที่เป็นวันที่ปัจจุบันเท่านั้น

ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement (ระบบ e - GP) ควบคู่พร้อมกันไปด้วย

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ระบบ e - GP)

เมื่อคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้รับความเห็นชอบแล้ว ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าไปปฏิบัติงานในระบบ e-GP โดยการ Log in ผ่าน www.gprocurement.go.th เริ่มต้นจากการไปที่เมนูขีดสามขีด ☰ ไปที่เมนูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง/การจัดการรายชื่อคณะกรรมการ กดปุ่มเพิ่มรายชื่อ กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ของคณะกรรมการ เช่น เลขที่ประจำตัวประชาชน คำนำหน้า ชื่อ สกุล ประเภทกรรมการ ตำแหน่งในคณะกรรมการ วันเดือนปีเกิด สถานที่ติดต่อ/ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ e-mail สถานการณ์ใช้งาน กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้เรียบร้อย ครบถ้วน กดปุ่มบันทึก โดยกรอกรายละเอียดแบบเดียวกันนี้ของคณะกรรมการให้ครบทุกราย กดปุ่มกลับหน้าหลัก กดปุ่มจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กรอกรายละเอียดผู้ลงนาม กดปุ่มไปขั้นตอนที่ ๒ ตรวจสอบความถูกต้อง กดปุ่มบันทึก กดปุ่มไปขั้นตอนที่ ๓ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว บันทึกเลขที่วันที่ของคำสั่ง จะได้เลขที่และวันที่ของคำสั่ง โดยระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement (ระบบ e - GP) จะส่งข้อความแจ้งคณะกรรมการทาง e-mail

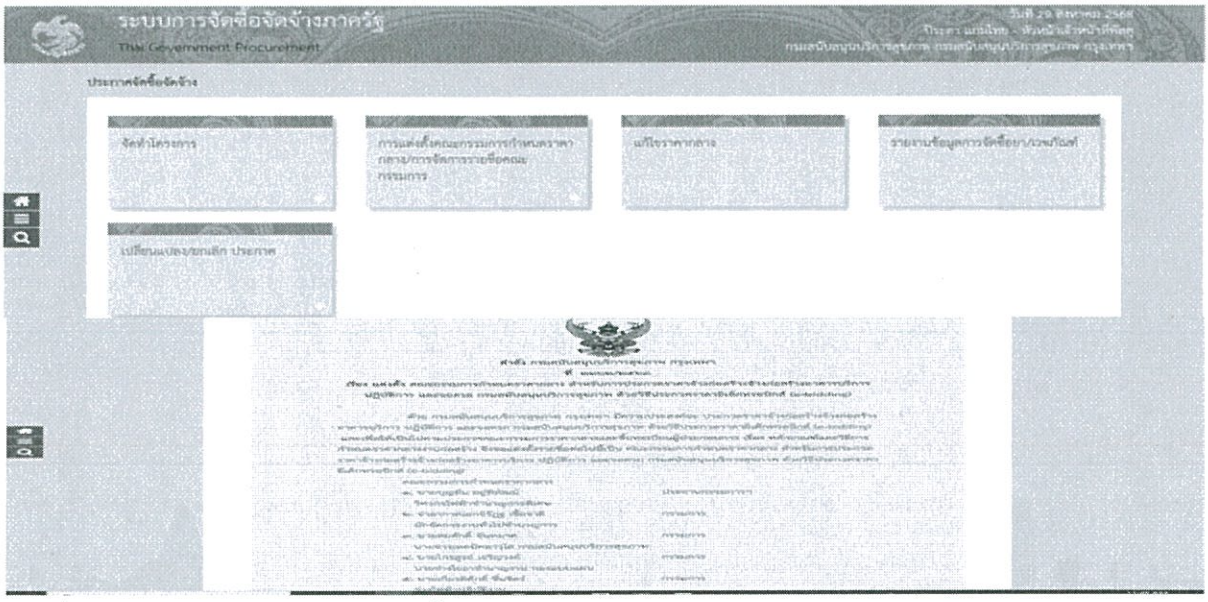

ภาพที่ ๒ ภาพแสดงการบันทึกการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<u>ขั้นตอนที่ ๓</u> การขออนุมัติใช้แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เมื่อคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุจะดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและดำเนินการจัดทำร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และหลังจากที่คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ดำเนินการพิจารณาจัดทำและสรุปร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ร่างประกาศ และร่างเอกสารเอกสารประกวดราคาจ้างฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุจะดำเนินการจัดทำรายงานขออนุมัติใช้ร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติให้ใช้แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อจะได้นำไปใช้ในขั้นตอนการประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อไป

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ประกอบด้วย

๑. ความเป็นมา
๒. แบบรูปและรายการประกอบแบบ
๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๔. รายการละเอียด
๕. ข้อกำหนดอื่น ๆ
๖. วงเงินในการจัดจ้าง
๗. การจ่ายเงินล่วงหน้า
๘. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
๙. มาตรฐานฝีมือช่าง

๑๐. รายละเอียดอื่นๆ

๑๑. เกณฑ์ในการพิจารณา

๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ **ตามผนวก ๓**

ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กจ (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

<u>ขั้นตอนที่ ๔</u> การขออนุมัติใช้ราคากลางงานก่อสร้าง

เมื่อแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุจะดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๑) ประกอบกับหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หลังจากที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางและสรุปราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุจะดำเนินการจัดทำรายงานขออนุมัติใช้ราคากลาง เพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขออนุมัติใช้ราคากลางดังกล่าว โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อจะนำไปใช้ในขั้นตอนการประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อไป

ราคากลาง ประกอบด้วย

๑. แบบ บก. ๐๑

๒. แบบ ปร. ๖

๓. แบบ ปร.๔

๔. การคำนวณหาค่า Factor F เฉลี่ย

รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๗๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๗๑๔๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ **ตามผนวก ๔**

<u>ขั้นตอนที่ ๕</u> การจัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และราคากลางของงานจ้างดังกล่าวได้รับอนุมัติให้ใช้เรียบร้อยแล้ว ก่อนดำเนินการซื้อหรือจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุได้ดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และผู้ควบคุมงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๕ ประกอบกับข้อ ๑๗๗ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พร้อมกับร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๓ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด เพื่อนำไปเผยแพร่ร่างประกาศและร่างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ เนื่องจากวงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ (๒) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ประกอบกับ ข้อ ๔๖ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตามข้อ ๔๕ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการนำร่างเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้มีวงเงินงบประมาณในการจัดจ้างเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงได้มีการกำหนดเรื่องหลักประกันการเสนอราคา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๖ เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เสนอราคาหรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดหลักประกันการเสนอราคา สำหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่มีวงเงินซื้อหรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง เกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยในรายงานขอจ้างมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้าง

๒. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะจ้าง

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้าง

๔. วงเงินที่จะจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

๖. วิธีที่จะจ้างและเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๘. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

๙. กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

๑๐. ข้อเสนออื่น ๆ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ทั้งนี้ การจัดจ้างครั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

ร่างประกาศประกวดราคา ประกอบด้วย

๑. รายการพัสดุที่หน่วยงานของรัฐต้องการจ้าง

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓. วัน เวลา ในการขอรับเอกสารประกวดราคา

๔. วัน เวลา และการเสนอราคา

๕. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และวันเวลาในการชี้แจงการสอบถามรายละเอียด

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ต้องจัดทำเอกสารประกวดราคาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย ประกอบด้วย

๑. รายการพัสดุที่หน่วยงานของรัฐต้องการจ้าง

๒. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๔. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

๕. การเสนอราคา

๖. หลักประกันการเสนอราคา

๗. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๘. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

๙. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

๑๐. อัตราค่าปรับ

๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้างได้

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ


รายละเอียดตัวอย่างตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๗๘๓๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับหนังสืองานพัสดุ กลุ่มคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๗๕๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๒๗๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ **ตามผนวก ๕**

ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และได้กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนชวนในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๒๗๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

เมื่อรายงานขอจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เรียบร้อยแล้ว ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุจะดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement (ระบบ e - GP) ควบคู่พร้อมกันไปด้วย โดยจะดำเนินการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement (ระบบ e - GP) บนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) ทั้งนี้ การดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement (ระบบ e - GP) จะต้องลงวันที่เป็นวันที่ปัจจุบันเท่านั้น

รายงานขอจ้าง และร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระบบ e-GP)

ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าไปปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement (ระบบ e - GP) โดยการ Log in ผ่าน www.gprocurement.go.th ไปที่เมนูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > จัดทำโครงการ เลือกเมนูรายการโครงการ หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นอีกหน้าหนึ่ง เลือกขั้นตอน ๑ จัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ เลือกลำดับ ๑ รายงานงานขอซื้อหรือขอจ้าง กดปุ่มรายละเอียด/แก้ไข กรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น วิธีการจัดหา ประเภทการจัดหา พัสดุที่จัดหา กรณีจ้างก่อสร้างต้องระบุพิกัด วิธีการพิจารณา รายการพิจารณา การเบิกจ่ายเงิน การผูกพันงบประมาณโครงการ จำนวนเงินงบประมาณโครงการ และ Browse ไฟล์เอกสารราคากลางที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว กดปุ่มบันทึก หน้าจอจะเปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่ง กรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ กดปุ่มบันทึก กดปุ่มไปขั้นตอนที่ ๒ หน้าจะเปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่ง กดปุ่มกลับหน้าหลัก เลือกลำดับ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ กดปุ่มรายละเอียด/แก้ไข กดปุ่มเพิ่มรายชื่อ บันทึกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมทั้งข้อมูลของควบคุมงาน เช่น เลขที่บัตรประชาชน คำนำหน้า ชื่อ สกุล ประเภทกรรมการ ตำแหน่งในคณะกรรมการ ชื่อหน่วยงาน e-mail ตำแหน่ง วันเดือนปีเกิด สถานที่ติดต่อ/ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ วุฒิการศึกษา กดปุ่มบันทึก โดยกรอกรายละเอียดแบบเดียวกันนี้สำหรับคณะกรรมการทุกราย กดปุ่มกลับหน้าหลัก เลือกลำดับ ๓ จัดทำร่างเอกสารและประกาศเชิญชวน กดปุ่มรายละเอียด/แก้ไข หน้าจอจะเปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่ง กรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เช่น เอกสารแนบท้าย คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ บัญชีส่วนที่ ๑ บัญชีส่วนที่ ๒ ระยะเวลาในการเสนอราคา การสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด หลักประกันการยื่นข้อเสนอ การขายเอกสาร หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา การทำสัญญาซื้อขาย ค่าจ้างและการจ่ายเงิน อัตราค่าปรับ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง การจ่ายเงินล่วงหน้า ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ การสอบถามและรายละเอียดทางเว็บไซต์ผู้ลงนามประกาศเชิญชวน เมื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ครบแล้ว กดปุ่มบันทึก กดปุ่มไปขั้นตอนที่ ๒ หน้าจอจะเปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกวดราคาจ้าง หากตรวจสอบแล้วถูกต้อง กดปุ่มบันทึก กดปุ่มไปขั้นตอนที่ ๓ หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นอีกหน้าหนึ่ง จะได้หน้า Template มาตรฐานของประกาศราคาจ้าง ตรวจสอบความถูกต้อง หากถูกต้องแล้ว กดปุ่มบันทึก กดปุ่มกลับสู่หน้าหลัก และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ จะนำเอกสารดังกล่าวมากรอกเลขที่ วันที่ของรายงานขอจ้าง เลขที่และวันที่ของคำสั่ง วันที่ของร่างประกาศ เลขที่และวันที่ของร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ และเมื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ครบแล้ว กดปุ่มบันทึก กดปุ่มเสนอหัวหน้าอนุมัติ และนำเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับนำเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบแล้วแจ้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

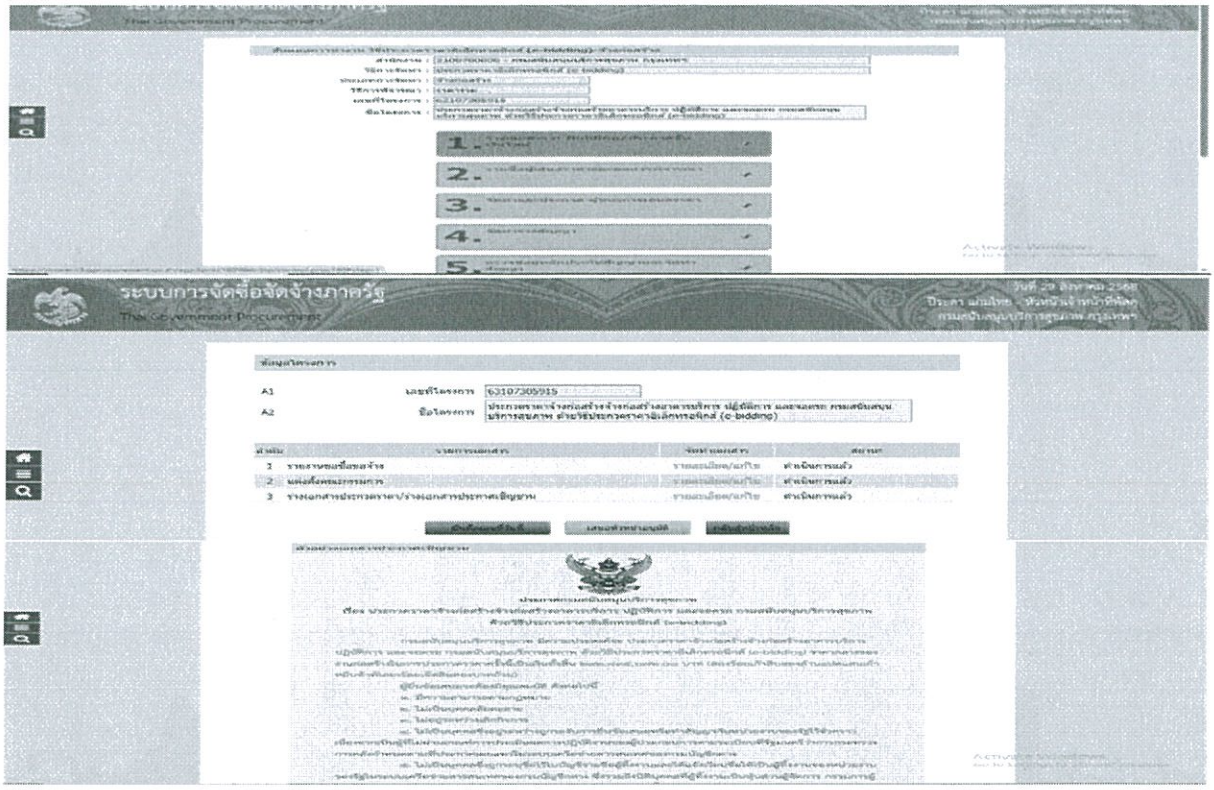

ภาพที่ ๓ ภาพแสดงการบันทึกการจัดทำรายงานขอจ้าง และร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ

<u>ขั้นตอนที่ ๖</u> รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ


เมื่อครบกำหนดประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการตรวจสอบว่ามีผู้ประกอบการท่านใดมีความคิดเห็นมายังหน่วยงานของรัฐโดยเปิดเผยตัวหรือไม่ ซึ่งในการประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ครั้งนี้ได้มีผู้ประกอบแสดงความคิดเห็นมายังหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๑ ราย และคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ได้ร่วมกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาแล้ว เห็นว่า ความคิดเห็นของผู้ประกอบการดังกล่าวเป็นเพียงข้อสอบถาม จึงเห็นควรไม่ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำรายงานขอจ้างก่อสร้าง พร้อมประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการที่มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบในการดำเนินการประกาศเชิญชวน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๗ กำหนดว่า กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ตามข้อ ๒๑ พิจารณาว่าสมควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ ประกอบกับข้อ ๔๗ (๒) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ ซึ่งในการประกาศเชิญชวนครั้งนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีการประกาศเชิญชวนในระบบเครือข่ายสารสนเทศเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และปิดประกาศ ณ สถานที่เปิดเผย ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

ให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอราคาในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๖๐๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ สำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ หนังสือแจ้งผู้มีความคิดเห็นมายังหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๙๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ **ตามผนวก ๖**

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP)

ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าไปปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement (ระบบ e - GP) โดยการ Log in ผ่าน www.gprocurement.go.th ไปที่เมนูรายการโครงการ ☰ กดปุ่มเมนูที่ ๑ ร่างเอกสาร e-bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์ เลือกเมนูปรับปรุงร่างเอกสาร e-bidding กรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เช่น ต้องการจัดทำ Template รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างเอกสารฯ หรือไม่ มีข้อเสนอแนะหรือการวิจารณ์ของสาธารณชนหรือไม่ ความเห็นของผู้รับผิดชอบในการพิจารณาข้อเสนอแนะ ความเห็น (ปรับปรุงตามข้อวิจารณ์หรือไม่ปรับปรุงตามข้อวิจารณ์) ผู้ลงนาม กดปุ่มบันทึก กดปุ่มบันทึกเลขที่และวันที่ประกาศ กดปุ่มเสนอหัวหน้าอนุมัติ เพื่อให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้ายื่นข้อเสนอและเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และประกาศบนเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

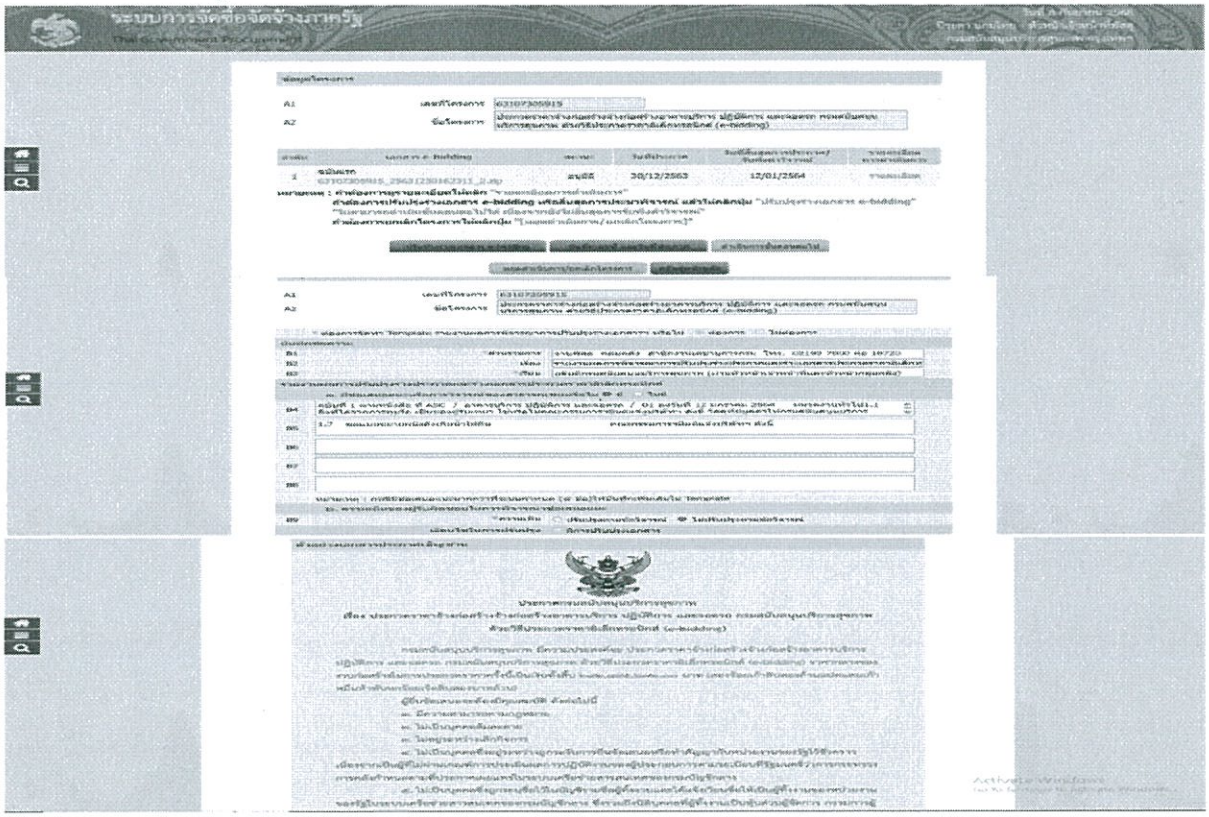

ภาพที่ ๔ ภาพแสดงการบันทึกการจัดทำรายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

<u>ขั้นตอนที่ ๗</u> การรายงานผลการพิจารณาการสอบถามข้อมูลประกาศเชิญชวน

ในช่วงระยะเวลาที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้กำหนดระยะเวลาให้มีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีผู้สอบถามรายละเอียดเพิ่ม จำนวน ๓ ราย คือ บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด บริษัท เอ็นแอล ดีเวลวอลเปมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถามเพิ่มเติมที่ผู้ประกอบการได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มมายังหน่วยงานของรัฐ เมื่อการประชุมของคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ได้ข้อสรุปแล้ว ผู้ขอรับการประเมินจัดทำหนังสือการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ลงนามในหนังสือการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการส่งหนังสือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทุกราย ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงกำหนดวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๒ ในกรณีที่โดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างนั้นมีความจำเป็นจะต้องมีการสอบถามรายละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจน ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดให้ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของหน่วยงานของรัฐหรือช่องทางอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยให้กำหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม และให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงกำหนดวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ รายละเอียดตัวอย่างตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๑๐๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ สำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๙๘๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม จำนวน ๓ ฉบับ ตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๓๖๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๓๖๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๓๖๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ **ตามผนวก ๗**

<u>ขั้นตอนที่ ๘</u> การเสนอราคา

เมื่อถึงกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา โดยในการประกาศเชิญชวนครั้งนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้กำหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement (ระบบ e - GP) ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๔ เมื่อถึงกำหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว กำหนดวันเสนอราคาดังกล่าวห้ามมิให้รื่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเสนอราคา เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกำหนดวัน เวลาการเสนอราคา เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อได้ดำเนินการเป็นประการใดแล้ว ให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย

ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดลดระยะเวลาการเสนอราคา จากเดิม ๘ ชั่วโมง เหลือ ๓ ชั่วโมง โดยให้หน่วยงานของรัฐกำหนดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในการเสนอราคา ซึ่งมี ๒ ช่วง คือ ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๓๓.๔/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

<u>ขั้นตอนที่ ๙</u> รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง

เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจาณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการดังนี้

๑. จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น

ปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเวียน การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๕๕ (๑) เพื่อเป็นการลดภาระในการลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ไม่จำต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอแต่อย่างใด ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว๓๙๗ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒. ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการนำเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารที่กำหนดให้จัดส่งภายหลัง จากวันเสนอราคาตามข้อ ๔๔ แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วนถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วนถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๓. พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตาม (๒) และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้จัดเรียงลำดับผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน ๓ ราย ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กำหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำรายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลำดับ แล้วแต่กรณี

๔. จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
- รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
- รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน

- ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง โดยเป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงินดังนี้

๑. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท


๒. ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ขอรับการประเมินจะต้องดำเนินการจัดทำรายงานผลการเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายว่าเสนอราคาเป็นจำนวนเงินเท่าไร ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้หรือไม่ และดำเนินการจัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างตามมติของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้าง ซึ่งอำนาจในการอนุมัติสั่งจ้างครั้งนี้เป็นอำนาจของผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น รายละเอียดตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๒๓๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๑๕๗๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ **ตามผนวก ๘**

ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการในระบบ e-GP ควบคู่พร้อมกันไปด้วย

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (ระบบ e-GP)

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาผลการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าผ่านหรือไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายเสนอราคาเป็นจำนวนเงินเท่าไร และผู้ยื่นข้อเสนอรายใดได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อจะได้ไปดำเนินการขออนุมัติสั่งจ้างจากผู้มีอำนาจสั่งจ้าง ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าไปปฏิบัติงาน ระบบ e-GP โดยการ Log in ผ่าน www.gprocurement.go.th ไปที่เมนูรายการโครงการ กดปุ่ม ๒ รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา กดปุ่มรายละเอียดในรายการเสนอราคาและผลการพิจารณา กดปุ่มรายละเอียด บันทึกข้อมูลตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินการพิจารณา เมื่อดำเนินการขั้นตอนนี้เสร็จแล้ว ก็ดำเนินการขั้นตอนต่อไป ไปที่เมนูรายการโครงการ กดปุ่ม ๓ การจัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในหัวข้อนี้ดำเนินการบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ในส่วนเฉพาะหัวข้อหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง กดปุ่มรายละเอียด และดำเนินการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น เลขที่และวันที่หนังสือ ผู้ลงนามหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง เช่น คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง กดปุ่มบันทึก กดปุ่มไปขั้นตอนที่ ๒ ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งนี้ ข้อความในเอกสารและข้อความในระบบต้องเหมือนกัน เมื่อตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว กดปุ่มบันทึก กดปุ่มไปขั้นตอนที่ ๓ หน้าจอจะเปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่ง กดปุ่มกลับหน้าหลัก

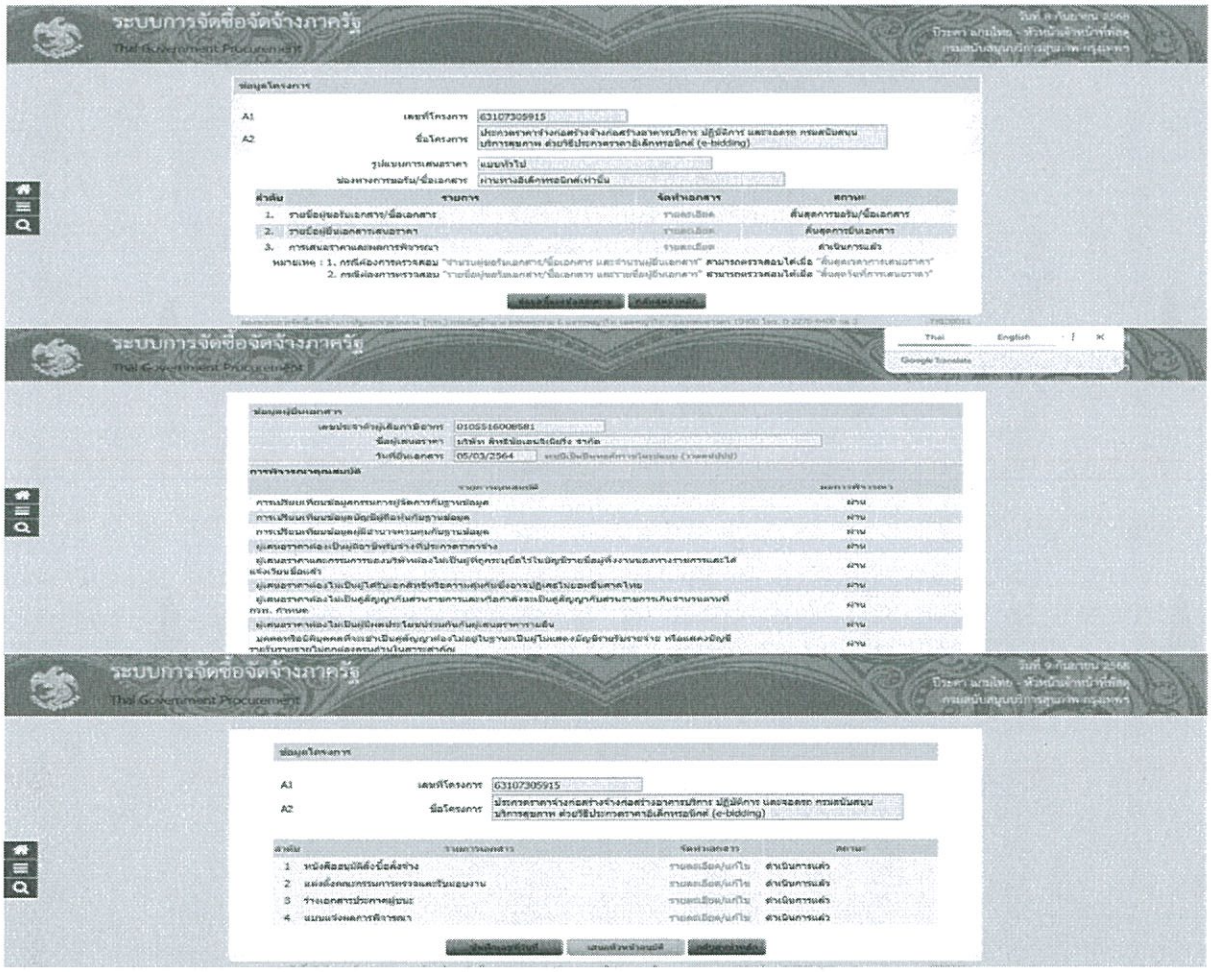

ภาพที่ ๕ ภาพแสดงการบันทึกการจัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง

ขั้นตอนที่ ๑๐ การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


เมื่อผู้มีอำนาจสั่งจ้างได้อนุมัติให้สั่งจ้างกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ จะดำเนินการจัดทำหนังสือการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และจัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแจ้งผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย และเมื่อดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๙ โดยให้นำความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยข้อ ๔๒ กำหนดว่า เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่าย สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด รายละเอียดตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๑๖๑๖ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ประกอบกับประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๒๕๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๒๕๗ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๒๕๘ ลงวันที่

๗ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๒๕๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๒๖๐ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๒๖๑ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๒๕๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ และแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา ซึ่งแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นผู้ลงนามในแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมดังกล่าว **ตามผนวก ๙**

ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการในระบบ e-GP ควบคู่พร้อมกันไปด้วย

การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ระบบ e-GP)

ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าไปปฏิบัติงาน ระบบ e-GP โดยการ Log in ผ่าน www.gprocurement.go.th ไปที่เมนูรายการโครงการ กดปุ่ม ๓ การจัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในส่วนเฉพาะหัวข้อ ร่างเอกสารประกาศผู้ชนะ กดปุ่มรายละเอียดแก้ไข กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ผู้ลงนาม เช่น คำนำหน้าชื่อผู้ลงนามสกุลผู้ลงนาม ตำแหน่งผู้ลงนาม กดปุ่มบันทึก กดปุ่มไปขั้นตอนที่ ๒ หน้าจอจะเปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่ง ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งนี้ ข้อความในเอกสารและข้อความในระบบต้องเหมือนกัน เมื่อตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว กดปุ่มบันทึก กดปุ่มไปขั้นตอนที่ ๓ กดปุ่มกลับหน้าหลัก ไปที่หัวข้อแบบแจ้งผลการพิจารณา กดปุ่มรายละเอียดแก้ไข ดำเนินการกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย เมื่อดำเนินการในส่วนนี้เรียบร้อยแล้ว ในระบบก็จะได้วันที่ของประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และเลขที่และวันที่ของแบบแจ้งผลการพิจารณา

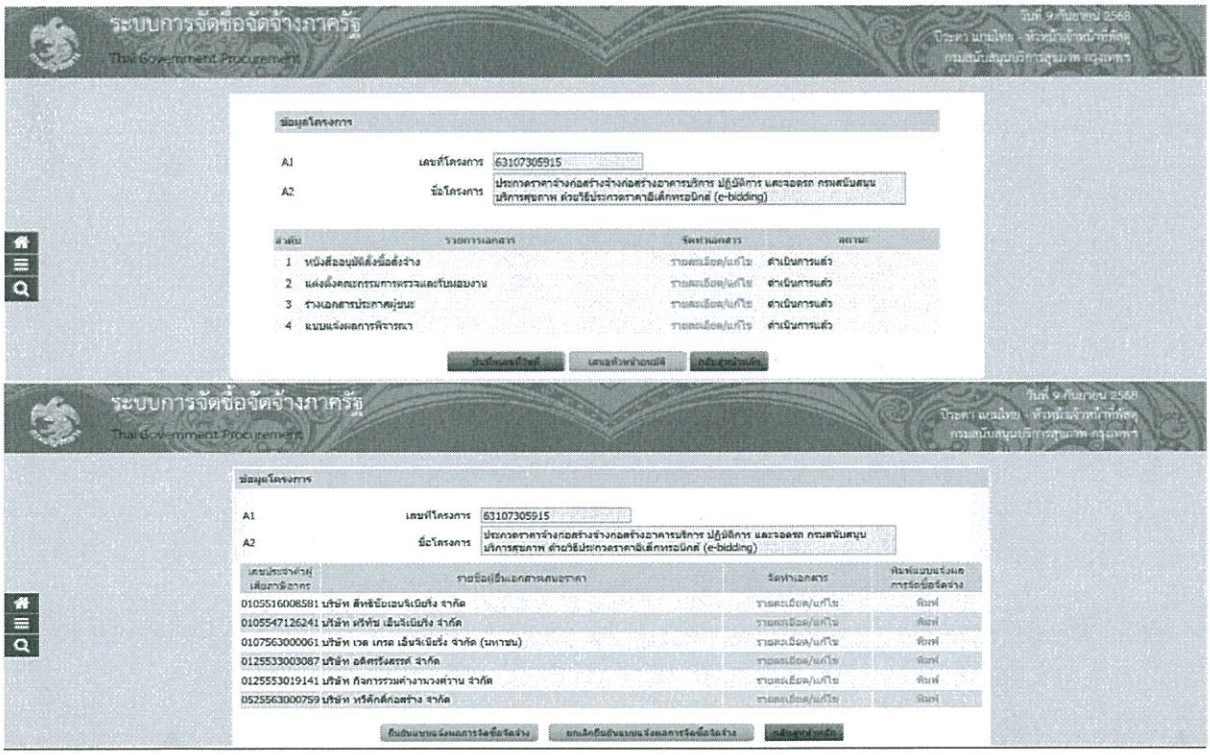

ภาพที่ ๖ ภาพแสดงการบันทึกการจัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

<u>ขั้นตอนที่ ๑๑</u> การอุทธรณ์

หน่วยงานของรัฐจะลงนามในสัญญาได้ ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ซึ่งในช่วงเวลาระหว่างรอระยะเวลาอุทธรณ์ ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำร่างสัญญาก่อสร้างตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดส่งให้กองกฎหมายเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๒๑๑๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และเมื่อกองกฎหมายได้ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งประเด็นการแก้ไขและแจ้งเรื่องมายังสำนักงานเลขานุการกรม ตามหนังสือกองกฎหมาย ที่ สธ ๐๗๐๒.๐๕.๒/๑๖๗๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เมื่อได้รับเรื่องผู้ขอรับการประเมินจะดำเนินการแก้ไขตามที่กองกฎหมายตรวจสอบเพื่อจะได้ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามกับผู้ว่าจ้างในขั้นตอนต่อไป

<u>ขั้นตอนที่ ๑๒</u> การจัดร่างทำสัญญา

เมื่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการประกวดราคาจ้างแล้ว ผู้ขอรับการประเมิน ดำเนินการจัดทำร่างสัญญาจ้างก่อสร้างตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ซึ่งในรายละเอียดของร่างสัญญาจ้างก่อสร้างมีรายละเอียดดังนี้ สัญญาเลขที่เท่าใด ลงวันที่ใด สัญญาทำขึ้นระหว่าง (ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ชนะการเสนอราคา) ข้อตกลงว่าจ้าง เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ค่าจ้างและการจ่ายเงิน เงินค่าจ้างล่วงหน้า การหักเงินประกันผลงาน กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง การจ้างช่วง การควบคุมงานของผู้รับจ้าง ความรับผิดของผู้รับจ้าง การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง การตรวจงานจ้าง แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง งานพิเศษและการแก้ไขงาน ค่าปรับ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา การใช้เรือไทย มาตรฐานฝีมือช่าง การปรับราคาค่าจ้าง ซึ่งผู้ขอรับการประเมินจะส่งร่างสัญญาฉบับดังกล่าวให้กองกฎหมายดำเนินการตรวจสอบ เมื่อได้รับร่างสัญญาจากกองกฎหมายแล้ว ผู้ขอรับการประเมินจะดำเนินการแก้ไขตามที่กองกฎหมายเสนอแนะ และนำสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอต่อผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาในขั้นตอนต่อไป รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๒๑๑๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และตามหนังสือกองกฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๒.๐๕.๒/๑๖๗๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔


ภาคผนวก ๑๐

ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการในระบบ e-GP ควบคู่พร้อมกันไปด้วย

การจัดทำร่างสัญญา (ระบบ e-GP)

ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าไปปฏิบัติงาน ระบบ e-GP โดยการ Log in ผ่าน www.gprocurement.go.th ไปที่เมนูรายการโครงการ กดปุ่ม ๔ จัดทำร่างสัญญา กดปุ่มประเภทสัญญา เลือกประเภทสัญญาจ้างก่อสร้าง กดปุ่มรายละเอียด/แก้ไข หน้าจอจะเปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่ง กรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ข้อความในเอกสารและข้อความในระบบต้องเหมือนกัน เช่น ข้อมูลในส่วนของผู้ว่าจ้าง ข้อมูลในส่วนของผู้รับจ้าง ข้อตกลงว่าจ้าง เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

การส่งมอบและการจ่ายเงิน ค่าจ้างล่วงหน้า การหักเงินประกันผลงาน ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จำนวนงวดงาน จำนวนงวดเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง การจ้างช่วง ค่าปรับ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย มาตรฐานฝีมือช่าง การปรับราคาค่าจ้าง ผู้ลงนาม (ของคู่สัญญา) ชื่อ และชื่อสกุล ตำแหน่งพยาน จำนวน ๒ ราย

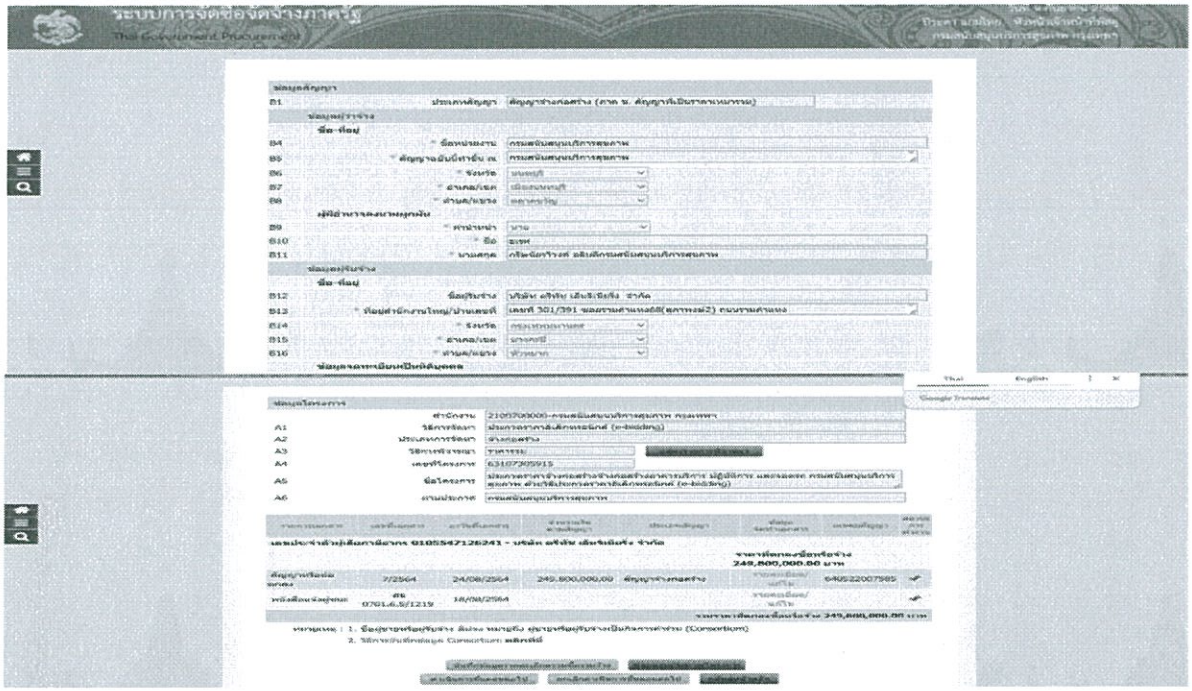

ภาพที่ ๗ ภาพแสดงการบันทึกการจัดทำร่างสัญญาจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

<u>ขั้นตอนที่ ๑๓</u> การแจ้งผู้ชนะการเสนอราคามาจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง (BOQ)

ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผู้ชนะการเสนอราคา ให้มาจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ตรงกับแบบรูป ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๔๕๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ข้อ ๓ ก่อนลงนามในสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เป็นผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มาจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ตรงกับแบบรูปและรายการละเอียด รายละเอียดตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๖๙๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ในการจัดจ้างครั้งนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลือกการปรับลดราคาทุกรายการตามอัตราร้อยละที่ผู้ข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง รายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๓๓๙๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ **ภาคผนวก ๑๑**

<u>ขั้นตอนที่ ๑๔</u> การแจ้งชี้แจงกรณีผลการประกวดราคาต่ำกว่าราคากลาง ๑๕ % ของงานจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ราคาที่ผู้เสนอราคาเสนอในครั้งนี้ แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป คณะกรรมการจึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างชี้แจงรายละเอียดในการเสนอราคาที่เสนอมา โดยผู้รับจ้างให้เหตุผลในการเสนอราคาว่าตนเองมีเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง จึงทำให้มีต้นทุนลดลง และคณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรจ้างเนื่องจากราคาของผู้เสนอราคาที่เสนอกับหน่วยงานของรัฐในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง ๑๗.๒๕ % แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยด่วน ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๑๖.๒ วรรคสอง รายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๒๘๓๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ **ภาคผนวก ๑๒**

<u>ขั้นตอนที่ ๑๕</u> การขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและวงเงินค่าก่อสร้าง

ก่อนทำสัญญาก่อหนี้ผูกพัน ในกรณีที่เป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและวงเงินค่าก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จากสำนักงบประมาณ และต้องรับความเห็นชอบแบบรูปรายการและวงเงินค่าก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จากสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวได้ ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ (๑) ในกรณีที่เป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง ให้เสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการแล้วต่อสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อนทำสัญญาก่อหนี้ผูกพัน เว้นแต่เป็นรายการที่สำนักงบประมาณได้เคยให้ความเห็นชอบความเหมาะสม ของราคาไว้แล้ว รายละเอียดตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕๘๕๘๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ และตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๙๔๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และสำนักงบประมาณ ได้อนุมัติแบบรูปรายการและวงเงินค่าก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๒๓/๑๔๕๙๑ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ **ภาคผนวก ๑๓**

<u>ขั้นตอนที่ ๑๖</u> การแจ้งลงนามในสัญญาจ้าง


เมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้มีสิทธิอุทธรณ์แล้ว ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามในหนังสือ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามในหนังสือแล้ว และส่งหนังสือดังกล่าวให้ผู้รับจ้างเพื่อมาลงนามภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือพร้อมทั้งแจ้งให้เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการทำสัญญาในวันลงนามในสัญญาจ้างด้วย เช่น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน หนังสือมอบอำนาจ

ในกรณีที่มอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหนังสือใบทะเบียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐) สำเนาบัญชีที่จะโอนเงินค่าจ้าง พร้อมทั้งตรวจสอบด้วยว่าผู้รับจ้างเคยเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐหรือไม่หากไม่เคยให้นำเอกสารมาดังกล่าวมาทำข้อมูลหลักผู้ขาย และเตรียมหลักประกันสัญญา ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของวงเงินจัดจ้างในครั้งนี้ มาในวันทำสัญญาด้วย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘ หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญาให้กำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น แล้วแต่กรณี รายละเอียดตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๑๒๑๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ **ตามผนวก ๑๓**

ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการในระบบ e-GP ควบคู่พร้อมกันไปด้วย

การแจ้งลงนามในสัญญาจ้าง (ระบบ e-GP)


ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าไปปฏิบัติงาน ระบบ e-GP โดยการ Log in ผ่าน www.gprocurement.go.th ไปที่เมนูรายการโครงการ กดปุ่ม ๔ จัดทำร่างสัญญา ในหัวข้อหนังสือแจ้งผู้ชนะ กดปุ่มรายละเอียด/แก้ไข กรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น วันที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ เลขที่และวันที่ของหนังสือ กดปุ่มบันทึก กดปุ่มไปขั้นตอนที่ ๒ หน้าจอจะเปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่ง ตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งนี้ ข้อความในเอกสารและข้อความในระบบต้องเหมือนกัน กดปุ่มดำเนินการขั้นตอนต่อไป เมื่อดำเนินการขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วจะได้เลขที่และวันที่หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา

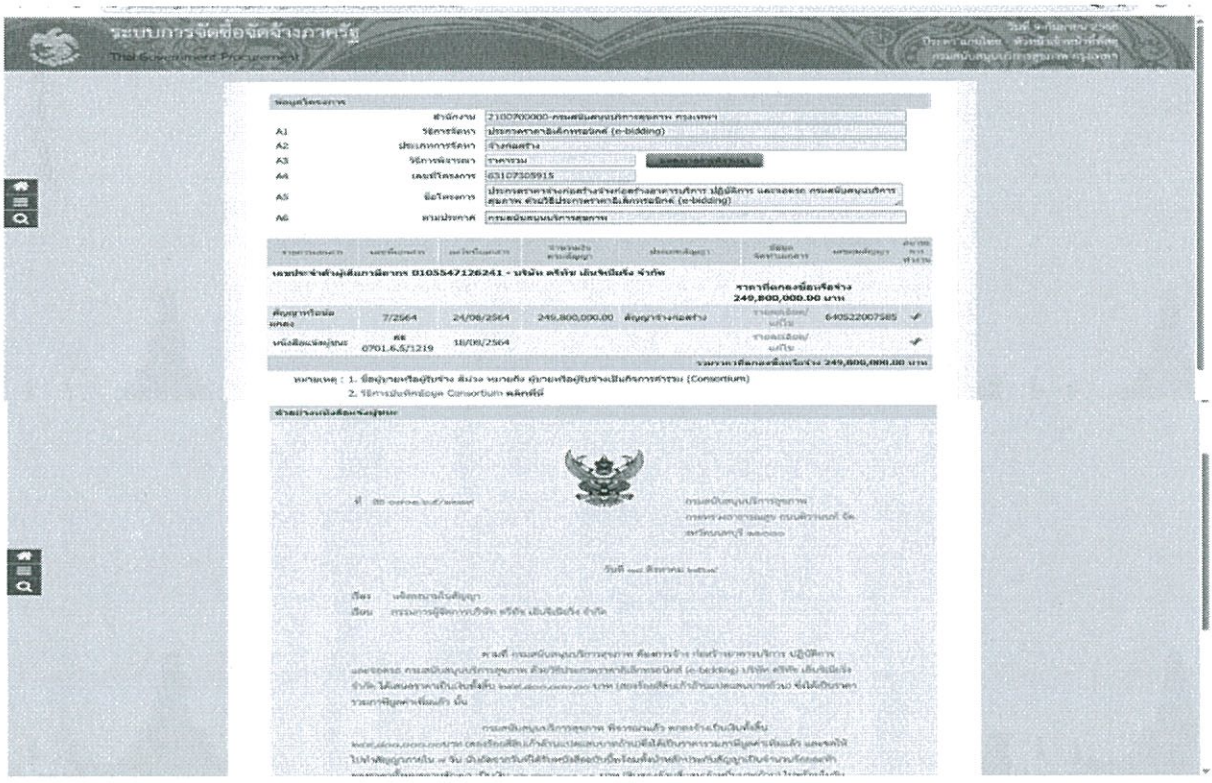

ภาพที่ ๘ ภาพแสดงการบันทึกการจัดทำร่างสัญญาจ้างก่อสร้าง

การตรวจสอบหลักประกันสัญญาและการจัดทำสัญญา (ระบบ e-GP)

ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าไปปฏิบัติงาน ระบบ e-GP โดยการ Log in ผ่าน www.gprocurement.go.th ไปที่เมนูรายการโครงการ กดปุ่ม ๕ ตรวจสอบหลักประกันและจัดทำสัญญา กดปุ่มรายละเอียด/แก้ไข กรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ยื่นหลักประกันสัญญา เช่น ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา ประเภทหลักประกัน วันที่รับหลักประกัน ประเภทหลักทรัพย์ ธนาคาร เลขที่ ระยะเวลาประกันตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ จำนวนเงิน เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึก

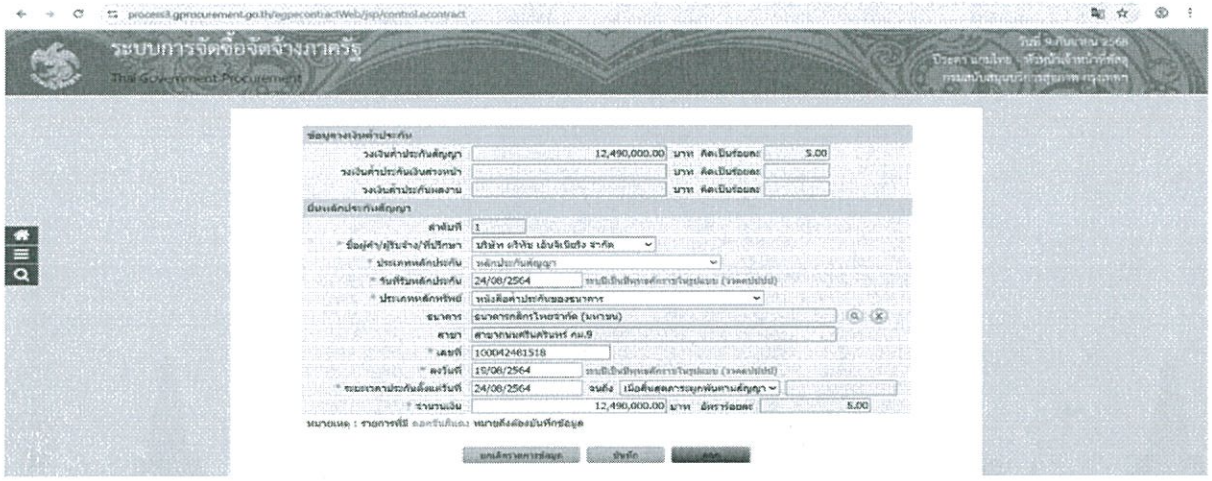

ภาพที่ ๙ ภาพแสดงการบันทึกการตรวจสอบหลักประกันสัญญาและการจัดทำสัญญา


<u>ขั้นตอนที่ ๑๗</u> การลงนามในสัญญาจ้าง

เมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้อุทธรณ์ และหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของชอบราคาการก่อสร้างจากสำนักงบประมาณแล้ว ผู้รับจ้างมาลงนามตามหนังสือได้รับแจ้งการลงนามในสัญญา ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการนำสัญญาที่ได้ดำเนินการแก้ไขตามประเด็นที่กองกฎหมายตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเอกสารภาคผนวกตามที่อ้างไว้ในสัญญาให้ผู้รับจ้างตรวจสอบความถูกต้องและสาระสำคัญของสัญญา ถ้าหากผู้รับจ้างไม่มีข้อทักท้วง ผู้ขอรับการประเมินฯแจ้งให้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างพร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารภาคผนวกที่กำหนดไว้ในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างและพยานได้ลงนามในสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการจัดทำหนังสือพร้อมทั้งสัญญาจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อลงนามในสัญญาจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ ประกอบกับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. มาตรา ๖๖ การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อย ผู้ขอรับการประเมินฯแจ้งให้ผู้รับจ้างนำสัญญาจ้างดังกล่าวไปตีตราสาร รายละเอียดตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ **ภาคผนวก ๑๔**

ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการในระบบ e-GP ควบคู่พร้อมกันไปด้วย

การลงนามในสัญญาจ้าง (ระบบ e-GP)


ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าไปปฏิบัติงาน ระบบ e-GP โดยการ Log in ผ่าน www.gprocurement.go.th ไปที่เมนูรายการโครงการ กดปุ่ม ๔ จัดทำร่างสัญญา กดปุ่ม รายละเอียด/แก้ไข นำข้อมูลที่กองกฎหมายตั้งประเด็นมาบันทึกลงในระบบ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลเลขที่และวันที่ทำสัญญา และรายละเอียดข้อมูลอื่น ๆ เช่น ได้รับการอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา จำนวนวันของสัญญา กดปุ่มบันทึก กดปุ่มไปขั้นตอนที่ ๒ หน้าจอจะเปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่ง ตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งนี้ ข้อความในเอกสารและข้อความในระบบต้องเหมือนกัน กดปุ่มดำเนินการขั้นต่อไป

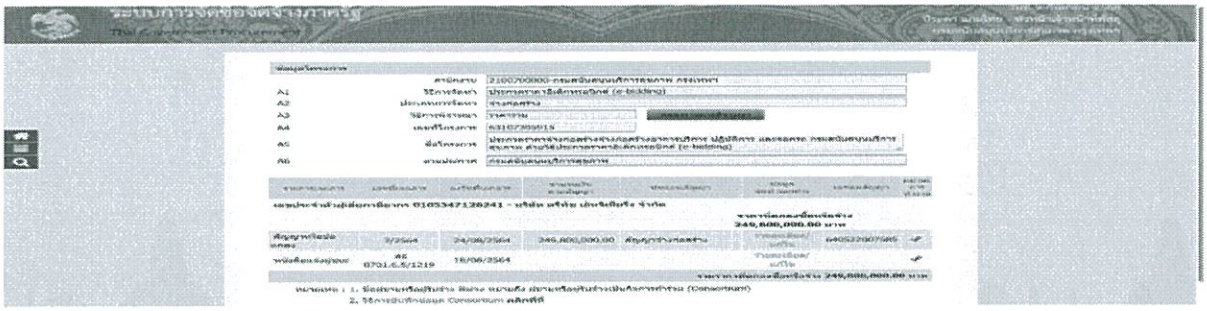

ภาพที่ ๑๐ ภาพแสดงการบันทึกการจัดสัญญาจ้างก่อสร้าง

การนำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ระบบ e-GP)

ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าไปปฏิบัติงาน ระบบ e-GP โดยการ Log in ผ่าน www.gprocurement.go.th ไปที่เมนูรายการโครงการ กดปุ่ม ๖ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา กดปุ่ม รายละเอียด/แก้ไข ตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อถูกต้องแล้วกดปุ่มดำเนินการขั้นตอนต่อไป กดปุ่มนำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

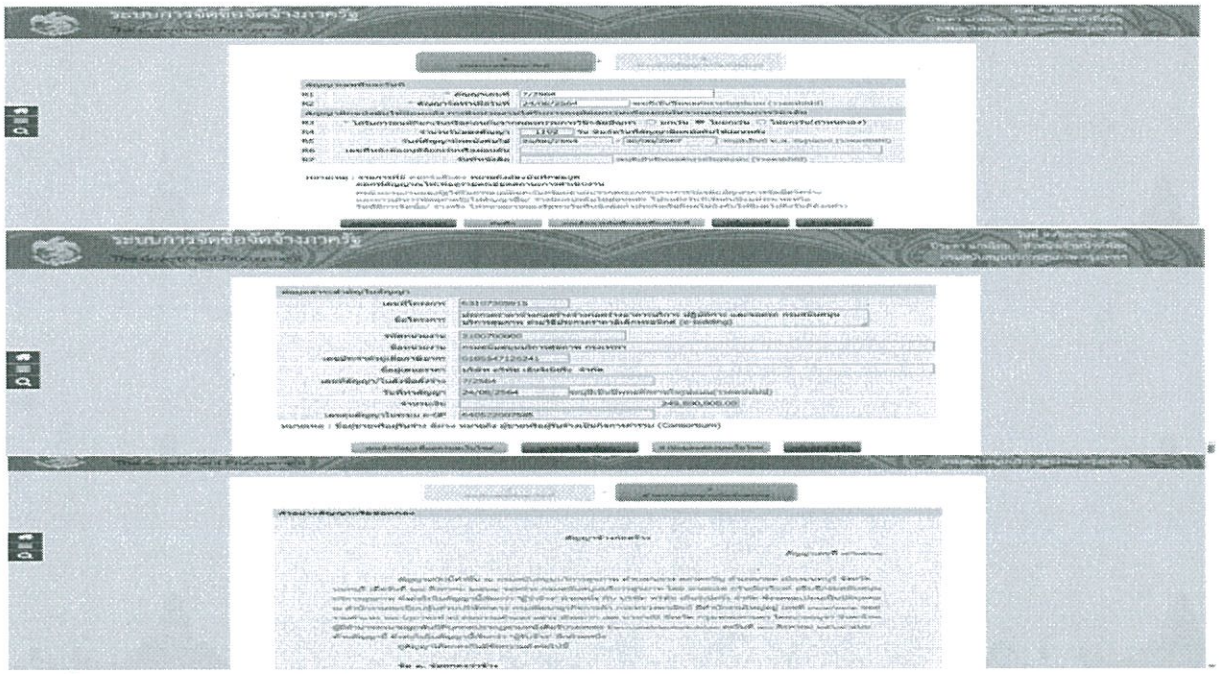

ภาพที่ ๑๑ ภาพแสดงการบันทึกการนำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

บทที่ ๔ ผลการดำเนินงาน

การจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ ในครั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ตกลงจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กับบริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นจำนวนเงิน ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามสัญญา เลขที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ และเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้เจ้าหน้าที่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีสถานที่ปฏิบัติงานที่เพียงพอทำให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และมีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและในการติดต่อขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ อีกทั้งมีสถานที่ห้องปฏิบัติการของกองสุขศึกษา และกองแบบแผน สำหรับปฏิบัติงานทำให้สภาพแวดล้อมดี ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บทที่ ๕ สรุป ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

สรุปผล

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อเป็นสถานที่จอดรถ สำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและผู้ประกอบการที่มาขอจดทะเบียนผู้ประกอบการสถานพยาบาล ในวงเงินงบประมาณ ๒๘๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาท) โดยดำเนินการดังนี้

๑. ผู้ขอรับการประเมินในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำรายงานประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบเรียบร้อยแล้วผู้ขอรับการประเมินแจ้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ประกาศเผยแพร่แผนฯในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

๒. ผู้ขอรับการประเมินในฐานเจ้าหน้าที่พัสดุ จัดรายงานขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้ขอรับการประเมินฯเชิญคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพื่อดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเมื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการขออนุมัติใช้แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเมื่อแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้รับอนุมัติแล้วผู้ขอรับการประเมินฯเชิญคณะกรรมการกำหนดราคา เพื่อดำเนินการกำหนดราคากลาง และเมื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการเสร็จแล้วจะดำเนินการขออนุมัติใช้ราคากลางต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๓. ผู้ขอรับการประเมินดำเนินการจัดทำรายงานขอจ้าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบในการประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔. เมื่อครบกำหนดประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นมายังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ ราย ผู้ขอรับการประเมินฯจัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุร่วมประชุมเพื่อพิจารณาว่าสมควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเพียงการสอบถามข้อมูล จึงเห็นไม่สมควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการประกาศเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างต่อไป และได้จัดทำหนังสือตอบผู้ประกอบการรายที่ได้แสดงความคิดเห็นแล้ว

๕. ในการประกาศเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ได้มีการให้ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ และได้มีผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเข้ามา จำนวน ๓ ราย ซึ่งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ดำเนินการตอบข้อสอบถามกับผู้ที่สนใจทั้งสามรายเป็นหนังสือเรียบร้อยแล้ว

๖. เมื่อถึงกำหนดพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการฯได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ตามที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อสรุปผลได้แล้ว จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งจ้าง ซึ่งการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงเสนอรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างกับผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น คือปลัดกระทรวงสาธารณาสุข

๗. ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และจัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นจำนวนเงิน ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๘. ในช่วงระยะให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการจัดทำร่างสัญญาจ้างก่อสร้าง (ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด) เพื่อส่งให้กองกฎหมายดำเนินการตรวจสอบ

๙. เนื่องจากราคาผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง ๑๗.๒๕ % แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยด่วน ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๑๖.๒ วรรคสอง

๑๐. ก่อนลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบราคาจากสำนักงบประมาณก่อน ซึ่งผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการจัดทำหนังสือขอความเหมาะสมของราคาตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ (๑) ในกรณีที่เป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง ให้เสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการแล้วต่อสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อนทำสัญญาก่อหนี้ผูกพัน เว้นแต่เป็นรายการที่สำนักงบประมาณได้เคยให้ความเห็นชอบความเหมาะสม ของราคาไว้แล้ว

๑๑. แจ้งลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ที่ชนะการเสนอราคาเข้ามาเซ็นสัญญาจ้างกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพภายในเวลาที่กำหนด

๑๒. เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ และสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว ผู้ขอรับการประเมินดำเนินการจัดทำสัญญาโดยการแก้ไขตามที่กองกฎหมายมีประเด็นให้แก้ไข เพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามในสัญญาจ้าง ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรสนับสนุนบริการสุขภาพ กับบริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นจำนวนเงิน ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

ปัญหา

๑. ในช่วงระยะการปรับพื้นที่และการขุดเสาเข็ม จะมีปัญหาฝุ่นละอองและดินที่ได้จากการขุดตกหล่นบริเวณทางเข้าทำงานของเจ้าหน้าที่

๒. เวลาฝนตกทำจะให้ข้างเข้าอาคารสำนักงานและอาคารบริเวณใกล้เคียงเกิดขึ้นท่วมขัง และทำให้เกิดมีผลกระทบต่อการระบายน้ำในพื้นที่บริเวณดังกล่าว

๓. ในช่วงการก่อสร้างเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานล่าช้าออกไป เป็นเหตุทำให้งานแล้วเสร็จไม่เป็นไปตามสัญญา

๔. เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่จำกัด ต้องมีการขออนุญาตใช้ถนนในการขนวัสดุ-อุปกรณ์ ในการก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐหน่วยงานอื่น

๕. เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอยู่ติดอาคารของกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทำให้มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่และตัวอาคารกองวิศวกรรมการแพทย์จากการก่อสร้าง


ข้อเสนอแนะ


ผู้ขอรับการประเมิน เห็นว่า การดำเนินการก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถยนต์กรมาสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการก่อสร้างในช่วงการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งทำให้ขาดแคลนแรงงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ตรวจ ATK) กับผู้ที่เข้าปฏิบัติงานทุกคน ทุกวัน และมอบหมายให้ผู้ขอรับการประเมินฯโทรประสานงานกับผู้รับจ้างดำเนินการตรวจ ATK อย่างเคร่งครัด และการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้มีการแก้ไขสัญญาจ้าง จำนวน ๒ ครั้ง จึงเห็นควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่ในการก่อสร้างหน้างานจริงก่อน เพื่อให้ได้ข้อมูลในการจัดทำแบบแปลนและราคากลาง อีกทั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากกรมบัญชีกลางออกกฎหมายและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งการปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยุ่งยาก มีขั้นตอนการปฏิบัติหลายขั้นตอน ในการปฏิบัติงานต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ


บรรณานุกรม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ฉบับที่ ๕
ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓/ ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒


Workflow การดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

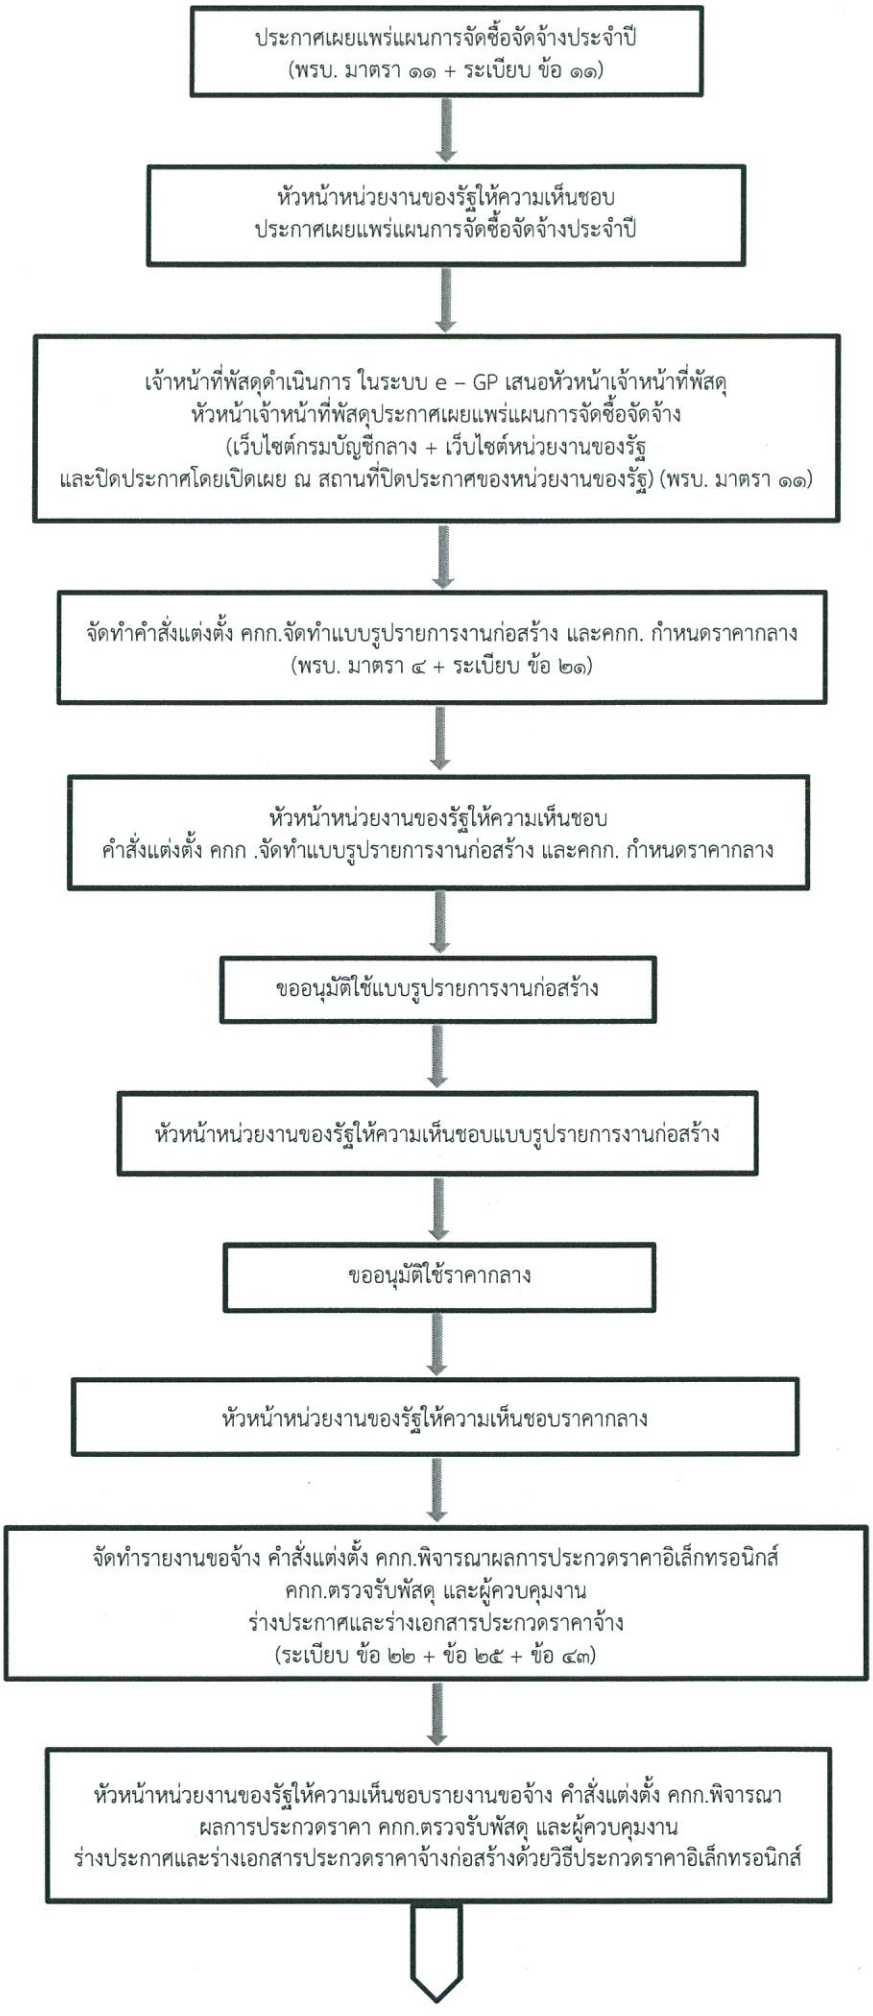

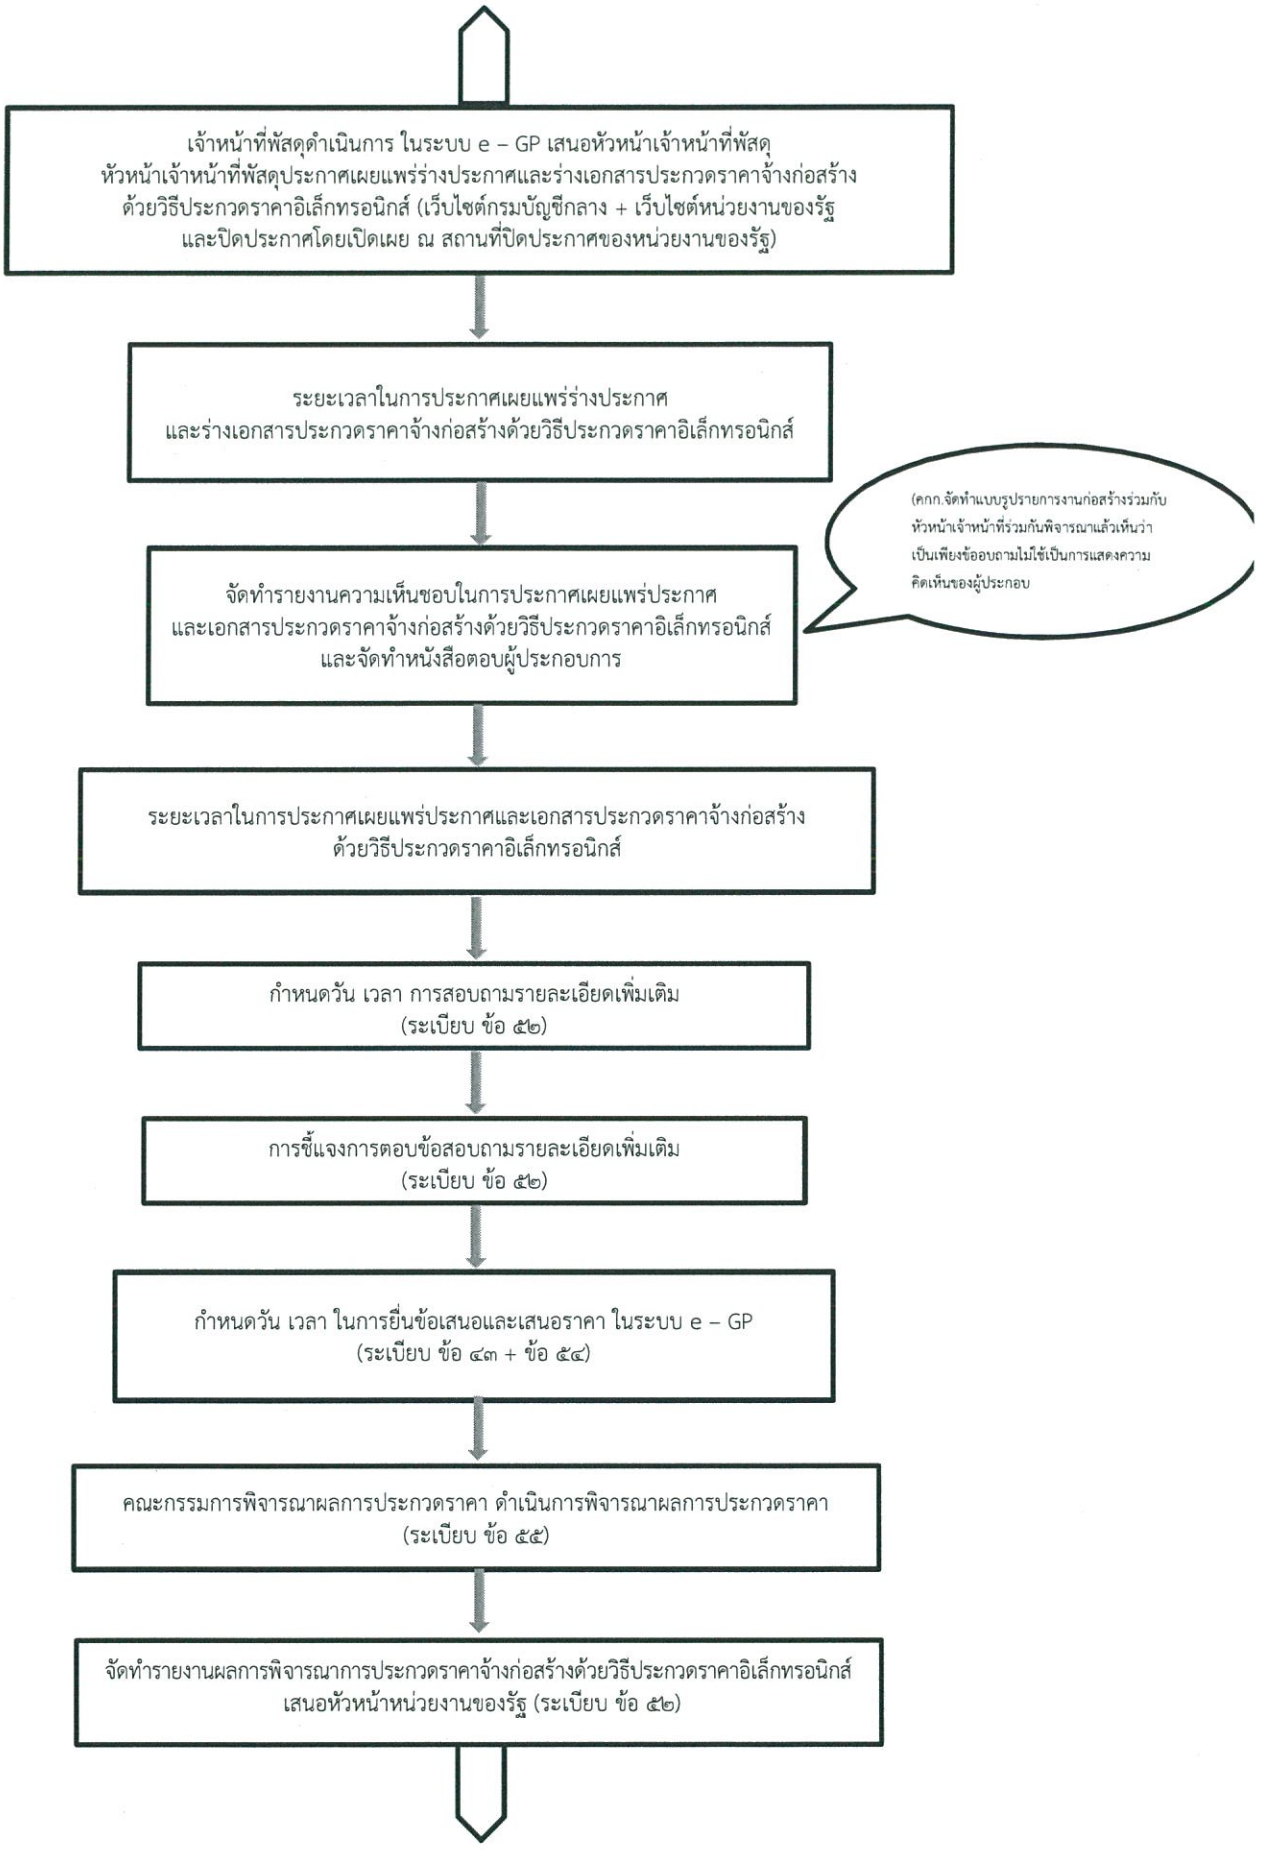
เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ ในระบบ e – GP เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง + เว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ
และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ)
ระยะเวลาในการประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ
และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จัดทำรายงานความเห็นชอบในการประกาศเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และจัดทำหนังสือตอบผู้ประกอบการ
(คกก.จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างร่วมกับ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นเพียงข้ออถามไม่ใช่เป็นการแสดงความ
คิดเห็นของผู้ประกอบ
ระยะเวลาในการประกาศเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดวัน เวลา การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
(ระเบียบ ข้อ ๕๒)
การชี้แจงการตอบข้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
(ระเบียบ ข้อ ๕๒)
กำหนดวัน เวลา ในการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในระบบ e – GP
(ระเบียบ ข้อ ๔๓ + ข้อ ๕๔)
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคา
(ระเบียบ ข้อ ๕๕)
จัดทำรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ระเบียบ ข้อ ๕๒)

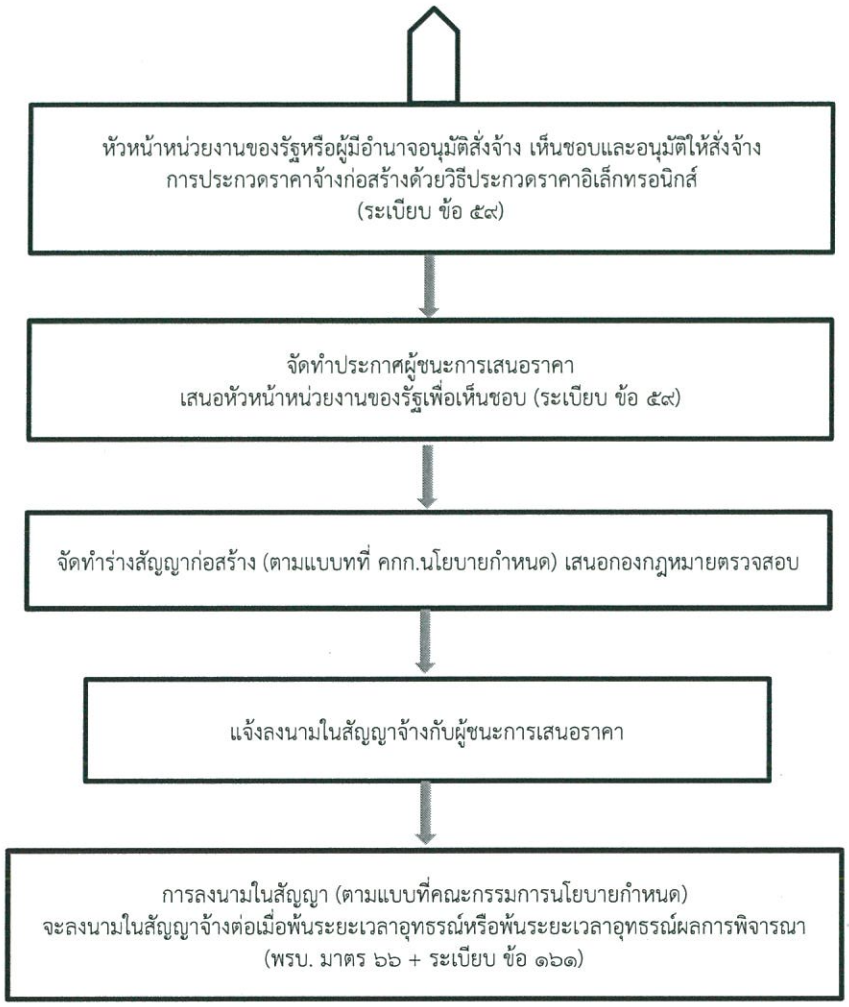
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้าง เห็นชอบและอนุมัติให้สั่งจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(ระเบียบ ข้อ ๕๙)
จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อเห็นชอบ (ระเบียบ ข้อ ๕๙)
จัดทำร่างสัญญาก่อสร้าง (ตามแบบทที่ คกก.นโยบายกำหนด) เสนอกองกฎหมายตรวจสอบ
แจ้งลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ชนะการเสนอราคา
การลงนามในสัญญา (ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด)
จะลงนามในสัญญาจ้างต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์หรือพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณา
(พรบ. มาตร ๖๖ + ระเบียบ ข้อ ๑๖๑)

การจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

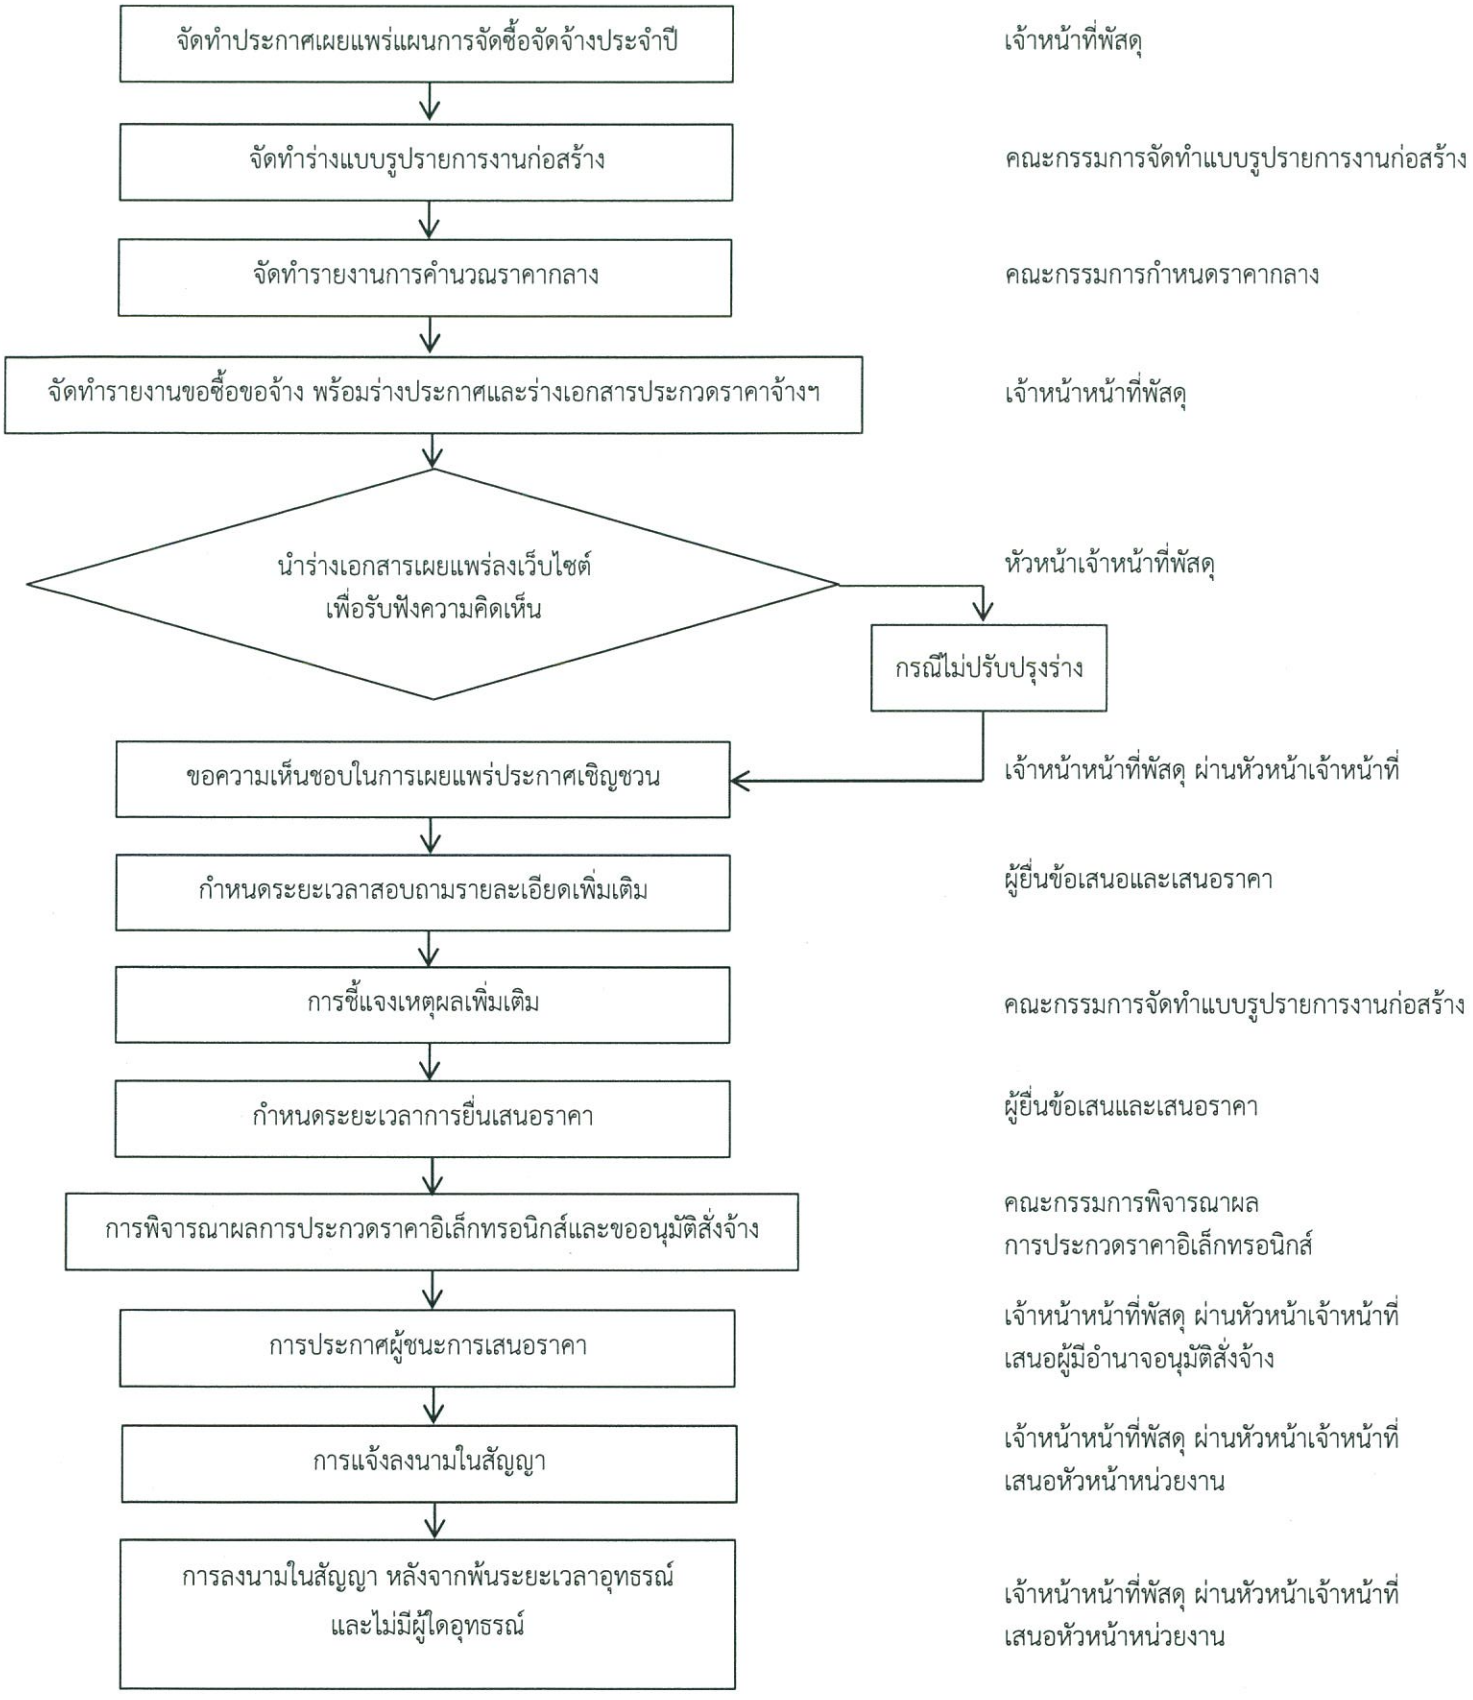

ภาคผนวก

การดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

ภาคผนวก ๑

การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี



ห้องอธิบดี
เลขที่รับ 4620
วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓
วันที่ออก.....เวลา.....

ห้องรองอธิบดี (นพ.ภานุวัฒน์)
เลขที่รับ 5500
วันที่รับ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เวลา.....
วันที่ออก ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓ เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒๐

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/ ๖๕๖๗ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

สำนักงานเลขานุการกรม ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารบริการปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขานุการกรม

อนุมัติ
ลงนามแล้ว

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
26 ต.ค. 2563

(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓

สำเนาคู่ฉบับ

ประกาศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒๖ / ต.ค. / ๖๓

ร่าง

พิมพ์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (M๖๓๑๐๐๐๒๓๑๐๗) ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๓๑๐๐๐๗๘๕๑๗	จ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๒๘๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๔

ภาคผนวก ๒

การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(2)

ห้องอธิบดี	ห้องรองอธิบดี (นพ.ภานุวัฒน์)
เลขที่รับ 7686	เลขที่รับ 5601
วันที่รับ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓	วันที่รับ 28 ต.ค. 2563 เวลา
วันที่ออก.....เวลา.....	วันที่ออก 29 ต.ค. 2563 เวลา

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒๐

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/ ๖๕๘๕ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังต่อไปนี้

(๑) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑. นายบุญยืน อยู่พิพัฒน์ ประธานกรรมการ
ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ กองวิศวกรรมการแพทย์

๒. จ่าอากาศเอกจิรัฏฐ เชื้อชาติ กรรมการ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม

๓. นายสมศักดิ์ จันทมาศ กรรมการ
ตำแหน่งนายช่างเทคนิคอาวุโส กองวิศวกรรมการแพทย์

๔ นายไกรสูรย์ เจริญวงค์ กรรมการ
ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กองแบบแผน

๕. นายเกียรติศักดิ์ ชื่นจิตร์ กรรมการ
ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กองแบบแผน

(๒) คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ประกอบด้วย

๑. นายอานุภาพ ละออ ประธานกรรมการ
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ กองวิศวกรรมการแพทย์

๒. นายอับดุลกอเดส อมรึก กรรมการ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ กองแบบแผน

๓. นายสุทธิพร ปรีชา กรรมการ
ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการ กองแบบแผน

/๔. นายนิรันดร์...

๔ นายนิรันดร์ เชี่ยวชาญชัยกุล กรรมการ
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ กองสุขศึกษา

๕. นางสาวปีระดา แกมไทย กรรมการ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม ขอเรียนว่า การอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เป็นอำนาจของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขานุการกรม

(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓

อนุมัติ
ลงนามแล้ว

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
29 ต.ค. 2563

สำเนาคู่ฉบับ

คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ ๒๒๖๒/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังต่อไปนี้

(๑) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑. นายบุญยืน อยู่พิพัฒน์ ประธานกรรมการ
ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ กองวิศวกรรมการแพทย์

๒. จ่าอากาศเอกจิรัฏฐ เชื้อชาติ กรรมการ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม

๓. นายสมศักดิ์ จันทมาศ กรรมการ
ตำแหน่งนายช่างเทคนิคอาวุโส กองวิศวกรรมการแพทย์

๔ นายไกรสูรย์ เจริญวงค์ กรรมการ
ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กองแบบแผน

๕. นายเกียรติศักดิ์ ชื่นจิตร์ กรรมการ
ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กองแบบแผน

อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน

(๒) คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ประกอบด้วย

๑. นายอานุภาพ ละออ ประธานกรรมการ
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ กองวิศวกรรมการแพทย์

๒. นายอับดุลกอเดส อมรึก กรรมการ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ กองแบบแผน

๓. นายสุทธิพร ปรีชา กรรมการ
ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการ กองแบบแผน

/๔. นายนิรันดร์...

๔ นายนิรันดร์ เชี่ยวชาญชัยกุล กรรมการ
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ กองสุขศึกษา

๕. นางสาวปีระดา แกมไทย กรรมการ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม

อำนาจหน้าที่

ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ หลัง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการแต่ละคณะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการทราบเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒๙ ต.ค. ๖๓
ร่าง
พิมพ์
ตรวจ

ภาคผนวก ๓

การขออนุมัติใช้แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปและรายละเอียด
งานจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
จำนวน ๑ แห่ง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง ขนาดสูง ๗ ชั้น พื้นที่อาคาร ๒๐,๖๑๕ ตารางเมตร ในวงเงินงบประมาณ ๒๘๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. แบบรูปและรายการประกอบแบบ

งานจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง จะต้องมีแบบรูปและรายละเอียดประกอบ ดังนี้

(๑) แบบอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ แบบเลขที่ ๑๑๐๒๙ จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๓๑๖ แผ่น

(๒) รายการประกอบแบบก่อสร้าง เอกสารเลขที่ ข.๓๒๒/พ.ย./๖๓ จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๑๑ แผ่น

(๓) มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กโครงสร้างสำหรับอาคารต้านแผ่นดินไหว
เอกสารเลขที่ ก.๑๑๓/ธ.ค./๕๘ จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๑ แผ่น

(๔) เอกสารมาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก
เอกสารเลขที่ ก.๓๙/เม.ย./๕๓ จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๓ แผ่น

(๕) รายการประกอบแบบการแก้ไขหลอดไฟฟ้าฯ
เอกสารเลขที่ ก.๗๗/มิ.ย./๖๑ จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๖ แผ่น

(๖) มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๓ + ก.๘๘/มิ.ย./๖๑ จำนวน ๑ เล่ม

(๗) มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ
(ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ HTTP://DCD.HSS.MOPH.GO.TH)

(๘) งานสถาปัตยกรรม เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗ - ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม

(๙) งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เอกสารเลขที่ ก.๑๓๙/ก.ย./๕๓ และ ก.๑๕๔/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม

(๑๐) งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม

(๑๑) งานวิศวกรรมโครงสร้าง
เอกสารเลขที่ ก.๑๔๐ - ๑๔๑/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม

(๑๒) งานวิศวกรรมเครื่องกล
เอกสารเลขที่ ก.๑๔๙ - ๑๕๓/ก.ย./๖๓ จำนวน ๑ เล่ม

/๒. คุณสมบัติ...

๑.	นายอานุภาพ	ละออ		ประธานกรรมการ
๒.	นายอับดุลกอเดส	อมรึก		กรรมการ
๓.	นายสุทธิพร	ปรีชา		กรรมการ
๔.	นายนิรันดร์	เชี่ยวชาญชัยกุล		กรรมการ
๕.	นางสาวปิระดา	แกมไทย		กรรมการ

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีอาชีพรับจ้างก่อสร้างงานที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๕ ผู้ขื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๖.๑ กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

๒.๖.๒ กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องจัดแสดงผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับอนุญาตในการประกอบวิชาชีพได้ตามกฎหมาย ซึ่งใบอนุญาตจะต้องไม่หมดอายุ โดยมีจำนวนเจ้าหน้าที่สถาปนิกและวิศวกรระดับสามัญขึ้นไปที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารเก่าและมีอำนาจเต็มประจำสถานที่ตามจำนวน ดังนี้

๒.๗.๑ งานระบบโครงสร้างจะต้องมีวิศวกรโยธา

๒.๗.๒ งานระบบไฟฟ้าจะต้องมีวิศวกรไฟฟ้า

๒.๗.๓ งานสถาปัตยกรรมจะต้องมีสถาปนิก

๒.๗.๔ งานสุขาภิบาลจะต้องมีวิศวกรสิ่งแวดล้อม

๒.๗.๕ งานเครื่องกลจะต้องมีวิศวกรเครื่องกล

โดยให้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม พร้อมหนังสือรับรองการเป็นวิศวกรและสถาปนิกที่ยังไม่หมดอายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม หรือพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม

/๒.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอ...

๑.	นายอานุภาพ	ละออ		ประธานกรรมการ
๒.	นายอับดุลกอเดส	อมรึก		กรรมการ
๓.	นายสุทธิพร	ปรีชา		กรรมการ
๔.	นายนิรันดร์	เชี่ยวชาญชัยกุล		กรรมการ
๕.	นางสาวปิระดา	แกมไทย		กรรมการ

๒.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกรอกข้อมูลลงในบัญชีและปริมาณค่าวัสดุ ค่าแรง (BOQ) ในตารางใบเสนอราคา ซึ่งเป็นเอกสารราชการตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนในขอบเขตของงาน (TOR)

๓. รายการละเอียด

๓.๑ ผลงานก่อสร้าง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้าง ต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๓.๒ สถานที่ก่อสร้าง

ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๓.๓ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและงวดงาน – งวดเงิน

กำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๐๘๐ วัน (หนึ่งพันแปดสิบวัน) นับจากวันเริ่มต้นในสัญญาจ้าง (วันที่ส่งมอบพื้นที่) โดยแบ่งงวดงาน - งวดเงิน ออกเป็น ๒๐ งวด (ยี่สิบงวด) ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๖.๕๔ % (ร้อยละหกจุดห้าสี่ของเงินตามสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการภาพ และ

๑.๑ ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง

๑.๒ ส่งแผนผังการก่อสร้าง, แผนการดำเนินงาน และวิธีก่อสร้าง และทำการปักผัง เมื่อได้รับอนุมัติแผนการดำเนินการ

๑.๓ เจาะสำรวจดิน

๑.๔ ก่อสร้างเสาเข็มได้จำนวน ๑๕๐ ต้น

๑.๕ ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๑๒๐ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๗.๔๘ % (ร้อยละเจ็ดจุดสี่แปดของเงินตามสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๒.๑ ก่อสร้างเสาเข็ม ส่วนที่เหลือ (ยกเว้นทางเดินเชื่อม)

๒.๒ ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๗๐ วัน)

/งวดที่ ๓...

๑.	นายอานุภาพ	ละออ		ประธานกรรมการ
๒.	นายอับดุลกอเดส	อมรึก		กรรมการ
๓.	นายสุทธิพร	ปรีชา		กรรมการ
๔.	นายนิรันดร์	เชี่ยวชาญชัยกุล		กรรมการ
๕.	นางสาวปิระดา	แกมไทย		กรรมการ

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๔.๗๘ % (ร้อยละสี่จุดเจ็ดแปดของเงินตามสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๓.๑ ก่อสร้างฐานรากได้ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐% ของปริมาณคอนกรีตฐานราก
๓.๒ ก่อสร้างเสาเข็มทางเดินเชื่อม
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๔.๑๖ % (ร้อยละสี่จุดหนึ่งหกของเงินตามสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๔.๑ ก่อสร้างฐานรากส่วนที่เหลือ
๔.๒ เทคอนกรีตเสาตอม่อ
๔.๓ เทคอนกรีตผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑
๔.๔ เทคอนกรีตพื้น และผนังถังเก็บน้ำใต้ดิน
๔.๕ ก่อสร้างฐานราก, เทคอนกรีตเสา - คาน ทางเดินเชื่อม
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๔.๓๔ % (ร้อยละสี่จุดสามสี่ของเงินตามสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๕.๑ เทคอนกรีตคาน - พื้นชั้นที่ ๑
๕.๒ เทคอนกรีตเสารับพื้นชั้นที่ ๒
๕.๓ เทคอนกรีตผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๒
๕.๔ เดินท่อ และฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๑ (ถ้ามี)
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๖ จำนวนเงิน ๓.๙๑ % (ร้อยละสามจุดเก้าหนึ่งของเงินตามสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๖.๑ เทคอนกรีตคาน - พื้น และพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๒
๖.๒ เทคอนกรีตเสารับพื้นชั้นที่ ๓
๖.๓ เทคอนกรีตผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๓
๖.๔ เทคอนกรีตบันได - ทางลาดขึ้นชั้นที่ ๒
๖.๕ เดินท่อ และฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๒ (ถ้ามี)
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๗ จำนวนเงิน ๓.๙๖ % (ร้อยละสามจุดเก้าหกของเงินตามสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๗.๑ เทคอนกรีตคาน - พื้น และพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๓
๗.๒ เทคอนกรีตเสารับพื้นชั้นที่ ๔
๗.๓ เทคอนกรีตผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๔
๗.๔ เทคอนกรีตบันได - ทางลาดขึ้นชั้นที่ ๓
๗.๕ เดินท่อ และฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๓ (ถ้ามี)
๗.๖ ส่งผลการดึงเส้นลวดพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๒
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

/งวดที่ ๘...

๑.	นายอานุภาพ	ละออ		ประธานกรรมการ
๒.	นายอับดุลกอเดส	อมรึก		กรรมการ
๓.	นายสุทธิพร	ปรีชา		กรรมการ
๔.	นายนิรันดร์	เชี่ยวชาญชัยกุล		กรรมการ
๕.	นางสาวปิระดา	แกมไทย		กรรมการ

งวดที่ ๘ จำนวนเงิน ๓.๖๒ % (ร้อยละสามจุดหกสองของเงินตามสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๘.๑ เทคอนกรีตคาน - พื้น และพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๔
๘.๒ เทคอนกรีตเสารับพื้นชั้นที่ ๕
๘.๓ เทคอนกรีตผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๕
๘.๔ เทคอนกรีตบันได - ทางลาดขึ้นชั้นที่ ๔
๘.๕ เดินท่อ และฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๔ (ถ้ามี)
๘.๖ ส่งผลการดึงเส้นลวดพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๓
๘.๗ ก่อสร้างกระบะต้นไม้ ค.ส.ล. ที่จอดรถ ชั้นที่ ๒
๘.๘ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑
๘.๙ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และท่อระบบดับเพลิงภายใน ชั้นที่ ๑
๘.๑๐ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า - สื่อสารภายใน ชั้นที่ ๑
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๙ จำนวนเงิน ๔.๑๙ % (ร้อยละสี่จุดหนึ่งเก้าของเงินตามสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๙.๑ เทคอนกรีตคาน - พื้น และพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๕
๙.๒ เทคอนกรีตเสารับพื้นชั้นที่ ๖
๙.๓ เทคอนกรีตผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๖
๙.๔ เทคอนกรีตบันได - ทางลาดขึ้นชั้นที่ ๕
๙.๕ เดินท่อ และฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๕ (ถ้ามี)
๙.๖ ส่งผลการดึงเส้นลวดพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๔
๙.๗ ก่อสร้างกระบะต้นไม้ ค.ส.ล. ที่จอดรถ ชั้นที่ ๓
๙.๘ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๒
๙.๙ ฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ ๑
๙.๑๐ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และท่อระบบดับเพลิงภายใน ชั้นที่ ๒
๙.๑๑ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟ - สื่อสารภายใน ชั้นที่ ๒
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

/งวดที่ ๑๐...

๑.	นายอานุภาพ	ละออ		ประธานกรรมการ
๒.	นายอับดุลกอเดส	อมรึก		กรรมการ
๓.	นายสุทธิพร	ปรีชา		กรรมการ
๔.	นายนิรันดร์	เชี่ยวชาญชัยกุล		กรรมการ
๕.	นางสาวปิระดา	แกมไทย		กรรมการ

งวดที่ ๑๐ จำนวนเงิน ๔.๑๕ % (ร้อยละสี่จุดหนึ่งห้าของเงินตามสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๐.๑ เทคอนกรีตคาน - พื้น และพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๖
๑๐.๒ เทคอนกรีตเสารับพื้นชั้นที่ ๗
๑๐.๓ เทคอนกรีตผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๗
๑๐.๔ เทคอนกรีตบันได - ทางลาดขึ้นชั้นที่ ๖
๑๐.๕ เดินท่อ และฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๖ (ถ้ามี)
๑๐.๖ ส่งผลการดึงเส้นลวดพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๕
๑๐.๗ ก่อสร้างกระบะต้นไม้ ค.ส.ล. ที่จอดรถ ชั้นที่ ๔
๑๐.๘ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๓
๑๐.๙ บุกระเบื้องผนังชั้นที่ ๑
๑๐.๑๐ ฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ ๒
๑๐.๑๑ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และท่อระบบดับเพลิง ชั้นที่ ๓
๑๐.๑๒ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าภายในชั้นที่ ๓
๑๐.๑๓ ร้อยสายไฟฟ้า - สื่อสารภายใน ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒
๑๐.๑๔ เดินท่อระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๑
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๑๑ จำนวนเงิน ๔.๘๖ % (ร้อยละสี่จุดแปดหกของเงินตามสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๑.๑ เทคอนกรีตคาน - พื้น และพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๗ (ทั้งสองระดับ)
๑๑.๒ เทคอนกรีตเสารับพื้นชั้นดาดฟ้า
๑๑.๓ เทคอนกรีตผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า
๑๑.๔ เทคอนกรีตบันได - ทางลาดขึ้นชั้นที่ ๗
๑๑.๕ เดินท่อ และฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๗ (ถ้ามี)
๑๑.๖ ส่งผลการดึงเส้นลวดพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๖
๑๑.๗ ก่อสร้างกระบะต้นไม้ ค.ส.ล. ที่จอดรถ ชั้นที่ ๕
๑๑.๘ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๔
๑๑.๙ ฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ ๓
๑๑.๑๐ บุกระเบื้องผนังชั้นที่ ๒
๑๑.๑๑ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และท่อระบบดับเพลิงภายใน ชั้นที่ ๔
๑๑.๑๒ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าภายใน ชั้นที่ ๔
๑๑.๑๓ เดินท่อระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๒
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

/งวดที่ ๑๒...

๑.	นายอานุภาพ	ละออ		ประธานกรรมการ
๒.	นายอับดุลกอเดส	อมรึก		กรรมการ
๓.	นายสุทธิพร	ปรีชา		กรรมการ
๔.	นายนิรันดร์	เชี่ยวชาญชัยกุล		กรรมการ
๕.	นางสาวปิระดา	แกมไทย		กรรมการ

งวดที่ ๑๒ จำนวนเงิน ๔.๐๕ % (ร้อยละสี่จุดศูนย์ห้าของเงินตามสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๒.๑ เทคอนกรีตคาน - พื้น และพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นดาดฟ้า
๑๒.๒ เทคอนกรีตเสารับพื้นชั้นหลังคา
๑๒.๓ เทคอนกรีตผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นหลังคา
๑๒.๔ เทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นดาดฟ้า
๑๒.๕ เดินท่อ และฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นดาดฟ้า (ถ้ามี)
๑๒.๖ ส่งผลการดึงเส้นลวดพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๗
๑๒.๗ ก่อสร้างกระบะต้นไม้ ค.ส.ล. ที่จอดรถ ชั้นที่ ๖
๑๒.๘ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๕
๑๒.๙ ฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ ๔
๑๒.๑๐ บุกระเบื้องผนังชั้นที่ ๓
๑๒.๑๑ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และท่อระบบดับเพลิงภายใน ชั้นที่ ๕
๑๒.๑๒ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าภายใน ชั้นที่ ๕
๑๒.๑๓ ร้อยสายไฟฟ้า - สื่อสารภายใน ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔
๑๒.๑๔ เดินท่อระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๓
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๑๓ จำนวนเงิน ๒.๕ % (ร้อยละสองจุดห้าของเงินตามสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๓.๑ เทคอนกรีตคาน - พื้น และพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นหลังคา
๑๓.๒ ส่งผลการดึงเส้นลวดพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นดาดฟ้า
๑๓.๓ ก่อสร้างกระบะต้นไม้ ค.ส.ล. ที่จอดรถ ชั้นที่ ๗
๑๓.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๖
๑๓.๕ ฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ ๕
๑๓.๖ บุกระเบื้องผนังชั้นที่ ๔
๑๓.๗ ติดตั้งฝ้าเพดานภายในชั้นที่ ๑ - ชั้นที่ ๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้างอื่น)
๑๓.๘ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และท่อระบบดับเพลิงภายใน ชั้นที่ ๖
๑๓.๙ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าภายใน ชั้นที่ ๖
๑๓.๑๐ เดินท่อระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๔
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

/งวดที่ ๑๔...

๑.	นายอานุภาพ	ละออ		ประธานกรรมการ
๒.	นายอับดุลกอเดส	อมรึก		กรรมการ
๓.	นายสุทธิพร	ปรีชา		กรรมการ
๔.	นายนิรันดร์	เชี่ยวชาญชัยกุล		กรรมการ
๕.	นางสาวปิระดา	แกมไทย		กรรมการ

งวดที่ ๑๔ จำนวนเงิน ๓.๐๑ % (ร้อยละสามจุดศูนย์หนึ่งของเงินตามสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๔.๑ ติดตั้งโครงหลังคา และมุงหลังคา
๑๔.๒ ติดตั้งหลังคา และเกล็ดอลูมิเนียมชุ้มทางเข้าโรงอาหาร
๑๔.๓ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๗
๑๔.๔ ฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ ๖
๑๔.๕ บุกระเบื้องผนังชั้นที่ ๕
๑๔.๖ ปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒
๑๔.๗ ติดตั้งฝ้าเพดานภายในชั้นที่ ๓ - ชั้นที่ ๔ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้างอื่น)
๑๔.๘ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และท่อระบบดับเพลิงภายใน ชั้นที่ ๗
๑๔.๙ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าภายใน ชั้นที่ ๗
๑๔.๑๐ ร้อยสายไฟฟ้า - สื่อสารภายใน ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖
๑๔.๑๑ เดินท่อระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๕
๑๔.๑๒ เดินท่อส่งลมระบบระบายอากาศ ชั้นที่ ๑ – ชั้นที่ ๔
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๑๕ จำนวนเงิน ๓.๔๗ % (ร้อยละสามจุดสี่เจ็ดของเงินตามสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๕.๑ ก่ออิฐผนังส่วนที่เหลือ
๑๕.๒ ฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ ๗
๑๕.๓ บุกระเบื้องผนังชั้นที่ ๖
๑๕.๔ บุหินแกรนิตผนังหน้าลิฟต์
๑๕.๕ ปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔
๑๕.๖ ติดตั้งฝ้าเพดานภายในชั้นที่ ๕ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้างอื่น)
๑๕.๗ เทปูทรายรองพื้นสำหรับปูกระเบื้องยาง (ยกเว้นกระเบื้องยาง)
๑๕.๘ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๑ - ชั้นที่ ๔
๑๕.๙ ร้อยสายไฟฟ้า - สื่อสาร ส่วนที่เหลือ
๑๕.๑๐ เดินท่อส่งลมระบบระบายอากาศ ชั้นที่ ๕ – ชั้นที่ ๗
๑๕.๑๑ ติดตั้งดวงโคม เต้ารับ สวิทช์ และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ชั้นที่ ๑ - ชั้นที่ ๓
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

/งวดที่ ๑๖ ...

๑.	นายอานุภาพ	ละออ		ประธานกรรมการ
๒.	นายอับดุลกอเดส	อมรึก		กรรมการ
๓.	นายสุทธิพร	ปรีชา		กรรมการ
๔.	นายนิรันดร์	เชี่ยวชาญชัยกุล		กรรมการ
๕.	นางสาวปิระดา	แกมไทย		กรรมการ

งวดที่ ๑๖ จำนวนเงิน ๔.๓๒ % (ร้อยละสี่จุดสามสองของเงินตามสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๖.๑ ติดตั้งฝ้าเพดานภายในชั้นที่ ๖ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้างอื่น)
๑๖.๒ ปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖
๑๖.๓ ทำผิวโพลียูริเทนที่จอดรถ ชั้นที่ ๒ - ชั้นที่ ๔
๑๖.๔ ติดตั้งงานประตู - หน้าต่าง และอุปกรณ์ ชั้นที่ ๑ - ชั้นที่ ๔
๑๖.๕ ติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ ชั้นที่ ๑ - ชั้นที่ ๔
๑๖.๖ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๕ - ชั้นดาดฟ้า
๑๖.๗ ก่อสร้างบ่อพักน้ำ และท่อระบายน้ำ
๑๖.๘ ติดตั้งดวงโคม เต้ารับ สวิทช์ และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ชั้นที่ ๔ - ชั้นที่ ๕
๑๖.๙ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๑
๑๖.๑๐ ทาสีรองพื้นภายในอาคาร
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๑๗ จำนวนเงิน ๘.๕๘ % (ร้อยละแปดจุดห้าแปดของเงินตามสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๗.๑ ปูกระเบื้องพื้นส่วนที่เหลือ
๑๗.๒ ติดตั้งฝ้าเพดานภายในชั้นที่ ๗ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้างอื่น)
๑๗.๓ ทำผิวโพลียูริเทนที่จอดรถ ชั้นที่ ๕ - ชั้นที่ ๗
๑๗.๔ ติดตั้งงานประตู - หน้าต่าง และอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือ
๑๗.๕ ติดตั้งงานกระจก
๑๗.๖ ติดตั้งแผงตะแกรงเหล็กฉีก
๑๗.๗ ติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือ
๑๗.๘ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง
๑๗.๙ ติดตั้งดวงโคม เต้ารับ สวิทช์ และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนที่เหลือ
๑๗.๑๐ ติดตั้งตู้เมนไฟฟ้าประจำชั้น
๑๗.๑๑ ติดตั้ง BUS DUCT
๑๗.๑๒ ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
๑๗.๑๓ ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้
๑๗.๑๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๗
๑๗.๑๕ ทาสีจริงภายในรอบที่ ๑ ชั้นที่ ๑ - ชั้นที่ ๔
๑๗.๑๖ ติดตั้งโครงสร้างเหล็ก และวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ทางเดินเชื่อม
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

/งวดที่ ๑๘...

๑.	นายอานุภาพ	ละออ		ประธานกรรมการ
๒.	นายอับดุลกอเดส	อมรึก		กรรมการ
๓.	นายสุทธิพร	ปรีชา		กรรมการ
๔.	นายนิรันดร์	เชี่ยวชาญชัยกุล		กรรมการ
๕.	นางสาวปิระดา	แกมไทย		กรรมการ

งวดที่ ๑๘ จำนวนเงิน ๘.๗๓ % (ร้อยละแปดจุดเจ็ดสามของเงินตามสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๘.๑ ติดตั้งฝ้าเพดานภายในส่วนที่เหลือ และติดตั้งฝ้าเพดานภายนอกอาคาร
๑๘.๒ ติดตั้งผนัง ALUMINIUM COMPOSITE
๑๘.๓ ติดตั้งแผงกันแดด
๑๘.๔ ติดตั้งราวบันไดสแตนเลส และราวกันตก
๑๘.๕ ทำผิวโพลียูริเทนที่จอดรถ ส่วนที่เหลือ
๑๘.๖ ทำระบบกันซึมและกันความร้อน
๑๘.๗ ทำผิวหินขัด พร้อมขัดครั้งที่ ๑
๑๘.๘ ทำผิวทรายล้าง และตกแต่งผิวพื้นส่วนที่เหลือ
๑๘.๙ ติดตั้งตู้ MDB
๑๘.๑๐ ติดตั้งงานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และงานระบบไฟฟ้า
๑๘.๑๑ ติดตั้งระบบโทรศัพท์, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบเสาอากาศวิทยุ - โทรทัศน์แบบดิจิตอล
๑๘.๑๒ ติดตั้งชุดระบายลมร้อนของเครื่องปรับอากาศ
๑๘.๑๓ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ
๑๘.๑๔ ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ
๑๘.๑๕ ติดตั้งรางลิฟต์
๑๘.๑๖ ติดตั้งครุภัณฑ์ (จัดจ้าง) ชั้นที่ ๑
๑๘.๑๗ ทาสีจริงภายในรอบที่ ๑ ส่วนที่เหลือ
๑๘.๑๘ ทาสีรองพื้นภายนอก
๑๘.๑๙ ติดตั้งถังเก็บน้ำสแตนเลส
๑๘.๒๐ ติดตั้งโครงหลังคาและมุงหลังคาทางเดินเชื่อม
๑๘.๒๑ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแรงสูง
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๑๙ จำนวนเงิน ๘.๙ % (ร้อยละแปดจุดเก้าของเงินตามสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๙.๑ ติดตั้งระบบเสียงประกาศ
๑๙.๒ ติดตั้งระบบภาพและเสียงห้องบรรยายชั้นที่ ๓
๑๙.๓ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
๑๙.๔ ติดตั้งชุดตรวจจับและนับจำนวนรถ
๑๙.๕ ติดตั้ง WHEEL STOP และฉากมุมเสา
๑๙.๖ ติดตั้งลิฟต์ ส่วนที่เหลือ
๑๙.๗ ติดตั้งครุภัณฑ์ (จัดจ้าง) ส่วนที่เหลือ
๑๙.๘ ทาสีภายในอาคารส่วนที่เหลือ
๑๙.๙ ทาสีจริงภายนอก รอบที่ ๑
๑๙.๑๐ ติดตั้งงานทางเดินเชื่อมส่วนที่เหลือ
๑๙.๑๑ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

/งวดที่ ๒๐...

๑.	นายอานุภาพ	ละออ		ประธานกรรมการ
๒.	นายอับดุลกอเดส	อมรึก		กรรมการ
๓.	นายสุทธิพร	ปรีชา		กรรมการ
๔.	นายนิรันดร์	เชี่ยวชาญชัยกุล		กรรมการ
๕.	นางสาวปิระดา	แกมไทย		กรรมการ

งวดที่ ๒๐ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๔.๔๕ % (ร้อยละสี่จุดสี่ห้าของเงินตามสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๒๐.๑ ปูกระเบื้องยาง

๒๐.๒ ทาสีจริงภายนอกส่วนที่เหลือ

๒๐.๓ จัดวาง และส่งมอบครุภัณฑ์ (จัดซื้อ)

๒๐.๔ ติดตั้ง HOOD ดูดควัน และระบบแก๊สหุงต้ม

๒๐.๕ ตีเส้นช่องจอดรถ และเครื่องหมายจราจร และทาสีส่วนที่เหลือ

๒๐.๖ ทดสอบระบบต่างๆ

๒๐.๗ ส่งแบบ AS-BUILT DRAWING

๒๐.๘ จัดส่งคู่มือการใช้งาน และเอกสารรับประกันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒๐.๙ ทำความสะอาดอาคาร และบริเวณ

และได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

๓.๔ ข้อกำหนดอื่น ๆ

๓.๔.๑ ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ขอใช้พื้นที่ส่วนจอดรถจำนวน ๒ ชั้น ในช่วงระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวก โดยให้ผู้รับจ้างเสนอแนวทางสัญจรและการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทุกกรณี ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๓.๔.๒ ในกรณีผู้ว่าจ้างต้องการเพิ่มเติมพื้นที่ชั้นจอดรถให้มากขึ้นจากแบบเดิมอีก ๓ ชั้น ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการ

๓.๕ วงเงินในการจัดจ้าง

เงินงบประมาณโครงการ เป็นเงิน ๒๘๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) จ่ายจากเงินงบประมาณของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวดงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

๓.๖ การจ่ายเงินล่วงหน้า

ไม่มี

/๓.๗ ความรับผิด...

๑.	นายอานุภาพ	ละออ		ประธานกรรมการ
๒.	นายอับดุลกอเดส	อมรึก		กรรมการ
๓.	นายสุทธิพร	ปรีชา		กรรมการ
๔.	นายนิรันดร์	เชี่ยวชาญชัยกุล		กรรมการ
๕.	นางสาวปิระดา	แกมไทย		กรรมการ

๓.๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้เรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๓.๘ มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีช่างซึ่งจะต้องเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือจากสถาบันของทางราชการหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือเป็นผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๒.๘.๑ ช่างโยธา
๒.๘.๒ ช่างไฟฟ้า
๒.๘.๓ ช่างสถาปัตยกรรม
๒.๘.๔ ช่างสุขาภิบาล
๒.๘.๕ ช่างเครื่องกล

๓.๙ รายละเอียดอื่น ๆ

๓.๙.๑ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วทำให้อาคารและส่วนประกอบของอาคารเดิม หรือถนน หรือระบบสาธารณูปโภค หรือทรัพย์สินของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเสียหาย โดยต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม หรือต้องชดใช้ในราคาที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนด

๓.๙.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการประสานงานกับการไฟฟ้า และการประปาในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อขอใช้กระแสไฟฟ้า และน้ำประปา เป็นการชั่วคราวในการก่อสร้าง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด

๓.๙.๓ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานก่อสร้าง (FLOW CHART) แสดงรายละเอียดขั้นตอนวิธีการทำงานและเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง อัตรากำลังของเครื่องจักร พร้อมรายชื่อสถาปนิก วิศวกรโยธา ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ควบคุมงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง

/๓.๙.๔ ผู้รับจ้าง... ...

๑.	นายอานุภาพ	ละออ		ประธานกรรมการ
๒.	นายอับดุลกอเดส	อมรีก		กรรมการ
๓.	นายสุทธิพร	ปรีชา		กรรมการ
๔.	นายนิรันดร์	เชี่ยวชาญชัยกุล		กรรมการ
๕.	นางสาวปิระดา	แกมไทย		กรรมการ

๓.๙.๔ ผู้รับจ้างต้องล้อมรั้วบริเวณก่อสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้สัญจรไปมา

๓.๙.๕ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไม่อนุญาตให้คนงานของผู้รับจ้างพักในบริเวณของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้รับจ้าง การอนุญาตให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๓.๙.๖ ผู้รับจ้างจะต้องทำความเข้าใจกับแบบทั้งหมด ตลอดจนเอกสารประกอบสัญญาให้เข้าใจถี่ถ้วนเสียก่อนที่จะเริ่มทำการก่อสร้าง เพื่อจะลำดับงานให้ถูกต้อง ไม่ผิดพลาด ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

๓.๙.๗ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับงานก่อสร้างครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำตามที่ระบุในแบบและรายการโดยจะต้องนำหรือทำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นชอบเสียก่อนจึงจะนำมาใช้ได้ การขอใช้วัสดุเทียบเท่า ผู้รับจ้างสามารถกระทำได้ โดยเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาพร้อมตัวอย่างและเอกสารประกอบ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างควรจะเสนอล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีเวลาพิจารณาตรวจสอบในกรณีที่คณะกรรมการฯ เห็นว่า วัสดุหรืออุปกรณ์นั้น จำเป็นต้องมีการทดสอบคุณสมบัติ เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณา ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ แจ้งให้ทราบ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๓.๙.๘ ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ก่อความเดือดร้อนรำคาญ สร้างความสกปรกรกรุงรังและทิ้งสิ่งปฏิกูลในบริเวณที่ก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียง ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่างานก่อสร้างใดน่าจะเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญแต่ผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างตามวิธีและในเวลาที่เหมาะสม ในอันที่จะลดเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควร โดยการใดที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างไม่อาจถือเป็นเหตุเพื่อขอขยายเวลาการก่อสร้างและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ว่าจ้าง

๔. เกณฑ์การพิจารณา

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอใช้เกณฑ์ราคา จะพิจารณาจากราคารวม

๕. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานเลขานุการกรม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โดยขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๔๕ หรือเสนอแนะวิจารณ์ทาง e - mail : hss.tor@hss.mail.go.th

---

๑.	นายอานุภาพ	ละออ		ประธานกรรมการ
๒.	นายอับดุลกอเดส	อมรึก		กรรมการ
๓.	นายสุทธิพร	ปรีชา		กรรมการ
๔.	นายนิรันดร์	เชี่ยวชาญชัยกุล		กรรมการ
๕.	นางสาวปิระดา	แกมไทย		กรรมการ

ภาคผนวก ๔

การขออนุมัติใช้ราคากลาง

ห้องอธิบดี
เลขที่รับ 5405
วันที่รับ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา.....
วันที่ออก.....เวลา.....

ห้องรองอธิบดี (นพ.ภานุวัฒน์)
เลขที่รับ 6857
วันที่รับ 17 ธ.ค. 2563 เวลา.....
วันที่ออก.....เวลา 2563

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒๐

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/ ๗๕๕๐ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๗๑๔๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๙๒,๘๙๕,๖๗๒ บาท (สองร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติใช้ราคากลางของงานก่อสร้างดังกล่าว เพื่อจะได้นำไปใช้ในการดำเนินการจัดจ้างต่อไป นั้น

สำนักงานเลขานุการกรม ขอเรียนว่า

๑. การขออนุมัติใช้ราคากลาง งานก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง ดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔

๒. อำนาจในการอนุมัติให้ใช้ราคากลาง งานก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง เป็นอำนาจของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขานุการกรม

ชอบ
ลงนามแล้ว

(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑๗ ธ.ค. 2563

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
21 ธ.ค. 2563

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒๐

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/ ๗๔๙ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้ากลุ่มคลัง)

ตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๒๒๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งผู้มีรายนามท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางของงานจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง ในวงเงินงบประมาณ ๒๘๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางของงานจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๒๙๒,๘๙๕,๖๗๒ บาท (สองร้อยเก้าสิบสองล้าน-แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารดังนี้

- บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
- บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แบบ ปร..๔ จำนวน ๓๘ แผ่น
- รายละเอียดการคำนวณหาค่า Factor - F เฉลี่ย จำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติให้ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการฯเสนอ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายบุญยืน อยู่พิพัฒน์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(จ่าอากาศเอกจิรัฏฐ เชื้อชาติ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสมศักดิ์ จันทมาศ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายไกรสูรย์ เจริญวงค์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ชื่นจิตร์)

/ความเห็น...

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางของงานจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔

ดังนั้น อำนาจในการให้ความเห็นชอบราคากลางของงานจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง เป็นจำนวนเงิน ๒๙๒,๘๙๕,๖๗๒ บาท (สองร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) เป็นอำนาจของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นจำนวนเงิน ๒๙๒,๘๙๕,๖๗๒ บาท (สองร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่
(นางสาวปีระดา แกมไทย)
๑๕ ธ.ค. ๖๓

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวปีระดา แกมไทย)
๑๕ ธ.ค. ๖๓

(นางสาวสุนทรี มีมุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
แทนหัวหน้ากลุ่มคลัง
๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

☑ อนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....
(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
21 ธ.ค. 2563

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขานุการกรม
๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุภาพ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๘๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณ ๓ ปีงบประมาณ ดังนี้

ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๕๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท

ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๑๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท

ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๑๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง ขนาดสูง ๗ ชั้น พื้นที่ประมาณ ๒๐,๖๑๕ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๙๒,๘๙๕,๖๗๒ บาท

(สองร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๔)

๖.๒ การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย

๖.๓ บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบุญยืน อยู่พิพัฒน์

๗.๒ จ่าอากาศเอกจิรัฏฐ เชื้อชาติ

๗.๓ นายสมศักดิ์ จันทมาศ

๗.๔ นายไกรสูรย์ เจริญวงค์

๗.๕ นายเกียรติศักดิ์ ชื่นจิตร์

ภาคผนวก ๕

การจัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ด่วนที่สุด

สำเนาคู่ฉบับ
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒๐

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๗๕๓๙ **วันที่** ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสืองานพัสดุ กลุ่มคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๗๕๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า สำนักงานเลขานุการกรม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานขอจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๒๘๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติดำเนินการจ้างก่อสร้างดังกล่าว นั้น

สำนักงานเลขานุการกรม ขอเรียนว่า การอนุมัติให้ดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๒๘๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) การลงนามในร่างประกาศประกวดราคาจ้าง และการลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เป็นอำนาจของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสืองานพัสดุ กลุ่มคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขานุการกรม

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มคลัง สำนักงานเลขานุการกรม โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒๐

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/ ๗๕๒๕ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้ากลุ่มคลัง)

ด้วยสำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง จึงมีความประสงค์จะขออนุมัติจัดจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าว เพื่อสำหรับการปฏิบัติงาน และจอดรถสำหรับบุคลากรภายในหน่วยงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้มาขอรับบริการกับกรม

๒. รายละเอียดของพัสดุ

จ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลาง

ราคากลางเป็นราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดรายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๗๑๔๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๙๒,๘๙๕,๖๗๒.๐๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๘๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จ ภายใน ๑,๐๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผล

ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เนื่องจากเป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

/๘. ร่างประกาศ...

๘. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควรนำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา ไปเผยแพร่เพื่อสาธารณะเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

๙. กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา

๑๐. ข้อเสนออื่น ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

๑. นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		ประธานกรรมการ
๒. นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม		กรรมการ
๓. นายวินัย ฉายากุล วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารชำนาญการพิเศษ กองวิศวกรรมการแพทย์		กรรมการ
๔. นายไกรสูรย์ เจริญวงค์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กองแบบแผน		กรรมการ
๕. นายเกียรติศักดิ์ ชื่นจิตร์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กองแบบแผน		กรรมการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย

๑. นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		ประธานกรรมการ
๒. นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการกองแบบแผน		กรรมการ
๓. นายสละ กสิวัตร์ วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารชำนาญการพิเศษ กองวิศวกรรมการแพทย์		กรรมการ
๔. นายอับดุลกอเดส อมรึก วิศวกรโยธาชำนาญการ กองแบบแผน		กรรมการ
๕. นายสุทธิพร ปรีชา สถาปนิกชำนาญการ กองแบบแผน		กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย

๑. นายสุพร ชุมทอง นายช่างโยธาอาวุโส กองแบบแผน		หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
๒. นายอโนทัย พิมพ์สุวรรณศรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กองแบบแผน		ผู้ควบคุมงาน

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดข้างต้น

๒. ลงนามในร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวปีระดา แกมไทย)

๒๘ ธ.ค. ๖๓

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

การดำเนินการรายงานขอจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง การจัดทำร่างประกาศประกวดราคาจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงินงบประมาณ ๒๘๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๕ (๑) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๕ โดยสำนักงานเลขานุการกรม ขอนำร่างประกาศประกวดราคาจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ (๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดข้างต้น

๒. ลงนามในร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวปีระดา แกมไทย)

๒๘ ธ.ค. ๖๓

(นางสาวรุ่งทิวา ไม้ไธสง)
ที่...ผู้ช่วยรมว.
๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๓

☑ อนุมัติ ตามข้อ ๑
☑ ลงนามแล้ว ตามข้อ ๒ และข้อ ๓

(ลงชื่อ).....

(.....(นายชยเดช กรัยนันยชีวงศ์).....)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๓

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขานุการกรม
๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๓

สำเนาคู่ฉบับ

คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ ๒๗๓๒ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

๑. นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ ประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒. นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ กรรมการ
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม

๓. นายวินัย ฉายากุล กรรมการ
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารชำนาญการพิเศษ กองวิศวกรรมการแพทย์

๔. นายไกรสูรย์ เจริญวงค์ กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน กองแบบแผน

๕. นายเกียรติศักดิ์ ชื่นจิตร์ กรรมการ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กองแบบแผน

อำนาจและหน้าที่

ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะภรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย

๑. นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ ประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒. นายถาวร ขาวแสง กรรมการ
ผู้อำนวยการกองแบบแผน

๓. นายสละ กสิวัตร์ กรรมการ
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารชำนาญการพิเศษ กองวิศวกรรมการแพทย์

/๔.นายอับดุล...

๔. นายอับดุลกอเดส อมรึก กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ กองแบบแผน
๕. นายสุทธิพร ปรีชา กรรมการ
สถาปนิกชำนาญการ กองแบบแผน
อำนาจและหน้าที่
ตรวจการจ้าง
ผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย
๑. นายสุพร ขุมทอง หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
นายช่างโยธาอาวุโส กองแบบแผน
๒. นายอโนทัย พิมพ์สุวรรณศรี ผู้ควบคุมงาน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กองแบบแผน
อำนาจและหน้าที่
ควบคุมงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธเรศ ภัทรนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ภาคผนวก ๖

การรายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

488

ห้องอธิบดี
เลขที่รับ 488
วันที่รับ ๒ ก.พ. ๒๕๖๔
วันที่ออก.....เวลา.....

ห้องรองอธิบดี (นพ.ภานุวัฒน์)
เลขที่รับ 706
วันที่รับ - 1 ก.พ. 2564
วันที่ออก.....เวลา.....

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒๐

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/ ๖๐๗ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ของงานจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสืองานพัสดุ กลุ่มคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งว่า คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ งานจ้างก่อสร้างอาคารบริการปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง ในวงเงินงบประมาณ ๒๘๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ได้รายงานผลการพิจารณาข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรของสาธารณชน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ดำเนินการประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ในระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ แล้ว เห็นว่าไม่ควรปรับปรุงตามวิจารณ์ เนื่องจากข้อสอบถามดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงการสอบถามในรายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบรูปรายการ จึงขออนุมัติดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างก่อสร้างดังกล่าว นั้น

สำนักงานเลขานุการกรม ขอเรียนว่า

๑. คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๗

๒. การขออนุมัติดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๑

๓. อำนาจในการทราบรายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ และการอนุมัติให้ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างฯ เป็นอำนาจของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือคณะกรรมการ-จัดทำแบบรูปรายการ ประกาศประกวดราคาจ้างฯ และหนังสือแจ้งบริษัทฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขานุการกรม

ชอบ
ลงนามแล้ว

(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- 1 ก.พ. 2564

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- 2 ก.พ. 2564

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ สำนักงานเลขานุการกรม โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒๐

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/ ๕๖๑ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้ากลุ่มคลัง)

ตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๒๒๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งผู้มีรายนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง และตามหนังสืองานพัสดุ กลุ่มคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๗๕๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยเห็นควรให้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อเพื่อให้สาธารณชนเสนอ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร นั้น

ในการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อให้สาธารชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ปรากฏว่า มีข้อวิจารณ์ และคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ได้เข้าร่วมประชุม เมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาในประเด็นข้อสอบถามของบริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ASC/อาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ/๐๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

หมวดงานทั่วไป

๑.๑ สิ่งที่ได้จากการทุบรื้อ เป็นของผู้รับเหมา ใช่หรือไม่

คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้ วัสดุที่มีมูลค่าให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดเก็บเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๒ การเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีต ในการส่งงวดงานจะต้องมีผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วย ถ้ามีผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตที่ ๗ วัน ออกมาแล้ว สามารถส่งงวดงานได้เลยใช่หรือไม่

- การเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีตของเสาเข็ม ๑ ต้น เก็บตัวอย่างไม่น้อยกว่า ๑ ชุด ชุดละ ๓ แท่ง เป็นอย่างน้อย ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่าง การทดสอบ ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยทดสอบให้ทำการทดสอบที่ ๗ วัน ๑๔ วัน และ ๒๘ วัน ในแต่ละชุดตัวอย่าง และต้องมีผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตของเสาเจาะครบทุกต้นในการส่งงานงวดที่มีเสาเข็มเจาะแล้วเสร็จ

- ผู้รับจ้างต้องส่งผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกริตส่วนที่เป็นเสาเข็มเจาะทั้งหมดก่อนการส่งงานในงวดที่มีเนื้องานเสาเข็มเจาะ

คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้ ส่งงานได้ ต้องมีผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการโดยมีตารางเปรียบเทียบกำลังอัดคอนกรีตตามมาตรฐาน

หมวดงานโครงสร้าง

๑.๓ เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry Process) จะต้องทำการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุก (Load Test) ของเสาเข็มเจาะ จำนวน ๑ ต้น ด้วยวิธี Static Load Test ด้วยใช่หรือไม่

คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้ เสาเข็มเจาะแห้ง Ø๐.๕๐ ม ทำการทดสอบเฉพาะความสมบูรณ์ของเสาเข็มทุกต้น ส่วนทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุก (Load Test) ทำเฉพาะเข็มเจาะเปียก Ø๐.๘๐ ม.

๑.๔ แบบโครงสร้าง ST-๕๐๐๘ แบบขยาย STB ระดับความลึกของคานต้องเท่ากับฐานราก F๕B และ F๓A ใช่หรือไม่

คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้ แบบโครงสร้าง ST-๕๐๐๘ แบบขยาย STB ระดับความลึกของคานเท่ากันกับฐานราก F๕B และ F๓A

/๑.๕ แบบโครงสร้าง...

๑.๕ แบบโครงสร้าง ST-๕๐๐๘ แบบขยาย STB บริเวณเหล็กเสริม ๒๘ DB ๒๘ มม. ด้านบนคาน คือ เสริมเหล็ก ๒ ชั้น ใช่หรือไม่? เนื่องจากในแบบเขียนมา ๒ บรรทัด แต่ในรูปขยายใส่เหล็กมา ๑ ชั้น

คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้ แบบโครงสร้าง ST-๕๐๐๘ แบบขยาย STB บริเวณเหล็กเสริม ๒๘ DB ๒๘ มม. ด้านบนคาน คือ เสริมเหล็ก ๒ ชั้น เหล็กปลอก ๓-RB๙ @ ๐.๑๒๕ ม.

๑.๖ แบบโครงสร้าง ST-๕๐๐๘ แบบขยาย STB ต้องมีเหล็กปลอกด้วย ใช่หรือไม่? ถ้ามีขอรายละเอียดเหล็กปลอก

- ความลึกของ STB ต้องลึกเท่ากับ F๕B กับ F๓A คือ ๒.๒๐ ม. ใช่หรือไม่

คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้ ใช่ ความลึกของ STB ต้องลึกเท่ากับ F๕B กับ F๓A คือ ๒.๒๐ ม.

- เหล็กเสริมนี้คือเสริมบริเวณตรงไหน


คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้ เหล็กเสริมบน ๒ ชั้น

- ต้องมีเหล็กปลอกด้วยใช่หรือไม่ ขอสเปคเหล็กปลอก

คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้ ต้องมีเหล็กปลอกด้วย สเปคเหล็กปลอก คือ ๓str - Ø ๙ มม. @ ๐.๑๒๕ ม.

๑.๗ ขอแบบขยายผนังถังเก็บน้ำใต้ดิน

คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้

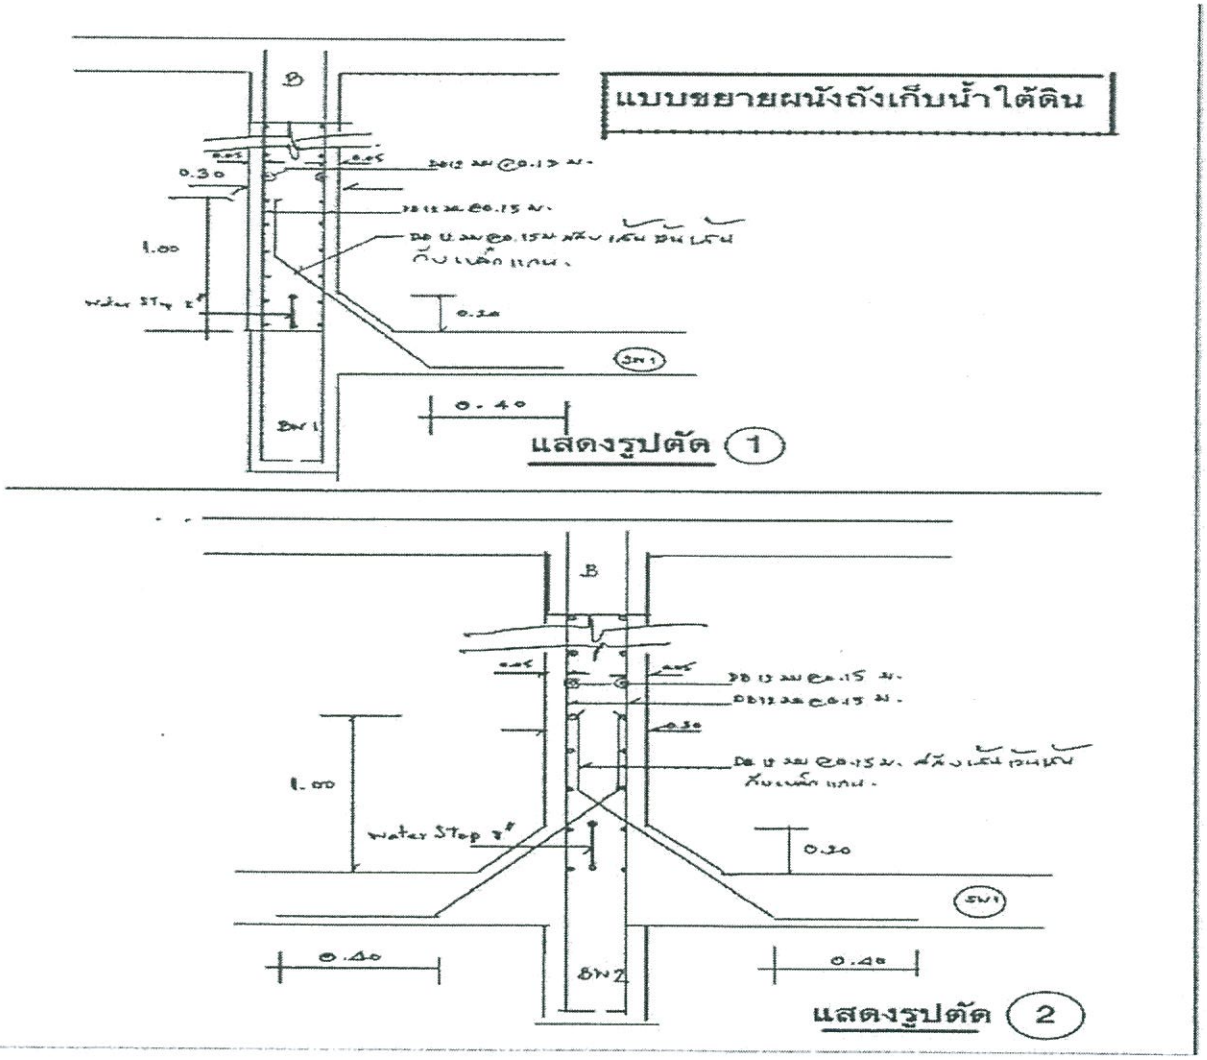

/๑.๘ ขอทราบ...


๑.๘ ขอทราบขนาดคาน BC๓

คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้ ขนาดคาน BC๓ เท่ากับ ๐.๒๐

๑.๙ ขอทราบแบบขยายคาน B๒๔, BBC, BC๑๗, BD

- แบบขยายคาน B๒๔

  คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้

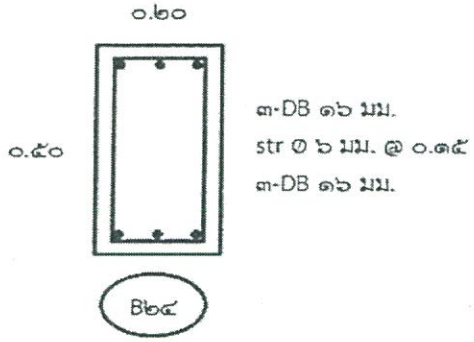

- แบบขยายคาน BBC

  คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้ แบบขยายคาน BBC ใช้ขยายเดียวกับ BCB

- แบบขยายคาน BC๑๗

  คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้ แบบขยายคาน BC๑๗ ใช้ขยายเดียวกับ B๑๗


- แบบขยายคาน BD

  คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้ แบบขยายคาน BD ใช้ขยายเดียวกับ BB

๑.๑๐ ขอแบบขยาย Gutter ระเบียงกันตก

คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้ ร่องระบายน้ำ Gutter ร่องน้ำกว้าง ๑๐ ซม. ลึกประมาณ ๑ นิ้ว รายละเอียดตามแบบ AR-๕๒๐๑

เอกสารแนบข้อ 10 ราวกันตก จอดรถ

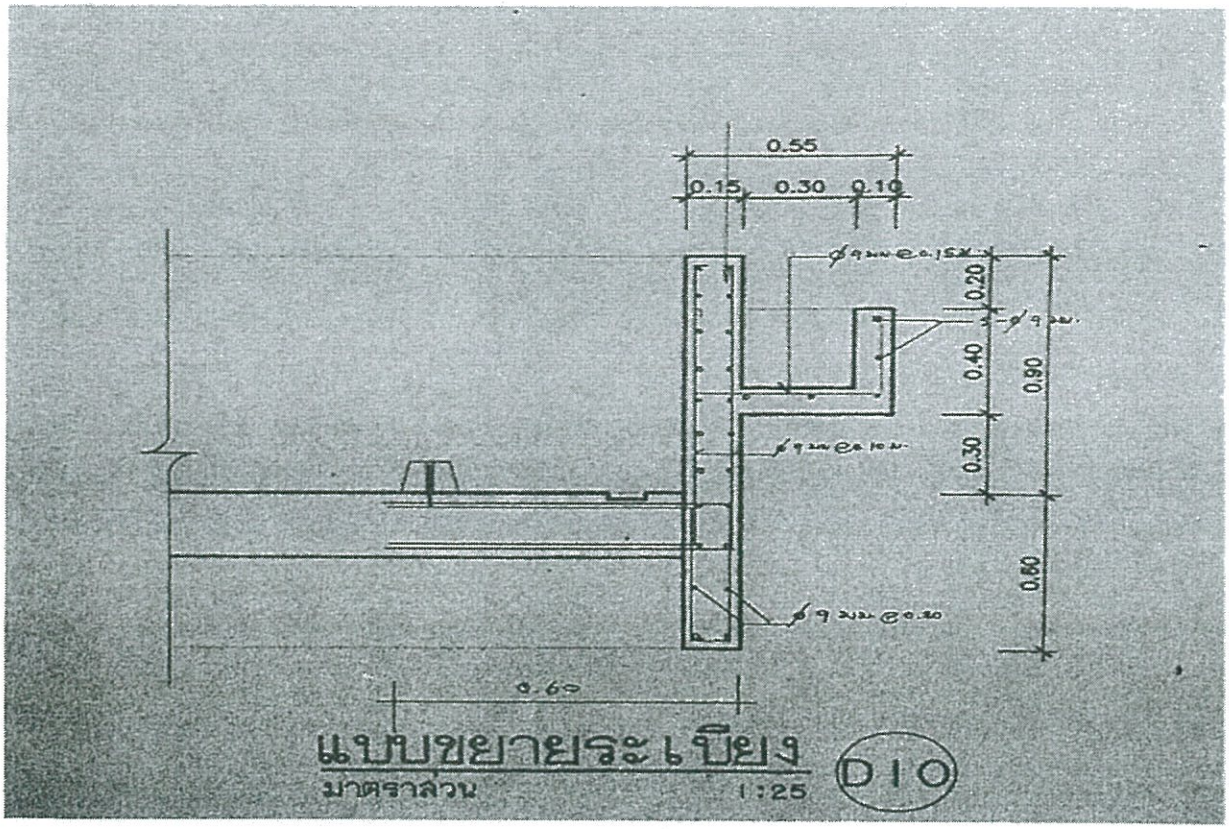

/หมวดงาน...

หมวดงานสถาปัตยกรรม

๑.๑๑ แบบ AR-๓๐๐๑ พื้นชั้น ๑ บริเวณ โถงทางเดินขอบเขตที่แบ่งพื้นที่แต่ละเบอร์ให้แบ่งอยู่ที่ตรงไหน

คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้ ขอบเขตที่แบ่งพื้นบริเวณโถงทางเดินที่ระบุพื้นเบอร์ ๑ อยู่ในแนวเสา ๖-๑๐

๑.๑๒ แบบ AR-๓๐๐๗ พื้นชั้น ๓ บริเวณห้องนี้เป็นพื้นเบอร์อะไร?

คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้ แบบ AR-๓๐๐๗ พื้นชั้น ๓ บริเวณห้องนี้เป็นพื้นเบอร์ ๑ เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากโถงด้านหน้าห้อง

๑.๑๓ แบบ AR-๓๐๐๗ พื้นชั้น ๓ ห้องเจ้าหน้าที่เป็นพื้นเบอร์อะไร?

คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้ แบบ AR-๓๐๐๗ พื้นชั้น ๓ ห้องเจ้าหน้าที่เป็นพื้น เบอร์ ๑๓

๑.๑๔ แบบ AR-๓๐๐๗ พื้นชั้น ๓ ห้อง ANT เป็นพื้นเบอร์อะไร

คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้ แบบ AR-๓๐๐๗ พื้นชั้น ๓ ห้อง ANT เป็นพื้นเบอร์ ๑๓

๑.๑๕ แบบ AR-๓๐๑๓ พื้นชั้น ๕ บริเวณ Drop Off เป็นพื้นเบอร์อะไร?

คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้ แบบ AR-๓๐๑๓ พื้นชั้น ๕ บริเวณ Drop Off เป็นพื้นเบอร์ ๑๑

๑.๑๖ แบบ AR-๓๐๑๓ พื้นชั้น ๕ โถงหน้าห้องปฏิบัติการไฟฟ้า เป็นพื้นเบอร์อะไร

คณะกรรมการฯมีมติให้แจ้งบริษัทฯ ดังนี้ แบบ AR-๓๐๑๓ พื้นชั้น ๕ โถงหน้าห้องปฏิบัติการไฟฟ้าเป็นพื้นเบอร์ ๑๓

๑.๑๗ แบบ AR-๓๐๒๒ พื้นชั้นดาดฟ้า ห้องไฟฟ้า เป็นพื้นเบอร์อะไร?

คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้ แบบ AR-๓๐๒๒ พื้นชั้นดาดฟ้า ห้องไฟฟ้าเป็นพื้นเบอร์ ๘

๑.๑๘ แบบ AR-๓๐๒๕ พื้นชั้นหลังคา ห้องเครื่องลิฟต์ เป็นพื้นเบอร์อะไร?


คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้ แบบ AR-๓๐๒๕ พื้นชั้นหลังคา ห้องเครื่องลิฟต์เป็นพื้นเบอร์ ๘ อีพ็อกซี่ (Epoxy)

๑.๑๙ แบบ AR-๓๐๒๕ พื้นชั้นหลังคา บริเวณที่วางโซล่าเซลล์ เป็นพื้นเบอร์อะไร?

คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้ แบบ AR-๓๐๒๕ พื้นชั้นหลังคา บริเวณที่วางโซล่าเซลล์เป็นพื้นเบอร์ ๑๔ เซรามิคโค๊ตติ้ง (Ceramic Coating)

๑.๒๐ ใน BOQ หมวดงานผนัง-ผิวผนัง ข้อ ๕.) ผนัง ค.ส.ล. ความหมายของการเสนอราคาคือให้คิดเป็นผนังอย่างไร? และผนังส่วนไหนของอาคาร

คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้

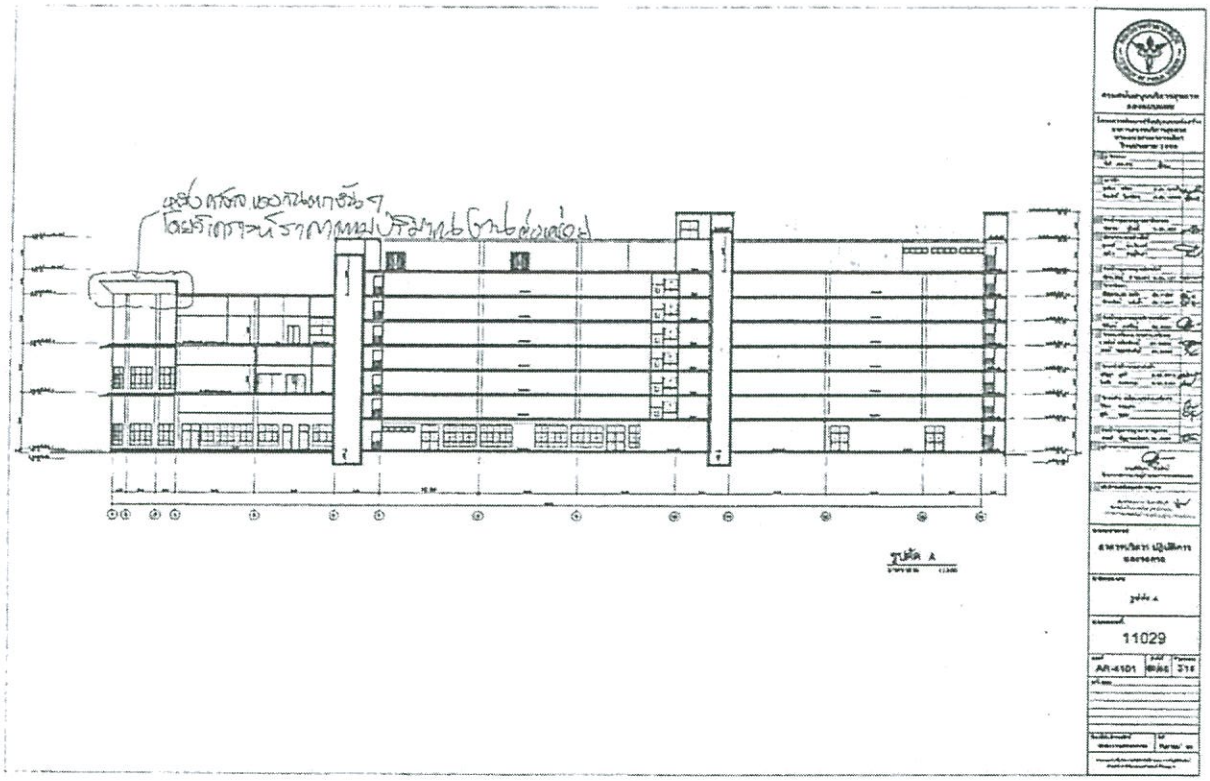

ฉบับที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ASC/อาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ/๐๒ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

หมวดงานโครงสร้าง

๑. ขอทราบแบบขยายคาน BC๘

คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้ แบบขยายคาน BC๘ ใช้ตัวเดียวกับ B๘

หมวดงานสถาปัตยกรรม

๒. แบบ AR-๓๑๑๓ ขอบเขตของฝ้า บริเวณจุดส่งของ อยู่ตรงไหน?

คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้ แบบ AR-๓๑๑๓ ขอบเขตของฝ้าเต็มพื้นที่จุดส่งของและเก็บของ

๓. แบบ AR-๓๐๐๑ โรงอาหาร ผิว Finishing เป็นอะไร?

คณะกรรมการฯมีมติแจ้งบริษัทฯ ดังนี้ แบบ AR-๓๐๐๑ โรงอาหาร ผิว Finishing เป็นผนังเบอร์ ๖

คณะกรรมการฯ ร่วมกับ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้อสอบถามดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงการสอบถามในรายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบรูปรายการ จึงเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงตามข้อวิจารณ์ ดังนั้น จึงเห็นควรดำเนินการจัดจ้างดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายอานุภาพ ละออ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายอับดุลกอเดส อมรึก)

/(ลงชื่อ)....

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสุทธิพร ปรีชา)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายนิรันดร์ เชียวชาญชัยกุล)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวปีระดา แกมไทย)

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และโปรดลงนามในหนังสือแจ้งบริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวปีระดา แกมไทย)
๒๙ ม.ค. ๖๔

(นางสาวรุ่งทิวา อินโยธา)
หัวหน้ากลุ่มคลัง
๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔

☑ ลงนามตามที่เสนอ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขานุการกรม
๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....
(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- 2 ก.พ. 2564

ภาคผนวก ๗

รายงานผลการพิจารณาการสอบถามข้อมูลประกาศเชิญชวน

ห้องอธิบดี
เลขที่รับ 825
วันที่รับ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔
วันที่ออก.....เวลา.....

ห้องรองอธิบดี (นพ.ภานุวัฒน์)
เลขที่รับ 1234
วันที่รับ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔
วันที่ออก 25 ก.พ. 2564

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๔๓๑

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/ ๑๐๕๕ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการสอบถามข้อมูลประกาศเชิญชวน

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ สำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๙๘๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แจ้งว่า คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ งานจ้างก่อสร้างอาคารบริการปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๒๘๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ได้ชี้แจงการสอบถามข้อมูลของผู้ประกอบการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

สำนักงานเลขานุการกรม ขอเรียนว่า

๑. คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๕๒

๒. อำนาจในการทราบรายงานผลการพิจารณาการสอบถามข้อมูลและการลงนามในหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ เป็นอำนาจของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือคณะกรรมการ-จัดทำแบบรูปรายการ และในหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ฉบับ ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

ทราบ
ลงนามแล้ว

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขานุการกรม

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1 มี.ค. 2564

(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
25 ก.พ. 2564

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ สำนักงานเลขานุการกรม โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒๐

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/ ๙๙ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการสอบถามข้อมูลประกาศเชิญชวน

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้ากลุ่มคลัง)

ตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๒๒๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งผู้มีรายนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการและจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง และตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โดยกำหนดวันสิ้นสุดของการสอบถามข้อมูล ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ ผู้ประกอบการได้มีข้อสอบถามข้อมูลมายังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๕ ฉบับ และคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ ได้เข้าร่วมประชุม เมื่อจันทร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาการสอบถามข้อมูลของผู้ประกอบการ จำนวน ๕ ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ ๑ ตามหนังสือบริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด ที่ ASC/อาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ/๐๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๘ ข้อ


หมวดงานโครงสร้าง

๑. ขอทราบรายละเอียดการเสริมเหล็กในพื้น POST TENSION เบอร์ bD ที่ใส่ใน PB๒ พื้นชั้นดาดฟ้า (แบบ ST-๓๐๔๔)

คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ รายละเอียดการเสริมเหล็กในพื้น POST TENSION เบอร์ bD ที่ใส่ใน PB๒ พื้นชั้นดาดฟ้า (แบบ ST-๓๐๔๔) คือ ๑๗ DB ๑๖ มม. ยาว ๕.๐๐ ม.

๒. ขอทราบแบบขยายเสา CL (แบบ ST-๓๐๕๐)

คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้




4-DB 25 มม.
str- Ø 6 มม. @ 0.15 ม.
CL = 0.25 x 0.25 ม.

/๓. ขอทราบ...


๓. ขอทราบแบบขยายพื้น S๑๖ และพื้น SL

- แบบขยายพื้น S๑๖

คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้

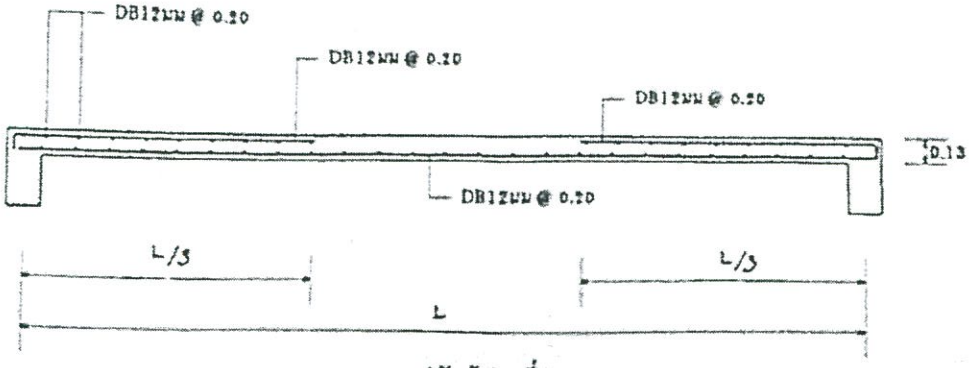

S16 รูปตัดด้านหนึ่ง

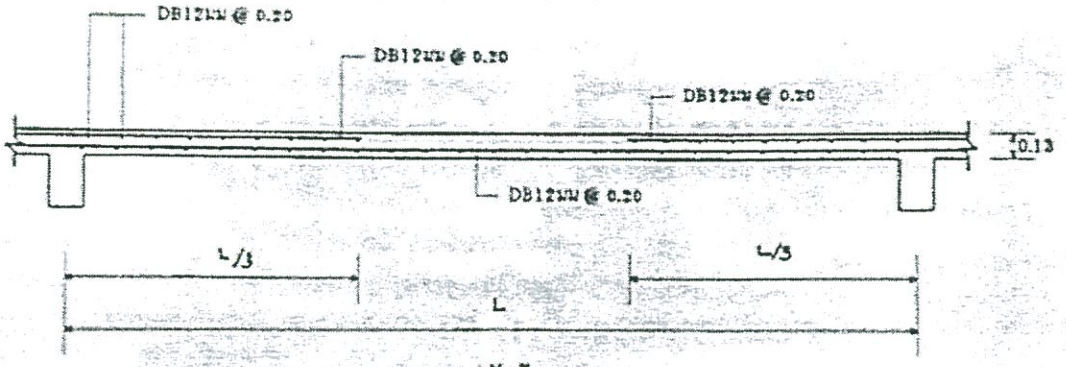

S16 รูปตัดด้านสอง

- แบบขยายพื้น SL

คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ แบบขยายพื้น SL ให้ดูขยาย (S)

หมวดงานสถาปัตยกรรม

๔. แบบ AR-๕๐๐๕ หลังคาในแบบระบุเป็น Metal Sheet แต่ใน BOQ ระบุเป็น Aluminium Sheet ขอให้ยืนยันว่าใช้วัสดุแบบไหน?

คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ แบบ AR-๕๐๐๕ หลังคาในแบบใช้วัสดุเป็น Aluminium Sheet

๕. แบบ AR – ๕๐๐๗ บริเวณผนังกับหลังคา ใช้เป็นวัสดุเดียวกันใช่หรือไม่? เป็น Metal Sheet หรือ Aluminium Sheet? เนื่องจากในแบบกับใน BOQ ระบุขัดแย้งกัน

คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ แบบ AR-๕๐๐๗ บริเวณผนังกับหลังคา ใช้วัสดุเป็น Aluminium Sheet

/๖. บัว PVC...

๖. บัว PVC ขนาด ๖" ในแบบอยู่บริเวณตรงไหน?

คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ บริเวณพื้น [1]

๗. บัวกระเบื้องแกรนิตโต้ ใส่ทุกห้องที่มีปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ใช่หรือไม่?

คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ ใส่ทุกห้องที่ระบุพื้น [2]

๘. แผงกันแดด Biowood ชั้น ๒ - ดาดฟ้า ในแบบไม่มีตำแหน่งตั้งแต่ใน BOQ ระบุจำนวนมาขอตำแหน่งติดตั้งแผงกันแดด Biowood ชั้น ๒ - ดาดฟ้า

- ขนาด ๒๖.๓๐ x ๔.๕๐ ม. (D๘)

คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ แผงกันแดด Biowood ตำแหน่งติดตั้งบริเวณชั้น ๓ ระบุในแปลนแผ่นที่ AR๓๐๐๗ โดยให้ดูแบบขยาย D๘ ในแบบแผ่นที่ AR๕๒๐๓

- ขนาด ๑๖.๕๐ x ๒.๗๐ ม. (ชั้น ๒-๗)

คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ รายการนี้ไม่อยู่ในแบบไม่ต้องเสนอราคาส่วนนี้

- ขนาด ๑๖.๕๐ x ๓.๖๐ ม. (ชั้นดาดฟ้า)

คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ รายการนี้ไม่อยู่ในแบบไม่ต้องเสนอราคาส่วนนี้

<u>ฉบับที่ ๒</u> ตามหนังสือบริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด ที่ ASC/อาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ/๐๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๖ ข้อ ดังนี้

หมวดงานทั่วไป

๑. เศษเหล็กงานโครงสร้าง เศษเหล็กรูปพรรณงานโครงหลังคาจอดรถ เศษคอนกรีต และเศษเหล็กเส้นที่อยู่ในคอนกรีต จากการรื้อถอน ให้ทางผู้รับเหมานำออกไปกำจัดได้เลยใช่หรือไม่?

คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ วัสดุที่มีมูลค่าให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดเก็บเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

หมวดงานโครงสร้าง

๒. แบบ ST-๕๕๐๑ ขอทราบรายละเอียดการใส่เหล็กพื้นห้องเครื่องลิฟต์ (ปล่องลิฟต์)

คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ รายละเอียดการใส่เหล็กพื้นห้องเครื่องลิฟต์ (ปล่องลิฟต์) ให้ดูขยายแผ่นที่ ST-๕๓๐๓ สัญลักษณ์ Ⓢ

๓. แบบ ST-๕๕๐๑ ขอทราบขนาดคานรัดรอบทุกระดับชั้น (ปล่องลิฟต์)

คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ ขนาดคานรัดรอบทุกระดับชั้น (ปล่องลิฟต์) คือ ๐.๒๕ x ๐.๖๐ ม.

๔. แบบ ST-๓๐๐๑ ฐานราก F๗, F๕B, F๓A ใช้เสาเบอร์อะไร?

- ฐานราก F๗

คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ ฐานราก F๗ ใช้เสาเบอร์ C๔

- ฐานราก F๕B

คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ ฐานราก F๕B ใช้เสาเบอร์ C๒

- ฐานราก F๓A

คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ ฐานราก F๓A ใช้เสาเบอร์ C๓

หมวดงานสถาปัตยกรรม

๕. งานหลังคา ต้องใส่ฉนวนใยแก้วพร้อมลวดตะแกรงด้วยใช่หรือไม่?

คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ ใช่ งานหลังคาต้องใส่ฉนวนใยแก้วพร้อมลวดตะแกรงด้วย

๖. ขอสเปคหลังคา Aluminium Sheet ของทางเชื่อม

คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้

	หลังคาทางเชื่อม
1	ROOF Spec Aluminium Sheet (Super) / เคลือบสี (PVDF) / Thk.0.9 mm.
2	Flashing Aluminium Sheet / เคลือบสี (PVDF) / Thk.0.9 mm.
3	ฉนวนใยแก้วกันความร้อน รุ่น SPG HEAT GUARD ชนิดหนา 50 มม.
	ความหนาแน่น 32 kg/m³ (ขนาด 1.15 x 15.00 ม.)
	วัสดุปิดหัว : อลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน มีผ้าใยสังเคราะห์สีดำ 1 ด้าน
4	ลวดตะแกรงเบอร์ 14 เคลือบ PVC สีขาว ขนาด 50x100 มม.(ขนาด 1.00x30 ม.)

ฉบับที่ ๓ ตามหนังสือบริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด ที่ ASC/อาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ/๐๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ข้อ ดังนี้

หมวดงานโครงสร้าง

๑. แบบ ST-๕๔๐๑ ขอทราบรายละเอียดการใส่เหล็กคาน BB, BL บริเวณชานพักบันได

คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ รายละเอียดการใส่เหล็กคาน BB, BL บริเวณชานพักบันได ดูตามขยายคาน BS๒

๒. แบบ ST-๖๐๐๑ บริเวณนี้เป็นฐานรากอะไร? ขอรายละเอียดแบบขยายเพิ่ม

คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ เป็นเสาของอาคารเดิมที่มีอยู่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไม่อยู่ในรายการสิ่งก่อสร้าง

ฉบับที่ ๔ ตามหนังสือบริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ปก.๐๑/๐๒๖๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขอเอกสารเพิ่มเติมตามรายการ ดังนี้

๑. ก.๑๔๗ - ๑๔๘/ก.ย./๕๓ งานสถาปัตยกรรม
๒. ก.๑๓๙ - ๑๕๔/ก.ย./๕๓ งานสิ่งแวดล้อม
๓. ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓ งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
๔. ก.๑๔๐-๑๔๑/ก.ย./๕๓ งานวิศวกรรมโครงสร้าง
๕. ก.๑๔๙ - ๑๕๓/ก.ย./๕๓ งานวิศวกรรมเครื่องกล
๖. ก.๓๙/เม.ย./๕๓ มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก
๗. ก.๑๑๓/ธ.ค./๕๘ รายละเอียดการเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหว
๘. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๓

๙. ก.๘๘/มิ.ย./๖๑ ข้อกำหนดในการเจาะสำรวจดิน

๑๐. ก.๗๗/มิ.ย./๖๑ รายการประกอบแบบการแก้ไขหลอดไฟฟ้า

คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.hss.moph.go.th ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง หัวข้อเอกสารเพิ่มเติม งานจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

<u>ฉบับที่ ๕</u> จากบริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แจ้งว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมยื่นเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของงานตกแต่งภายในอาคาร นั้น มีแบบก่อสร้างตาม TOR แต่ไม่มีราคาปรากฏใน BOQ ราคากลาง อยากทราบว่า งานตกแต่งภายในอาคารรวมในการเสนอราคาหรือไม่

คณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ รายการนี้ อยู่ในรายการ ๒.๑ งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำแล้ว

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวไปยังผู้ประกอบการ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายอานุภาพ ละออ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายอับดุลกอเดส อมรึก)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสุทธิพร ปรีชา)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายนิรันดร์ เชี่ยวชาญชัยกุล)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวบีระดา แกมไทย)

ความเห็น...

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือแจ้งผู้ประกอบการจำนวน ๓ ฉบับ ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวปิระดา แกมไทย)
๒๕ ก.พ ๖๔

(นางสาวรุ่งทิวา อินโยธา)
หัวหน้ากลุ่มคลัง
๒๕ ก.พ ๖๔

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขานุการกรม
๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔

☑ ลงนามตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....
(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1 มี.ค. 2564

ภาคผนวก ๘

การรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง

สำเนาคู่ฉบับ
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒๐

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๒๓๔ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๒๘๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างฯดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพควรสั่งจ้างจากบริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในประกาศและในเอกสารประกวดราคาจ้างฯทุกประการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเรียนว่า คณะกรรมการฯได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ และอำนาจในการสั่งจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบ-กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๔ (๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) จากบริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในหนังสือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ได้รับเรื่องแล้ว
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔

๒๕ มี.ค. ๖๔
ร่าง
พิมพ์
ทาน
๒๕ มี.ค ๖๔

สำเนาคู่ฉบับ
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๔๕

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/ ๑๕๗๔ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผ่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

ตามหนังสืองานพัสดุ กลุ่มคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๗๕๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้อนุมัติให้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวนชั้น ๗ ชั้น พื้นที่อาคาร ๒๐,๖๑๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงินงบประมาณ ๒๘๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) และตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๒๗๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งผู้มีรายนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อดำเนินการตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้กำหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. นั้น

คณะกรรมการฯได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖ ชั้น ๙ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. รายการพัสดุที่จะจ้าง

จ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๒๘๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) และราคากลาง เป็นเงิน ๒๙๒,๘๙๕,๖๗๒ บาท (สองร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

๒. รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

- มีผู้สนใจขอรับเอกสารโดยการดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔๘ ราย
- มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๖ ราย ดังนี้
  (๑) บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง จำกัด
  (๒) บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  (๓) บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
  (๔) บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด
  (๕) บริษัท กิจการร่วมค้างามวงศ์วาน จำกัด
  (๖) บริษัท ทวีศักดิ์ก่อสร้าง จำกัด

/๓. รายชื่อ..

๓. รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบผู้ยื่นข้อเสนอว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔ ปรากฏผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๖ ราย ไม่ปรากฏว่าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จึงพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอผ่านการคัดเลือกฯ ทั้ง ๖ ราย ดังนี้

(๑) บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง จำกัด
(๒) บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(๓) บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
(๔) บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด
(๕) บริษัท กิจการร่วมค้างามวงศ์วาน จำกัด
(๖) บริษัท ทวีศักดิ์ก่อสร้าง จำกัด

๔. การตรวจสอบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้ง ๖ ราย ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง จำกัด

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและเอกสารการยื่นข้อเสนอทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า บริษัทฯ ยื่นเอกสารหลักฐานการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ทุกประการ โดยบริษัทฯ ได้นำหลักประกันการเสนอราคาเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย เลขที่ ๔๐๑๐๐๑-๔๑๕๐๗๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๔,๐๗๕,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งทางบริษัทฯ ต้องนำต้นฉบับมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ข้อ ๕ (๕.๓) ประกอบกับ ข้อ ๕ (๕.๔) วรรคสอง เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาในครั้งนี้ เมื่อถึงกำหนดเวลา บริษัทฯ ได้นำต้นฉบับพันธบัตรรัฐบาลไทยมามอบให้กับกรมเพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบ

๔.๒ บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและเอกสารการยื่นข้อเสนอทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า บริษัทฯ ยื่นเอกสารหลักฐานการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ทุกประการ โดยบริษัทฯ ได้นำหลักประกันการเสนอราคาเป็นหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๔๘๑๘๒๑๐๐๐๑๐๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๔,๐๗๕,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ข้อ ๕ (๕.๒) เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาในครั้งนี้ และบริษัทฯ ไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบ

๔.๓ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและเอกสารการยื่นข้อเสนอทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า บริษัทฯ ยื่นเอกสารหลักฐานการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ทุกประการ โดยบริษัทฯ ได้นำหลักประกันการเสนอราคาเป็นหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๐๐๑๕/๒๐๐๑๔๗/๐๐๑๔/๖๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๔,๐๗๕,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ข้อ ๕ (๕.๒) เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาในครั้งนี้ และบริษัทฯไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบ

/๔.๔ บริษัท อดิศร...

๔.๔ บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและเอกสารการยื่นข้อเสนอทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า บริษัทฯ ยื่นเอกสารหลักฐานการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ทุกประการ โดยบริษัทฯ ได้นำหลักประกันการเสนอราคาเป็นหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๐๐๑๕/๒๐๐๑๓๗/๐๐๑๓/๖๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๔,๐๗๕,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ข้อ ๕ (๕.๒) เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาในครั้งนี้ และบริษัทฯไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบ

๔.๕ บริษัท กิจการร่วมค้างามวงศ์วาน จำกัด

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและเอกสารการยื่นข้อเสนอทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า บริษัทฯ ยื่นเอกสารหลักฐานการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ทุกประการ โดยบริษัทฯ ได้นำหลักประกันการเสนอราคาเป็นหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๐๐๑๕/๑๐๘๓๔๒/๐๐๓๘/๖๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๔,๐๗๕,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ข้อ ๕ (๕.๒) เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาในครั้งนี้ และบริษัทฯไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบ

๔.๖ บริษัท ทวีศักดิ์ก่อสร้าง จำกัด

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและเอกสารการยื่นข้อเสนอทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า บริษัทฯ ยื่นเอกสารหลักฐานการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ทุกประการ โดยบริษัทฯ ได้นำหลักประกันการเสนอราคาเป็นเช็คของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ เลขที่ ๑๗๙๔๒๕๐๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๔,๐๗๕,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งทางษริษัทฯ ต้องนำต้นฉบับเช็คมามอบให้กับกรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ข้อ ๕ (๕.๓) ประกอบกับ ข้อ ๕ (๕.๔) วรรคสอง เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาในครั้งนี้ และบริษัทฯไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เมื่อถึงกำหนดเวลา บริษัทฯ ไม่ได้นำส่งต้นฉบับเช็คดังกล่าวมามอบให้กับกรมเพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

คณะกรรมการฯ มีมติให้ผู้ยื่นข้อเสนอผ่านการตรวจสอบบัญชีส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ จำนวน ๕ ราย ดังนี้

(๑) บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง จำกัด
(๒) บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(๓) บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
(๔) บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด
(๕) บริษัท กิจการร่วมค้างามวงศ์วาน จำกัด

และมีมติให้ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ผ่านการตรวจสอบบัญชีส่วนที่ ๒ (หลักประกันการเสนอราคา) จำนวน ๑ ราย คือ บริษัท ทวีศักดิ์ก่อสร้าง จำกัด เนื่องจากไม่นำส่งต้นฉบับเช็คของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ เลขที่ ๑๗๙๔๒๕๐๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๔,๐๗๕,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาในครั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ข้อ ๕ (๕.๓) ประกอบกับ ข้อ ๕ (๕.๔) วรรคสอง

/๕. ตรวจสอบ...

๕. ตรวจสอบการใบเสนอราคา

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบใบเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้ง ๖ ราย ปรากฏรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ต่ำกว่าราคากลาง (%) (ราคากลาง ๒๙๒,๘๙๕,๖๗๒ บ.	ระยะเวลายืนราคา	ระยะเวลาก่อสร้าง
๑.	บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐	๑๗.๒๕	๑๘๐ วัน	๑,๐๘๐ วัน
๒.	บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด	๒๕๒,๘๙๕,๐๐๐	๑๕.๘๒	๑๘๐ วัน	๑,๐๘๐ วัน
๓.	บริษัท กิจการร่วมค้างามวงศ์วาน จำกัด	๒๕๗,๐๐๐,๐๐๐	๑๓.๙๗	๑๘๐ วัน	๑,๐๘๐ วัน
๔	บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	๒๕๗,๕๙๐,๐๐๐	๑๓.๗๑	๑๘๐ วัน	๑,๐๘๐ วัน
๕	บริษัท ทวีศักดิ์ก่อสร้าง จำกัด	๒๖๙,๘๖๘,๐๐๐	๘.๕๓	๑๘๐ วัน	๑,๐๘๐ วัน
๖.	บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง จำกัด	๒๗๘,๘๐๐,๐๐๐	๕.๐๖	๑๘๐ วัน	๑,๐๘๐ วัน

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

คณะกรรมการฯ มีมติให้ผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๕ ราย ผ่านการตรวจสอบการเสนอราคา โดยเรียงตามลำดับจากรายที่เสนอราคาต่ำสุด ดังนี้

๑. บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงแล้ว

๒. บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๒,๘๙๕,๐๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงแล้ว

๓. บริษัท กิจการร่วมค้างามวงศ์วาน จำกัด เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงแล้ว

๔. บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๗,๕๙๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงแล้ว

๕. บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๒๗๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงแล้ว

และคณะกรรมการฯ มีมติให้บริษัท ทวีศักดิ์ก่อสร้าง จำกัด ไม่ผ่านการตรวจสอบการเสนอราคาในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตั้งแต่ต้น โดยไม่นำส่งต้นฉบับเช็คของธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ เลขที่ ๑๗๙๔๒๕๐๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๔,๐๗๕,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จึงไม่ต้องพิจารณาในส่วนของการเสนอราคาของบริษัทฯ เนื่องจากขาดคุณสมบัติตั้งแต่แรก

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมหลักเกณฑ์การให้คะแนน

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โดยใช้เกณฑ์ราคาพิจารณาและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะพิจารณาจากราคารวม ตามเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ข้อ ๖

/๖. หลักเกณฑ์...

๗. ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา

คณะกรรมการฯได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอและการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้ง ๖ ราย เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๕ ราย ผ่านการพิจารณาเนื่องจากมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ทุกประการ และมีผู้ยื่นข้อเสนอไม่ผ่านการพิจารณา จำนวน ๑ ราย คือ บริษัท ทวีศักดิ์ก่อสร้าง จำกัด เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้นำส่งต้นฉบับเช็คดังกล่าวมามอบให้กับกรมในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาในครั้งนี้ ตามประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นควรจ้างก่อสร้างอาคารบริการปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวนชั้น ๗ ชั้น พื้นที่อาคาร ๒๐,๖๑๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ แห่ง กับบริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นเงิน ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งราคาต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๓๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) (วงเงินงบประมาณ ๒๘๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ลบด้วยราคาที่เสนอ ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๑.๒๖ (๑๑.๒๖%) และราคาต่ำกว่าราคากลาง ๔๓,๐๙๕,๖๗๒ บาท (สี่สิบสามล้านเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ราคากลาง ๒๙๒,๘๙๕,๖๗๒ บาท ลบด้วยราคาที่เสนอ ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท) เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดและคณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

๘. การตรวจสอบใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง (BOQ)

คณะกรรมการฯ จะพิจารณาและตรวจสอบใบแจ้งปริมาณและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง (BOQ) อีกครั้ง หลังจากที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งจ้างก่อสร้างอาคารบริการปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง เป็นเงิน ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) กับบริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตามเสนอดังกล่าวข้างต้น ต่อไปด้วย

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายวินัย ฉายากุล)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายไกรสูรย์ เจริญวงค์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ ชื่นจิตร์)

/เรียน...

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผ่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ จึงเห็นควรจัดจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวนชั้น ๗ ชั้น พื้นที่อาคาร ๒๐,๖๑๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ แห่ง เป็นเงิน ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) กับบริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอรดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังกล่าว เป็นเงิน ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) กับบริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวปิระดา แกมไทย)
๒๕ มี.ค. ๖๔

(นางสาวสุนทรี มีมุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
แทนหัวหน้ากลุ่มคลัง
๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขานุการกรม
๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔

☑ เห็นชอบ เห็นชอบ
☑ อนุมัติ อนุมัติ

(ลงชื่อ) .....
(นายธงชัย กีรติหัตถยากร)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
29 มี.ค. 2564

๒๕ มี.ค. ๖๔
ร่าง
พิมพ์
ตรวจ

ภาคผนวก ๙

การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

สำเนาคู่ฉบับ
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒๐

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/ ๑๖๙๖ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ดำเนินการจัดจ้างตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

สำนักงานเลขานุการกรม ขอเรียนว่า การจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง ผู้เสนอราคาที่ชนะการการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๑๕๗๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งอนุมัติให้คืนหลักประกันการเสนอราคาให้กับบริษัทเวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง จำกัด ด้วย เพื่อสำนักงานเลขานุการกรมจะได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๐ (๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และอนุมัติให้คืนหลักประกันการเสนอราคาของบริษัททั้ง ๒ บริษัท ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขานุการกรม

๗/๔/๖๔

ร่าง

พิมพ์

สำเนาคู่ฉบับ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

งานก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑๖ / มี.ค. / ๖๔

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ สช ๐๗๐๑.๖.๕/๒๙๖ วันที่ - ๗ เม.ย. ๒๕๖๕	ชื่อหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่อยู่ ๘๘/๔๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง จำกัด

ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารบริการปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว มีมติให้

☐ เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก

- ○ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
- ○ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

☑ ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก

- ◉ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
- ○ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
- ○ ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้
  - ☐ ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน
  - ☐ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
  - ☐ ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ

☐ ยกเลิกรายการพิจารณา

การอุทธรณ์

หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ ๒) ต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรุงเทพฯ ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่

ขอแสดงความนับถือ

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์)

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โทรศัพท์-

โทรสาร -

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๒๖๑ วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๔	ชื่อหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่อยู่ ๘๘/๔๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน บริษัท ทวีศักดิ์ก่อสร้าง จำกัด

ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำกิจการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารบริการปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว มีมติให้

☐ เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก

- ○ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
- ○ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

☑ ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก

- ○ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
- ○ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
- ◉ ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้
  - ☑ ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน
  - ☐ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
  - ☐ ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ

☐ ยกเลิกรายการพิจารณา

ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ ดังนี้

แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม บริษัท ทวีศักดิ์ก่อสร้าง.pdf

การอุทธรณ์

หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ ๒) ต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรุงเทพฯ ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่

ขอแสดงความนับถือ

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์)

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โทรศัพท์-

โทรสาร -

แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา

เลขที่โครงการ : ๖๓๑๐๗๓๐๕๙๑๕

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๕๒๕๕๖๓๐๐๐๗๕๙ ชื่อผู้เสนอราคา บริษัท ทวีศักดิ์ก่อสร้าง จำกัด

รายการพิจารณา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑. บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ เหตุผล : เนื่องจากไม่นำส่งต้นฉบับเช็คของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ เลขที่ ๑๗๙๔๒๕๐๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๔,๐๗๕,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาในครั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ เลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ข้อ ๕ (๕.๓) ประกอบกับ ข้อ ๕ (๕.๔) วรรคสอง

ภาคผนวก ๑๐

การร่างสัญญาส่งให้กองกฎหมายตรวจสอบ

สำเนาคู่ฉบับ
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒๐

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/ ๒๑๑๗ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบร่างสัญญา

เรียน ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุมัติให้จ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวนชั้น ๗ ชั้น จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากบริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๑๕๗๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขานุการกรม ขอความอนุเคราะห์กองกฎหมายพิจารณาตรวจสอบร่างสัญญาฯ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขานุการกรม

ได้รับเรื่องแล้ว

๑๙ พ.ค. ๖๔

ร่าง
พิมพ์

กลุ่มงานพัสดุ
รับที่ 5978
๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔
เวลา 9.01 น.

สำนักงานเลขานุการกรม
เลขรับที่ 4581
วันที่รับ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๔
เวลารับ 16.06

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๘๓๑

ที่ สธ ๐๗๐๒.๐๕.๒/ ๑๖๗๒ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบร่างสัญญา

กลุ่มงานพัสดุ
เลขที่รับ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔
วันที่รับ
เวลาที่รับ 10:09 น.

เลขานุการกรม
เลขรับที่ 2822
วันที่รับ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๔
เวลารับ

เรียน เลขานุการกรม

ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม มีหนังสือ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๒๑๑๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขอให้กองกฎหมายพิจารณาตรวจสอบร่างสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๗ ชั้น จำนวน ๑ แห่ง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กองกฎหมาย ได้ตรวจสอบร่างสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ร่างสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

๑. หน้า ๑ บรรทัดที่ ๔ ควรระบุวันที่ให้ชัดเจน
๒. หน้า ๑ บรรทัดที่ ๙ ตัดคำว่า "ที่" ออก ✓
๓. หน้า ๑ บรรทัดที่ ๑๖ ตัดคำว่า "ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี" ออก ✓
๔. หน้า ๒ บรรทัดที่ ๑๕ แก้คำว่า "แบแยกส่วน" เป็น "แบบแยกส่วน" ✓
๕. หน้า ๒ บรรทัดที่ ๒๙ ควรระบุรายละเอียดหนังสือค้ำประกันของธนาคารให้ชัดเจน
๖. หน้า ๒ บรรทัดที่ ๓๓ ย่อหน้าตรงคำว่า "กรณีผู้รับจ้าง" ✓
๗. หน้า ๘ บรรทัดที่ ๒ ตัดคำว่า "๗๒.๑" หลังคำว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพออก ✓
๘. หน้า ๑๑ บรรทัดที่ ๑๗ เพิ่มคำว่า "ที่หัก" หลังคำว่า "จำนวนเงิน"
๙. หน้า ๑๒ บรรทัดที่ ๒ ถึงบรรทัดที่ ๓ ควรระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการทำงานให้ชัดเจน
๑๐. หน้า ๑๒ บรรทัดที่ ๓๑ แก้คำว่า "ร้อยละ ๐.๑ (จุดหนึ่งศูนย์)" เป็น "ร้อยละ ๑๐"
๑๑. หน้า ๑๔ บรรทัดที่ ๓๔ แก้จำนวนเงินจาก "๓๔๐.๐๐ บาท (สามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)" เป็น "๓๕๐.๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)" และเพิ่มคำว่า "และ" หน้าคำว่า "ผู้ควบคุมงาน"
๑๒. หน้า ๑๖ บรรทัดที่ ๑๕ แก้คำว่า lading เป็น Lading
๑๓. หน้า ๑๖ บรรทัดที่ ๒๖ แก้คำว่า "และ" เป็น "หรือ"
๑๔. หน้า ๑๖ บรรทัดที่ ๒๗ แก้คำว่า "ร้อยละ ๑ (หนึ่ง)" เป็น "ร้อยละ ๑๐ (สิบ)"

อนึ่ง กองกฎหมาย เห็นว่า ในส่วนรูปแบบของการย่อหน้าและการเว้นวรรคของ (ร่าง) สัญญาฉบับนี้ จะต้องดำเนินการแก้ไขการย่อหน้า เว้นวรรคการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการแก้ไขรายละเอียดในร่างสัญญาฯ ตามที่กล่าวมาข้างต้นต่อไป จะเป็นพระคุณ

มอบ ○ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
✓ กลุ่มคลัง
○ กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรียน หัวหน้างานพัสดุ
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวรุ่งทิวา อินโยธา)
หัวหน้ากลุ่มคลัง

(นางจันทนา จินดาถาวรกิจ)
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขานุการกรม

ภาคผนวก ๑๑

การแจ้งผู้ชนะการเสนอราคามาจัดทำ

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

และใบบัญชีรายการงานก่อสร้าง (BOQ)

ห้องอธิบดี
เลขที่รับ 3747
วันที่รับ - ๗ พ.ค. ๒๕๖๔
วันที่ออก.....เวลา.....

ห้องรองอธิบดี (นพ.ภานุวัฒน์)
เลขที่รับ 2398
วันที่รับ - ๗ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา
วันที่ออก - ๗ พ.ค. ๒๕๖๔

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒๐

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/ ๒๐๖๗ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง (BOQ)

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรมดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักงานเลขานุการกรมได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดังกล่าว ได้แก่ บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๕๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ข้อ ๓ ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ตรงกับแบบรูปและรายการละเอียด โดยให้หน่วยงานของรัฐเจรจาเพื่อปรับลดราคาทุกรายการตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง นั้น

สำนักงานเลขานุการกรม ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอำนาจในการลงนามในหนังสือแจ้งบริษัทฯ เป็นอำนาจของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือถึงบริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

สุนทรี มีมุข

(นางสาวสุนทรี มีมุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนเลขานุการกรม

ชอบ
ลงนามแล้ว

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
11 พ.ค. 2564

(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- 7 พ.ค. 2564

สำเนาคู่ฉบับ

ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/ ๖๙๙

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งการจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง (BOQ)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

อ้างถึง ๑. ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๔๐๓๑๖๐๐๐๙๗๔๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารบริการปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้คัดเลือกให้ทางบริษัทฯเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในงานจ้างดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) นั้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเรียนว่า กรมยังไม่ได้แจ้งการอนุมัติเงินประจำงวด ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการจัดหาถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ทางบริษัทฯจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง (BOQ) โดยขอให้ทางบริษัทฯ ปรับลดราคาทุกรายการตามอัตราร้อยละที่บริษัทได้เสนอราคาลดลง ให้ตรงกับแบบรูปและรายละเอียดภายใต้ราคา-ที่เสนอไว้ไปยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขานุการกรม
โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒๐
โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๔๔

๗ พ.ค. ๖๔
ร่าง
พิมพ์
ตรวจ

ภาคผนวก ๑๒

การชี้แจ้งกรณีการประกวดราคาต่ำกว่าราคา ๑๕ %

ของงานก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์



ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำนักงานเลขานุการกรม โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๔๕

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/ ๒๘๓๕ วันที่ ๗๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอชี้แจงกรณีผลการประกวดราคาต่ำกว่าราคากลาง ๑๕ % ของงานจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ความเป็นมา

๑. ตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๒๒๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งผู้มีรายนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง โดยให้มีหน้าที่คำนวณราคากลางตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (แนบท้ายประกาศ) ข้อ ๒.๑.๑๗ กำหนดว่า "ในกรณีที่ราคาผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่าง จากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางก่อสร้างนั้นให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๒. ตามหนังสือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๑๕๗๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้รับอนุมัติให้สั่งจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง จากบริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% จำนวน ๑๖,๓๔๒,๐๕๖.๐๗ บาท แล้ว โดยบริษัทฯได้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๕

๓. ตามหนังสืองานพัสดุ กลุ่มคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๒๓๒๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แจ้งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางชี้แจงรายละเอียดการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างดังกล่าวส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แตกต่างจากราคากลางต่ำกว่าร้อยละ ๑๕

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมในวันศุกร์ ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องงานพัสดุ กลุ่มคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๗ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อจัดทำคำชี้แจงกรณีราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยพิจารณาจากแบบรูป รายละเอียดและประมาณราคากลาง ตามแบบโครงการก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งคณะกรรมการฯพิจารณาแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อเสนอ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน-ผู้ประกอบการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (แนบท้ายประกาศ) ข้อ ๒.๑.๑๗ เห็นควรดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่น

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายบุญยืน อยู่พิพัฒน์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(จ่าอากาศเอกจิรัฏฐ เชื้อชาติ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสมศักดิ์ จันทมาศ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายไกรสูรย์ เจริญวงค์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ ชื่นจิตร์)

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

การดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (แนบท้ายประกาศ) ข้อ ๒.๑.๑๗ ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการกรมได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอำนาจการลงนามในหนังสือแจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นอำนาจของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือแจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวปีระดา แกมไทย)
๓๑ พ.ค. ๖๔

(นางสาวรุ่งทิวา อินโยธา)
หัวหน้ากลุ่มคลัง
๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔

☑ เห็นชอบ
☑ ลงนามแล้ว

(ลงชื่อ) .....
(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2 มิ.ย. 2564

ห้องอธิบดี
เลขที่รับ 2239
วันที่รับ - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๔
วันที่ออก.....เวลา.....

ห้องรองอธิบดี (นพ.ภานุวัฒน์)
เลขที่รับ 1792
วันที่รับ - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๔
วันที่ออก - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๔

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒๐

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/ ๒๓๓๙ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอชี้แจงกรณีผลการประกวดราคาต่ำกว่า ๑๕% ของงานจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๒๘๓๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แจ้งว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการชี้แจงกรณีที่ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

สำนักงานเลขานุการกรม ขอเรียนว่า คณะกรรมการฯได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (แนบท้ายประกาศ) ข้อ ๒.๑.๑๗ ทั้งนี้ อำนาจในการเห็นชอบและการลงนามในหนังสือแจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นอำนาจของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และหนังสือถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขานุการกรม

ชอบ
ลงนามแล้ว

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- 2 มิ.ย. 2564

(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- ๑ มิ.ย. ๒๕๖๔

สำเนาคู่ฉบับ

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/ ส๐๙

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางกรณีผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่ำกว่าราคากลาง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบสาระสำคัญหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (แนบท้ายประกาศ) ข้อ ๒.๑.๑๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา/บัญชีรายการก่อสร้าง จำนวน ๔๑ แผ่น
๒. สำเนาคำชี้แจงของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ แผ่น

ตามประกาศที่อ้างอิง กำหนดว่า “ในกรณีที่ราคาผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางก่อสร้างนั้นให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารบริการปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๒๘๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลางได้ เป็นเงิน ๒๙๒,๘๙๕,๖๗๒ บาท (สองร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๖ ราย โดยบริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เสนอราคาในวงเงินค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๕ ของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงจัดทำคำชี้แจงเพื่อแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒ มิ.ย. ๒๕๖๔

สำนักงานเลขานุการกรม
โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๔๕
โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๔๔

๓๑ พ.ค. ๖๔

ร่าง

พิมพ์

คำชี้แจงคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
กรณีผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ
และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แตกต่างจากราคากลางต่ำกว่าร้อยละ ๑๕
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องงานพัสดุ กลุ่มคลัง สำนักงานเลขานุการกรม

.....

๑. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.๑ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบสาระสำคัญหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (แนบท้ายประกาศ) ข้อ ๒.๑.๑๗ กำหนดว่า "ในกรณีที่ราคาผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางก่อสร้างนั้นให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๑.๒ คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๒๒๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการและจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยให้มีหน้าที่คำนวณราคากลางตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นทราบโดยเร็ว

๒. การดำเนินการ

๒.๑ ตามหนังสืองานพัสดุ กลุ่มคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๒๓๒๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แจ้งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางชี้แจงรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการและจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แตกต่างจากราคากลางต่ำกว่าร้อยละ ๑๕

๒.๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการและจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงินงบประมาณ ๒๘๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างคำนวณราคากลางได้ เป็นเงิน ๒๙๒,๘๙๕,๖๗๒ บาท (สองร้อยเก้าสิบสองล้าน-แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ตามประกาศประกวดราคา ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๔

/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๖ ราย โดยบริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เสนอราคาในวงเงินค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ราคาของผู้เสนอราคา แตกต่างจากราคากลาง เป็นเงิน ๔๓,๐๙๕,๖๗๒ บาท (สี่สิบสามล้านเก้าหมื่นห้าพัน-หกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๕ ของราคากลาง และคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๖ ของผลการประกวดราคาจ้าง

๓. คำชี้แจง

๓.๑ การคิดคำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้คำนวณตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๓.๒ ราคาวัสดุก่อสร้างใช้จากราคาค่าวัสดุตามสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ และค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการจากบัญชีแรงงาน/ค่าดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศเพิ่มเติมฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๓ การคำนวณค่า Factor F ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่อัตราร้อยละ ๕ ต่อปี โดยใช้ตาราง Factor F กรณีเงินล่วงหน้าจ่าย ๐% เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗% ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๓.๔ บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีหนังสือ เลขที่ TTE.สนอ.๒๕๖๔/๐๔/๐๐๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ บริษัทฯขอยืนยันและรับรองการเสนอราคาของงานก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นเงิน ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคากลางอัตราร้อยละ ๑๗.๒๕ เนื่องจากทางบริษัทฯมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานดังกล่าว จึงก่อสร้างได้เร็วทำให้ลดต้นทุนที่สูญเปล่า ค่าแรงงานลงได้บางส่วน อีกทั้งบริษัทฯมีศักยภาพในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการในราคาพิเศษ รวมถึงบริษัทฯมีเครื่องมือและเครื่องจักรทั้งหมดเป็นของตนเอง ซึ่งพร้อมปฏิบัติงานนั้นลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก จึงทำให้บริษัทฯสามารถเสนอราคาต่ำกว่างบประมาณที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนด

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนแล้ว เห็นว่า การพิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่กระทรวงการคลัง และสำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงกำหนดในช่วงที่คณะกรรมการฯพิจารณา ซึ่งเป็นราคากลางที่เหมาะสมถูกต้อง อีกทั้งเหตุผลที่ทางบริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชี้แจงมานั้น บริษัทฯมีความสามารถในการดำเนินการก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง ได้แล้วเสร็จ

คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นสมควรจ้างบริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง ดังกล่าว

/๔. เอกสาร...

๔. เอกสารประกอบการชี้แจง

รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายบุญยืน อยู่พิพัฒน์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(จ่าอากาศเอกจิรัฏฐ เชื้อชาติ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสมศักดิ์ จันทมาศ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายไกรสูรย์ เจริญวงค์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ ชื่นจิตร์)

ภาคผนวก ๑๓

การขออนุมัติแบบรูปรายการและวงเงิน ค่าก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ห้องอธิบดี
เลขที่รับ 1522
วันที่รับ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๔
วันที่ออก ..... เวลา .....

ห้องรองอธิบดี (นพ.ภานุวัฒน์)
เลขที่รับ 2139.
วันที่รับ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
วันที่ออก ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒๐

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๑๗๔๑ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแบบรูปรายการและวงเงินค่าก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๘๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งผูกพันงบประมาณ ๓ ปี โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้รับงบประมาณ ๕๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบหกล้านสามแสนบาทถ้วน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้รับงบประมาณ ๑๑๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านหกแสนบาทถ้วน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้รับงบประมาณ ๑๑๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านหกแสนบาทถ้วน) นั้น

สำนักงานเลขานุการกรม ขอเรียนว่า ตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ (๑) ในกรณีที่เป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง ให้เสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการแล้วต่อสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อนทำสัญญาก่อหนี้ผูกพัน ในการนี้ สำนักงานเลขานุการกรม ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือถึงสำนักงบประมาณที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขานุการกรม

ขอบ
ลงนามแล้ว

(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๔

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
21 มิ.ย. 2564

สำเนาคู่ฉบับ

ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/ ๕๕๙๙

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแบบรูปรายการและวงเงินค่าก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ แบบเลขที่ ๑๑๐๒๙ จำนวน ๑ ชุด
๒. มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม
๓. เอกสารเลขที่ ข.๓๒๒/พ.ย./๖๓ จำนวน ๑๑ แผ่น
๔. เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓ และเอกสารเลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม
๕. เอกสารเลขที่ ก.๓๙/เม.ย./๕๓ จำนวน ๓ แผ่น
๖. เอกสารเลขที่ ก.๑๑๓/ธ.ค./๕๘ จำนวน ๑ แผ่น
๗. เอกสารเลขที่ ก.๑๔๑/ก.ย./๕๓ และเอกสารเลขที่ ก.๑๔๐/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม
๘. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑ เล่ม
๙. เอกสารเลขที่ ก.๘๘/มิ.ย./๖๑ จำนวน ๑๖ แผ่น
๑๐. เอกสารเลขที่ ก.๑๕๐/ก.ย./๕๓ และเอกสารเลขที่ ก.๑๕๓/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม
๑๑. เอกสารเลขที่ ก.๑๕๔/ก.ย./๕๓ และเอกสารเลขที่ ก.๑๓๙/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม
๑๒. เอกสารเลขที่ ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓ จำนวน ๑ เล่ม
๑๓. เอกสารเลขที่ ก.๗๗/มิ.ย. /๖๑ จำนวน ๖ แผ่น
๑๔. แบบรูปและรายละเอียดฯ จำนวน ๑๓ แผ่น
๑๕. บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร และแบบ บก.๐๑ จำนวน ๔๐ แผ่น
๑๖. รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง จำนวน ๖ แผ่น
๑๗. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบเสนอราคาบริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ ๖๔๐๓๑๖๐๐๐๙๗๔๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ แผ่น

ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๐,๖๑๕ ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ๑๑๐๒๙ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๘๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้รับงบประมาณ ๕๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบหกล้านสามแสนบาทถ้วน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้รับงบประมาณ ๑๑๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านหกแสนบาทถ้วน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้รับงบประมาณ ๑๑๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านหกแสนบาทถ้วน) นั้น

/กรมสนับสนุน...

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเรียนว่า กรมฯได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้เข้ายื่นเสนอและเสนอราคา จำนวน ๖ ราย ปรากฏว่าบริษัท ดรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ จำนวน ๓๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และต่ำกว่าราคากลาง ๔๓,๐๙๕,๖๗๒ (สี่สิบสามล้านเก้าหมื่นห้าพันหกร้อย-เจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๒๙๒,๘๙๕,๖๗๒ บาท (สองร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพัน-หกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๕ กำหนดยืนราคา ๑๘๐ วัน กำหนดงานแล้วเสร็จ ๑,๐๘๐ วัน คณะกรรมการฯมีมติรับราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาโปรดพิจารณาอนุมัติให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง เป็นอาคาร คลส. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๒๐,๖๑๕ ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ๑๑๐๒๙ และเอกสารประกอบแบบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในวงเงิน ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔, ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขานุการกรม
โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๔๕
โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๔๔

ได้รับเรื่องแล้ว
รับที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๔

๒๐ / เม.ย. / ๖๔

09-265-1020 , 1045

สำเนาคู่ฉบับ

ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๓๐๑.๖.๕/ ๕๔๕

ถึง สำนักงบประมาณ

ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๓/๑๒๕๓๑ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ แจ้งว่า สำนักงบประมาณได้ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติแบบรูปรายการและวงเงินค่าก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง ตามผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) แล้ว แต่ปรากฏว่ายังขาดใบสืบราคา ๓ ราย ของครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่มีวงเงินสูง จำนวน ๖ รายการ ประกอบด้วย

๑. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (FP.) : VERTICAL TURBINE FIRE PUMP

๒. GENERATOR GEN SET 400 KVA. 380/230 3Ø 4W 50 Hz 1500RPM. PRIME RATE WITH SOUND PROOF 85DB AT 1M. AIR INLET/OUTLET

๓. หม้อแปลงไฟฟ้า TRANSFORMER 800/1060 KVA DRY TYPE PRI VOLT 24KV 3Ø 3W, SEC VOLT 416/240 V 3Ø 4W

๔. ลิฟท์โดยสารระบบ GEAR TRACTION ขนาดบรรทุก ๑,๖๐๐ กก. ความเร็ว ๖๐ ม./นาที จอดรับส่ง ๓ ชั้น ๓ ประตู ระบบทำงานแบบ simplex พร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับผู้พิการ

๕. ลิฟท์โดยสารระบบ GEAR TRACTION ขนาดบรรทุก ๑,๐๐๐ กก. ความเร็ว ๖๐ ม./นาที จอดรับส่ง ๔ ชั้น ๔ ประตู ระบบทำงานแบบ duplex พร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับผู้พิการ

๖. ลิฟท์โดยสารระบบ GEAR TRACTION (พนักงานดับเพลิง) ขนาด ๑,๖๐๐ กก. ความเร็ว ๖๐ ม./นาที จอดรับส่ง ๔ ชั้น ๔ ประตู ระบบทำงานแบบ simplex พร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับผู้พิการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณ นั้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงขอนำส่งเอกสารใบสืบราคาของครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่มีวงเงินสูง จำนวน ๖ รายการ รวมจำนวน ๒๓ แผ่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

สำนักงานเลขานุการกรม
โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๔๕
โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๔๔

ได้รับเรื่องแล้ว
รับที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

๒๕ มิ.ย. ๖๔

ที่ นร ๐๗๒๗/

สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติหลักการแบบรูปรายการและวงเงินค่าก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๕๘๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

๒. หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๗๓๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓. หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๙๕๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

๔. หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๙๔๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

๕. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ ครั้งที่ ๓ เลขที่เอกสาร ๑๐๐๐๐๐๔๐๔๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

๖. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบวิชาชีพ ให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพ งบรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง วงเงิน ๒๔๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๐๙๐ วัน นั้น

สำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง รายการอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบหกล้านสามแสนบาทถ้วน) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว ตามเอกสารที่อ้างถึง ๕ ส่วนที่เหลืออีก จำนวน ๑๙๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งรายการดังกล่าวอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ แต่มีระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงต้องนำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗ ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง และรายงานให้สำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ตามนัยข้อ ๗ (๒) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ขอให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของราชการเป็นสำคัญ และต่อรองราคาจนถึงที่สุดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๓
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๙๔๗
โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๖๐
สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ภาคผนวก ๑๔

การแจ้งลงนามในสัญญาจ้าง



ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/ ๑๒๑๗

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งลงนามในสัญญา

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ต้องการจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว นั้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พิจารณาแล้ว ตกลงจ้างก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และขอให้ไปทำสัญญากับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ พร้อมทั้งนำหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาทั้งหมดตามสัญญา เป็นเงิน ๑๒,๔๙๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ไปพร้อมในวันทำสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานเลขานุการกรม
โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒๐
โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๔๔

ภาคผนวก ๑๕

การลงนามในสัญญาจ้าง

